



OBRA PDVSA - AV. LIBERTADOR 602 PISO 20 CAPITAL FEDERAL
INFORME DE ACTIVIDADES SEMANA 07 - LUNES 02/03 AL SÁBADO 07/03

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA



COLOCACION DE HOJAS Y CERRADURAS EN PUERTAS. COLOCACION DE CRISTALES Y FILM ESMERILADO.



COLOCACION DE HOJAS Y CERRADURAS EN PUERTAS. COLOCACION DE CRISTALES Y FILM ESMERILADO.



ARMADO DE EQUIPAMIENTO STANDARD.



ARMADO DE EQUIPAMIENTO STANDARD.



INSTALACION DE CORTINAS ROLLER.




INSTALACION DE CORTINAS ROLLER.



IMPACTADO DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN PATCH PANNELS DE NUEVO DATA CENTER.



IMPACTADO DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN PATCH PANNELS DE NUEVO DATA CENTER.

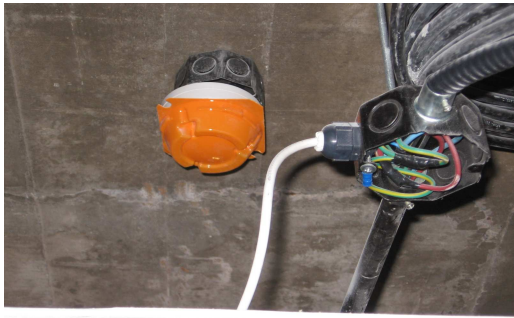

COLOCACION DE DETECTORES DE HUMO.



INSTALACION DE ILUMINACION TECNOLOGIA LED.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA SEMANA ENTRANTE

INSTALACION NUEVOS MUEBLES CUBRE FANCOIL
INSTALACION REVESTIMIENTO HALL ACCESO
INSTALACION CENTRAL DETECCION INCENDIOS
ARMADO DE EQUIPAMIENTO STANDARD
INSTALACION MUEBLES DE COCINA Y MESADAS
LIMPIEZA DE OBRA
