

INFORME AVANCE DE OBRA #1
FECHA: 5 de diciembre de 2014

OBRA: INTRAWAY

DIRECCIÓN: Aguada Park, unidad 408

ÁREA TOTAL: 70m²
contract
workplaces


Fecha de inicio de obra:	21/11/2014
Fecha de entrega provisoria original:	18/01/2015
Fecha de entrega provisoria reprogramada:	21/01/2015

Observaciones:

La reprogramación de la entrega se debe al retraso en la colocación del piso técnico (demora de aprobación de adicional) y el retraso en el ingreso del proveedor de aire acondicionado (proveedor del cliente).


TAREAS EJECUTADAS

Item	Descripción	% Completo
1	Colocación de bandejas y canalizaciones	100%
2	Piso técnico	95%
3	Tabiquería	90%
4	Cielorrasos yeso	90%
5	Estructura de cielorrasos modular	0%
6	Instalación sanitaria	100%
7	Colocación de grifería y artefactos sanitarios	0%
8	Instalación de Aire acondicionado	30%
9	Instalación de Detección de incendio	40%
10	Instalación de Extinción de incendio	100%
11	Instalación de eléctrica	70%
12	Tendido de cableado estructurado en bandejas	90%
13	Trabajos en rack	0%

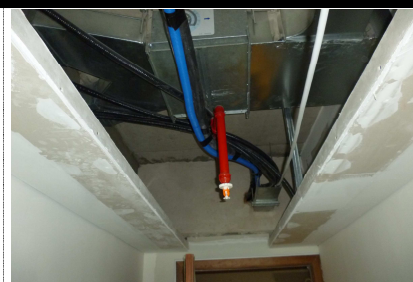FOTOS AVANCE DE OBRA_ 21/11 - 05/12


Vista general: Colocación de equipos de aire, tabiquería, cielorraso de yeso, tomas de eléctrica, instalación sobre cielorraso

Instalación de extinción de incendio

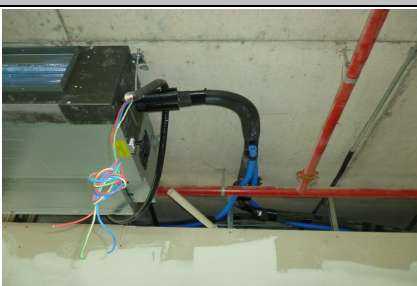

Instalación sanitaria

Instalación de aire acondicionado

Instalación eléctrica sobre cielorraso de sala de reuniones
