

INFORME AVANCE DE OBRA #3
FECHA: 22 de diciembre de 2014
OBRA: INTRAWAY

DIRECCIÓN: Aguada Park, unidad 408

ÁREA TOTAL: 70m²
contract
workplaces

Fecha de inicio de obra:	21/11/2014
Fecha de entrega provisoria original:	18/01/2015
Fecha de entrega provisoria reprogramada:	21/01/2015

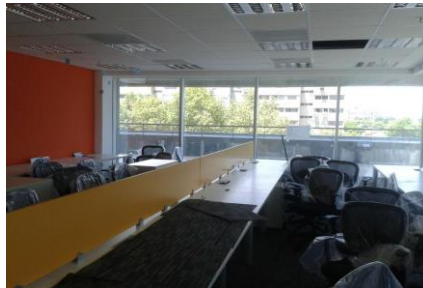
Observaciones:

La reprogramación de la entrega se debe al retraso en la colocación del piso técnico (demora de aprobación de adicional) y el retraso en el ingreso del proveedor de aire acondicionado (proveedor del cliente).

TAREAS EJECUTADAS

Item	Descripción	% Completo
1	Colocación de bandejas y canalizaciones	100%
2	Piso técnico	100%
3	Tabiquería	100%
4	Cielorrasos yeso	100%
5	Cielorraso modular	100%
6	Instalación sanitaria	100%
7	Colocación de grifería y artefactos sanitarios	100%
8	Instalación de Aire acondicionado	95%
9	Instalación de Detección de incendio	85%
10	Instalación de Extinción de incendio	100%
11	Instalación de eléctrica	100%
12	Tendido de cableado estructurado en bandejas	100%
13	Colocación de alfombra modular	100%
14	Pintura	100%

FOTOS AVANCE DE OBRA _ 16/12 – 22/12

Acceso

Open office

Mueble Sala de reuniones
