

REPORTE SEMANAL



INFORME 04



PEPSICO

Fecha Reporte	12/12/2016
Proyecto	Nuevas Oficinas PepsiCO
Ubicación	Cazadores de Coquimbo 2860. Vte Lopez.
Contacto Cliente:	Clara Quirno - Clara Dranco

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra nueva de oficinas en piso 3º de edificio Urbana 2
Se distribuyen 151 puestos operativos en Open Plan , se amplía el Coffee, Se agrega un mingitorio y una pileta en cada mesada en Sanitarios. Se agregan 2 cabinas telefónicas en sector Open lado Saenz Peña, se reorganizan todos los privados del sector de gerencia. Se reacondiciona el Server. Se agregan 3 cabinas telefonicas + 3 meetings informales en Open lado Ricardo Gutierrez.

FOTOS Y DESCRIPCION



Open lado Cazadores

Tesorería

Privados detrás de recepción



Pasillo lado Avalos

Sector cabinas lado Saenz Peña

Baños

RESUMEN DE AVANCE

Item	Detalle de tareas en curso
1	Refuerzos para TV's según plano en privados
2	Recolocación de cielorraso
3	Inicio armado de nueva recepción
4	Distribución de instalación eléctrica a nuevos puestos de trabajo
5	Re distribución cajas Ackerman en privados
6	Limpieza general

Item	Detalle de eventos especiales
1	Necesitamos que retiren la caja fuerte de la recepción


TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Armado de nuevo cielorraso en Recepción y privados	CONTRACT
2	Ajuste de conductos AA a nuevo layout	CONTRACT
3	Armado de cielorraso desmontable en sector Open	CONTRACT
4	Cableado de circuitos en privados y puestos en Open	CONTRACT
5	Recolocación de artefactos iluminación en Open	CONTRACT
6	Emplaque completo de tabiquería: 2da cara	CONTRACT

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
1	Reunión con IT	sin fecha	Coordinar tareas relacionadas al cableado estructurado	PEPSICO

5) AVANCE

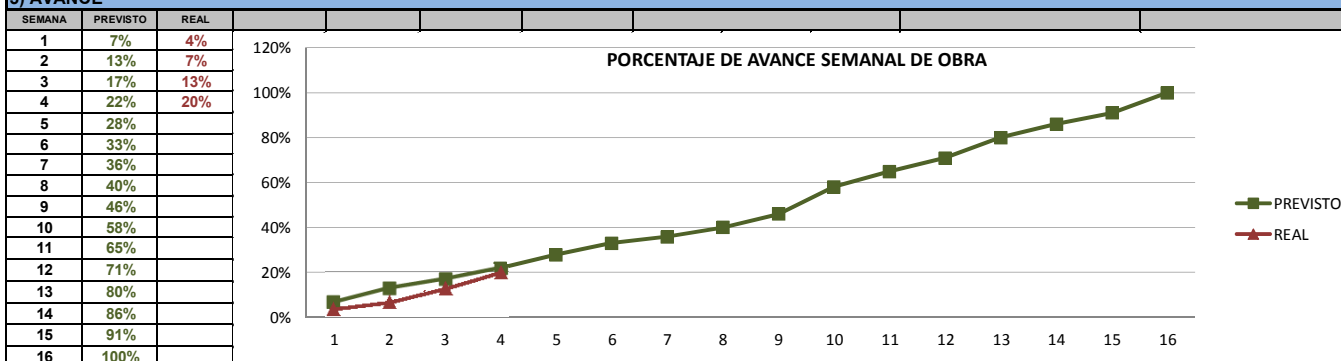

FIN DEL DOCUMENTO
