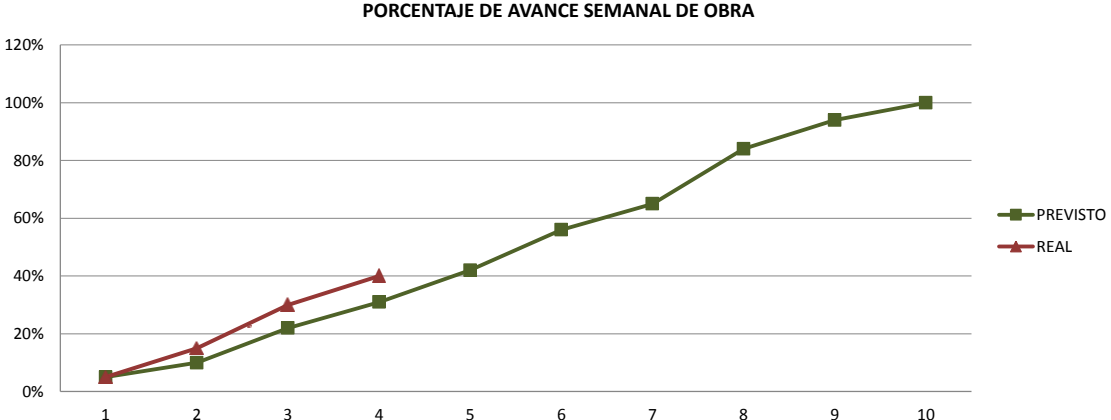


#02	REPORTE SEMANAL		contract workplaces		
Fecha Reporte 25/09/2015					
PROYECTO OFICINAS COMPASS					
UBICACIÓN Echeverría 1050, Vicente Lopez					
Contacto Cliente: Servicios Compass de Argentina SA					
Superficie 1700 m2					
1) DESCRIPCION DEL PROYECTO					
Relocalización de las oficinas de COMPASS. Son 3 niveles de oficinas distribuidas de la siguiente forma: Piso 6 open space, privados y salas de reuniones. Entre Piso open space, data center, privados, presidencia, salas de reuniones. Planta Baja salas de entrevistas, sala de capacitación, depósito, comedor y cocina.					
2) FOTOS Y DESCRIPCION					
					
Tabiques durlorck aislación		Tabiques durlock	Cielorraso y aire acondicionado		
					
Tableros y cableado - Cielorraso		Server	Server		
3) TEMAS CRITICOS					
Item	Detalle			Responsable	
1	Compass provee el equipamiento - Fecha de entrega 14-10 - Proveer plano para replanteo			Compass	
2	Compass provee la alfombra - Fecha de entrega 10-10-15			Compass	
3	Traslado y ubicación de equipos de aire para server - Condensadoras interiores			Compass - Contract	
4	Contrapiso de hormigon liviano en cocina a definir			Compass - Contract	
5	Medidores gestión			Compass	
4) HITOS Y DEADLINES					
Status	Rubros	inicio	final	Comentarios	Responsable
	aire acondicionado	07/09/2015	10/10/2015	Se comenzaron a mover los equipos y colocar conductos.	Contract
	albañilería	26/08/2015	10/10/2015	Se comenarará a colocar cerámicos en baños.	Contract
	electricidad - datos	26/08/2015	10/10/2015	Canalizaciones cctv - c acceso - puestos de trabajo - cableado	Contract
	data center	14/09/2015	05/10/2015	Se están ubicando los rack traídos por Compass y las bandejas. Compass debe traer rack abierto a la obra	Contract
	contol de acceso	14/09/2015	30/09/2015	Canalizaciones	Contract
	detección de incendio	14/09/2015	30/09/2015	Canalizaciones. Se comienza a cablear semana proxima.	Contract
	cielorrasos	26/08/2015	10/10/2015	Estructura realizada espera movimiento de equipos para emplacar	Contract
	tabiques	26/08/2015	10/10/2015	Se emplacarón ambas caras y se colocó aislación acústica.	Contract
	vidrios	21/09/2015	10/10/2015	Se realizó la medición, se comienzan a colocar u de aluminio semana proxima.	Contract
	pisos	25/09/2015	10/10/2015	Se comenzará a colocar la semana proxima 21-9	Contract
	alfombra	10/10/2015	10/15/2015	Entrega programada	Compass
	equipamiento especial y de línea	14/10/2015	26/10/2015	Entrega de planos Tempo	Compass
5) AVANCE					
SEMANA	PREVISTO	REAL			
1	5%	5%			
2	10%	15%			
3	22%	30%			
4	31%	40%			
5	42%				
6	56%				
7	65%				
8	84%				
9	94%				
10	100%				
FIN DEL DOCUMENTO					
