

EMBAJADA DE VENEZUELA - LUIS MARIA CAMPOS 170 - C.A.B.A.
INFORME SEMANAL 04 - PERÍODO DEL 08/11 AL 12/11

TAREAS REALIZADAS EN LA SEMANA



TENDIDO DE CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO PISOS 03-07



ESTRUCTURA DE AJUSTES CIELORRASO PISOS 03-07 COMPLETA



CONEXIÓN EQUIPOS PISOS 03 Y 07



COLGADO UNIDADES CONDENSADORAS PISO 03




NUEVAS CANALIZACIONES DEBIDAS A CAMBIO EN EL LAYOUT
PISOS 03 - 08



CABLEADO CIRCUITO DE ILUMINACION PISOS 03 - 07



APERTURA DE PASES PARA CONEXIONES DE UNIDADES
CONDENSADORAS EN PISOS 3-7-8-9-10

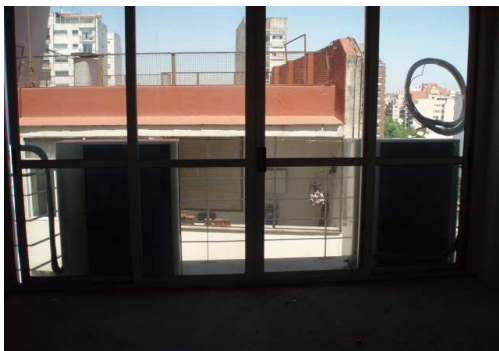

INSTALACION UNIDADES CONDENSADORAS EN BALCONES PISOS 07 -08



RETIRO DE TABLEROS EXISTENTES Y COLOCACION Y AMURADO NUEVOS
TABLEROS PISOS 09- 10.

TAREAS A REALIZAR EN LA PRÓXIMA SEMANA

CONTINUACION AJUSTES CIELORRASO DURLOCK

CONTINUACION TABIQUERIA DURLOCK
CONTINUACION COLGADO CONDUCTOS AA. Y UNIDADES CONDENSADORAS PISOS 8-9-10
INSTALACION DETECCION DE INCENDIO
APERTURA PASES PARA MONTANTE CABLEADO ESTRUCTURADO.
INSTALACION SANITARIA -DRENAJES EQUIPOS AA.
