

EMBAJADA DE VENEZUELA - LUIS MARIA CAMPOS 170 - C.A.B.A.
INFORME SEMANAL 06 - PERÍODO DEL 23/11 AL 27/11


TAREAS REALIZADAS EN LA SEMANA



COLOCACION ZOCALOS Y EMPASTINADO PORCELANATO PISO 3



EMPLACADO Y MASILLADO AJUSTES CIELORRASO PISO 03

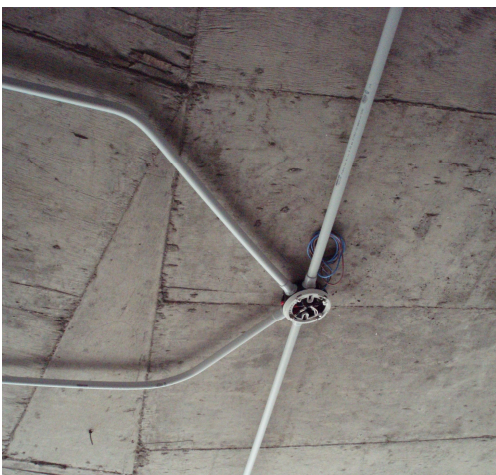

TENDIDO CAÑERIA DETECCION INCENDIO PISOS 5 Y 6



ACOPIO ARTEFACTOS ILUMINACION



ACOPIO PISO FLOTANTE



COLOCACION CHICOTES ARTEFACTOS ILUMINACION



FINALIZACION COLGADO DE CONDUCTOS AIRE ACONDICIONADO PISO 8



INICIO COLGADO DE CONDUCTOS AIRE ACONDICIONADO PISO 9



ARMADO ESTRUCTURA DE AJUSTES DE CIELORRASO PISO 9



INICIO TRABAJOS DE PINTURA



ENDUIDO COMPLETO TABIQUES Y PAREDES PISO 3

TAREAS A REALIZAR EN LA PRÓXIMA SEMANA

CONTINUACION AJUSTES CIELORRASO PLACA ROCA DE YESO
CONTINUACION EMPLACADO AJUSTES CIELORRASO
CONTINUACION COLGADO CONDUCTOS AA.PISOS 9
INSTALACION DETECCION DE INCENDIO
OBRA CIVIL MEDIDOR
TRABAJOS PINTURA PISO 3
COMIENZO ARMADO ESTRUCTURA CIELORRASO
MODULAR
