

12 - MELI - ACTA DE REUNIÓN



Cliente: **MERCADO LIBRE**

Ubicación de Obra: Av. Apoquindo 4820 Pisos 20, 21 y 22

Reunión: MINUTA N° 12

Fecha: 06-01-2016

Lugar: Oficinas MELI - OBRA

Asistentes por MELI:

- Felipe Streitt
- Gonzalo Balladares
- Lucia Lucena
- Lucila Bengolea
- Gabriel Carreras
- Pablo Correa
- Nicolás Donoso

Asistentes por CONTRACT:


- Esteban Castro
- Cristián Alvarado
- Valentina Supán
- Alejandro García
- Juan Carlos Moya

Declaraciones y Definiciones:

1er Instancia: 14 a 15 hs

1. Plazo de Obra: CONTRACT presenta la curva "S" que respecta a la programación de la obra. Se indica que la misma arroja un atraso de 11 días corridos, a causa de los cambios que se han producido las indefiniciones por parte de Proyecciones Digitales; debiéndose realizar nuevamente canalizaciones en muros y pisos de las salas de reunión. Por lo cual, de común acuerdo se indica que la nueva fecha de Entrega Provisoria de los pisos 21 y 22, será el 19 de febrero de 2016.

Se adjunta la curva S:

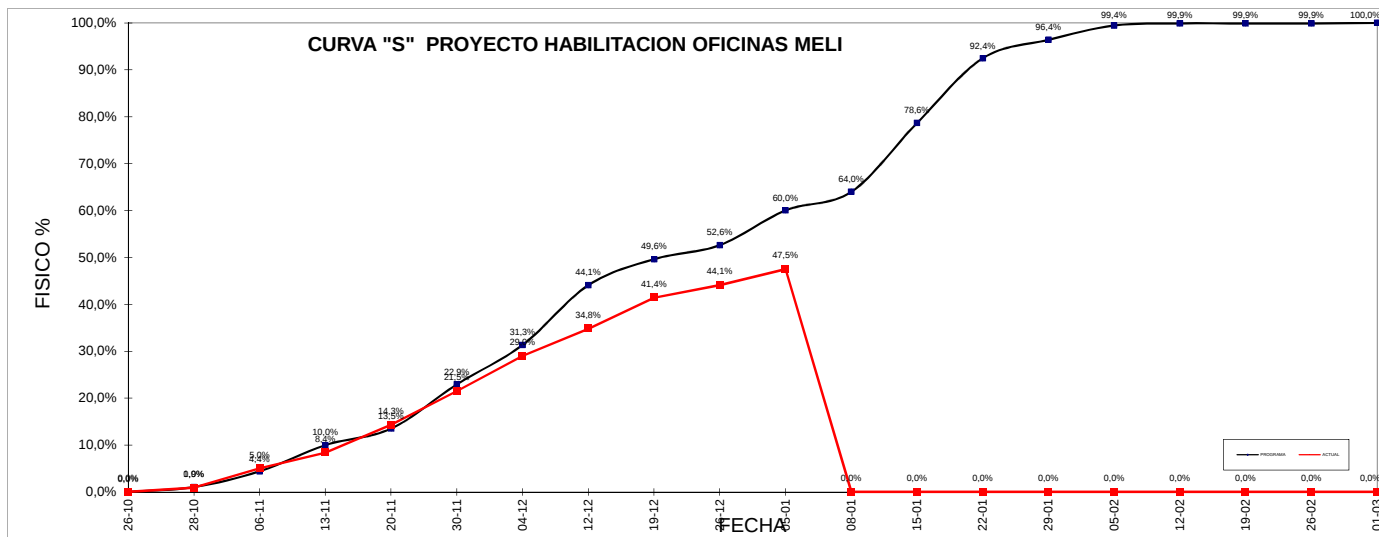

2. CÁMARAS: MELI indica que enviara nuevas cantidades de cámaras que instalarán en los pisos 20, 21 y 22.

MELI envía vía e-mail el 07-01-206 la siguiente información: *Esteban, según lo conversado, te adjunto plano DWG con la ubicación de las cámaras IP de los pisos 20,21 y 22 en total serian 39 puntos de datos, según la siguiente distribución :*

piso 20 : 8 cámaras

piso 21 : 19 cámaras

piso 22 : 12 cámaras

De estos 39 puntos hay varios que ya existen solo abrir que colocar los puntos adicionales necesarios para completar la cantidad de puntos que mencione.

3. CONTRATO: MELI solicita que los nuevos presupuestos adicionales aprobados (Cuadre Data Center - Adicional 1 - Piso 20) se adjunten a un nuevo Anexo del contrato firmado junto con las carta Gantt actualizadas para los pisos 21 - 22 y 20.

2da Instancia: 15 a 18.30 hs

- Recorrido de obra verificando avances
- Temas varios:

1. PROYECTOS DE ESPECIALIDADES: Si bien ya están aprobados, se aguarda la formalidad por parte del edificio.
2. DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTES: Se aguarda la aprobación formal.

Compromisos:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hs, de lo contrario se entenderá por aprobada.
