

MINUTA_2016.07.14_GL_OBRA

jueves, 14 de julio de 2016
Ubicación: Oficinas GLOBANT
Hora: 9.00 hs



ASISTENTES CLIENTE

• EO	Eduardo Oppenheimer	eduardo.oppenheimer@globant.com
• MM	Martín Musante	martin.musante@globant.com
• CB	Claudia Blasco	claudia.blasco@am.jll.com
• PR	Paola Rico	paola.rico@globant.com
• LL	Leandro Lousau	leandro.lousau@globant.com
• SSM	Santiago San Martin	santiago.sanmartin@globant.com

ASISTENTES CONTRACT


- (S) Sofía Liñero
- (VC) Vidal Chávez
- (VS) Valentina Supán

TIPO:

- ☒ Comercial
- ☐ Obra
- ☒ Presencial
- ☐ Conference Call
- ☐ Extraordinaria

PROYECTO / OBRA

ÍTEM	RUBRO	RECINTO	OBSERVACIÓN
1	TEMAS TRATADOS	GRAL	- BREAK ROOM: Pouf . Presentación de muestra en la obra Plano de iluminación con la nueva ubicación de los 4 artefactos circulares - Recruiting RR HH: Muestra en la obra de la pintura de color aplicada en la losa + una imagen referente al juego "Mario Bros" - Lockers: Propuesta de imagen de color sobre el frente de las puertas de los mismos - Depósito: Propuesta para guardado - Cafetería: Dispenser de agua adicional. Plano con ubicación en planta - Chill out: Ubicación de "Pac Man", para visualizar en la obra - Ubicación de racks en Site y UPS en Cuarto de Tableros: Validación por parte de GLOBANT - Fibra óptica + conexión piso 12 a piso 15: Presentación de presupuesto adicional - UPS adicional, según email enviado por Leandro
2	PRESENTACIÓN	GRAL	Se adjunta a la siguiente minuta la presentación con los temas tratados en la reunión:  GLOBANT ...
3	MUEBLES COMPLEMENTARIOS	BREAK ROOM	- Se presenta en la obra una muestra del pouff propuesto para validar la forma (no el color) del mismo. Se adjuntan fotos:



Se envían las opciones de los colores de las telas. Se debe seleccionar el color lo antes posible para poder fabricarlos.

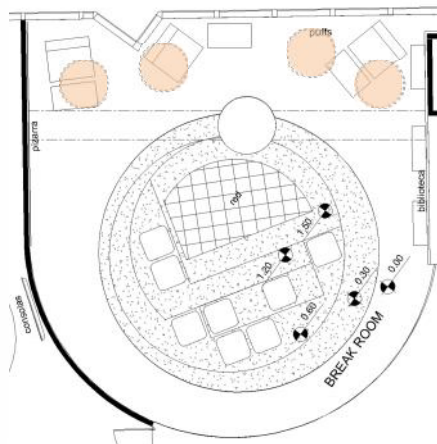


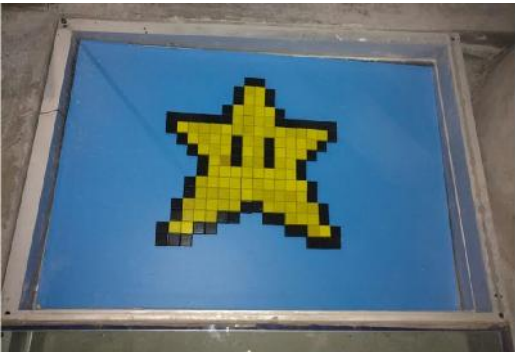

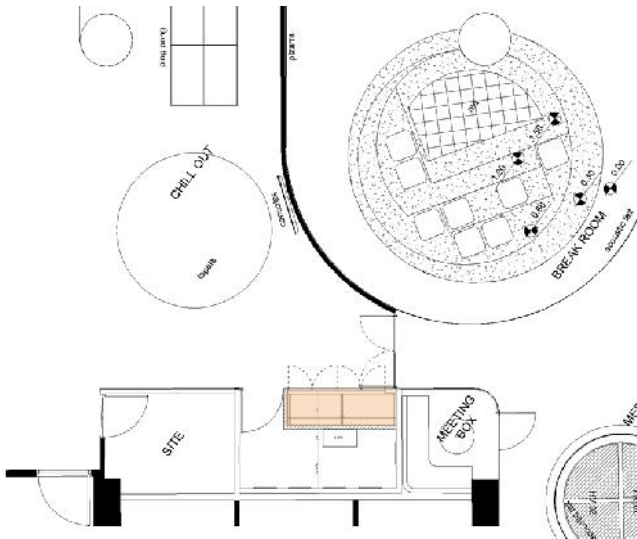
4

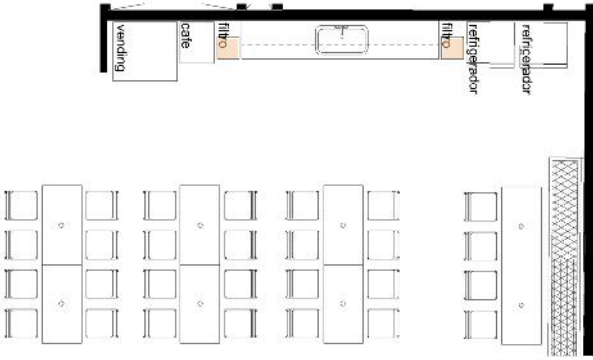
ILUMINACIÓN

BREAK ROOM

CONTRACT comentó que una vez ubicada y finalizada la grada, se pudo dimensionar el espacio libre (especialmente en altura), por lo cual se propuso una nueva disposición de las 4 lámparas circulares. GLOBANT aprueba dicha disposición. Se presenta el plano como referencia:



5	PISO FALSO: PROPUESTA DEBAJO DEL CRISTAL	RECRUITING RR HH	- Se realizó una muestra de la pintura de fondo y de una imagen en madera. CONTRACT comenta que presupuestará estas imágenes en madera y en vinilo, indicando los plazos de fabricación e instalación de cada propuesta; se estima que el trabajo en madera puede llevar 2 semanas de fabricación. Además, se comenta que en este espacio no se podrán armar los muebles de línea ni fijar los cristales en el piso hasta no tener todo instalado y finalizado por debajo de los cristales. GLOBANT define no armar los muebles y esperar a la fabricación en madera (como la propuesta realizada en la obra), con la intención de tener un mejor diseño para el sector. Imagen de la muestra: 
6	GRÁFICAS	LOCKERS	- Se presenta una propuesta de imágenes con color referentes al juego "Space Invaders" para instalar en las puertas de los lockers. GLOBANT aprueba la propuesta, por lo cual se procederá a ejecutar la misma. 
7	MUEBLES ESPECIALES	DEPÓSITO	- Se presenta una propuesta de guardado para realizar en un sector del espacio utilizado como Cuarto de Tableros. La propuesta considera dividir el espacio con Tablaroca roja instalando puertas de madera de piso a losa con acceso desde el Chill out (éstas se pintarán con el grafiti). Interiormente se dejarán entre 0.65 y 0.70 m para que GLOBANT pueda ubicar estanterías metálicas. Se valida esta propuesta en la obra, aprobándose por parte de GLOBANT. - Planta destacando con color el espacio propuesto como guardado: 

8	DISPENSER DE AGUA	CAFETERÍA	- Se presenta un plano con la ubicación de un 2do dispenser de agua en la cafetería. GLOBANT aprueba la propuesta. 
9	SNACK BAR	CAFETERÍA	- Se presenta la propuesta con los cambios conversados anteriormente. En cuanto GLOBANT apruebe la misma, procederemos a cotizarla.
10	GRAFITI	OPEN PLAN	- Se muestran avances del mismo.
11	MUEBLES ESPECIALES	CHILL OUT	- En la obra se presenta una nueva ubicación del Pac Man. Considerando que el mismo pesa cerca de 150 kg (si bien el muro esta reforzado) al utilizar el mueble como biblioteca su peso aumentará; por ello se ubico sobre el nivel del piso. Además, teniendo en cuenta la funcionalidad del mismo; ya que con ésta posición es cómodo llegar a los estantes. GLOBANT valido la ubicación. CONTRACT enviara una propuesta con vinilos para el área.
12	RACKS	SITE	GLOBANT indica una nueva ubicación de los 3 racks. Se trabajara con los bastidores en la posición indicada teniendo en cuenta que el cableado se dimensiono de acuerdo a las propuestas anteriores.
13	UPS	CUARTO DE TABLEROS	- Por las normativas vigentes, se presenta la ubicación de la UPS en dicho cuarto. - Se solicita se presupueste e instale una UPS rackeable adicional (marca APC ó EMERSON). GLOBANT debe confirmarnos la capacidad de la misma, caso contrario tener la referencia de la existente en el piso 15. Indicar el plazo de entrega.
14	PRESUPUESTO ADICIONAL 2	INTERCONEXIÓN PISO 12 A PISO 15	- Se presenta el presupuesto de fibra óptica e interconexión del piso 12 a piso 15. GLOBANT lo aprueba. Se adjunta a la siguiente minuta. Se facturará el respectivo anticipo.  GLOBANT - Presupues...

NOTA: Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hs, de lo contrario se entenderá por aprobada.
