

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CLIENTE	INDRA CHILE
OBRA	OFICINAS
UBICACIÓN	AVENIDA DEL VALLE 765 PISO 1-2-3
CONTRATISTA	CONTRACT CHILE
RUBRO	TECNOLOGIA
FECHA	12 DE JULIO 2010

En Santiago, 12 de julio de 2010, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen la Sra. María Cristian Dibán en representación de **INDRA CHILE**, y los Arq. Constanza Alarcón y Carolina Yañez, en representación de Contract Chile, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pié se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Esta recepción faculta a Contract la cobranza del 90% correspondiente a cada presupuesto, según contrato.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Fecha de entrega final: miércoles 20 de julio con excepción de los ítemes de muebles ya que esta fecha queda sujeta a confirmación para realizar trabajos en porcelanatos.

OBSERVACIONES:

- | |
|---|
| 1. cerámicas de kitchenete piso 3: por confirmar, se realizara el trabajo el jueves idealmente por un tema de secado. |
| 2. puerta acceso piso 2: a espera de respuesta de Indra sobre cambio que ofrece Contract de brazo hidráulico a quicio, este trabajo se realizaría con previa autorización de la administración también. |
| 3. post-venta: pendiente film y planos, y goma mampara. |

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

Pendiente = (P)
Aprobado = (OK)

contract

Piso 3:	
kitchenete:	
4. porcelanatos soplados. Jueves 15 por confirmar	OK ✓
5. armado de sillas ,reloj, lunes	OK ✓
6. chapa de puerta de acceso: esta semana.	<u>Pendiente</u> (P)
7. tapa canto en puesto de acceso. Jueves 15 <u>Limpieza.</u>	(P)
8. tapa eléctrica tras refrigerador. Jueves 15 <u>1 tapa esta mal instalada</u>	OK 1/2 (P)
9. desmanchar muro donde no esta el cuadro (fondo). jueves 15	(P)
sala jefe de proyecto:	
10. mesa de cubiertas: tiene que ser de una sola plancha (4) 20 dias.	(P)
11. modificación de puntos eléctricos frente a puerta	OK ✓
Consulting ex salud:	
12. las tapas de las pantallas tienen que ser todas iguales, 20 dias	OK ✓
Gerencia: <u>Renta del cuadro</u>	
13. film oficinas nuevas. jueves	<u>→ piquete en primer pasado.</u>
14. post-venta: embellecedores de puerta de gerencia <u>Cuadro.</u>	
Piso 2	
15. tapacantos en pasillo, antes de RRHH.	(P)
16. cambio de mueble y puesto nuevo, 20 días.	(P)

17/ Revisar gerencia Izquierda se revelan
2 puertas.

[Signature]

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

kitchente piso 2:	
17. limpieza sobre revestimiento.	(P)
18. tapa eléctrica en pilar verde.	(P)
19. porcelanato de acceso.	OK /
20. limpieza de puertas y placa.	(P)
21. post-venta: faltan dos placas, dos cajoneras	(P)
22. cambiar el refrigerador al otro lado del pilar.	OK /

Plazo Vienes → 23.

① Averiguar si los acabados se están fabricando.

Pezas nuevas → fecha montaje, día y hora.



Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

Presupuestas

- ① luminarias → pueblo explora el tema de proyecto y si es que faltan ellos los cobran.

Pablo → Empecé mañana Pecho de entrega
y plazo en que demora el proyecto.
en sí.


→ Fecha de recepción Pablo Morán/Linares

- ② Receparni → Sofa donde esta roto y se debe cotizar uno nuevo.
↓
• TV → DVD.
• Logo Astero Dux.
• Piso parcelado.
• ~~Asfalto~~ → Mueble de Receparni estan acordados con Lorena. Lo pido mas grande → necesita mas espacio.
↓
• ~~Asfalto~~ → Busca en Manual.  → sofa.
• ~~Asfalto~~ → Counter. mas Receparni.
• ~~Asfalto~~ → Lorena tiene colores. Aprobados.

- ③ Sala de Directorio → Lorena tiene valores Aprobados.
→ Lorena.

↓ Muchas Modificaciones.

- 1) Considerar Heurísticos existentes
- 2) TV. "
- 3) Considerar soporte.
- 4) Agregan enchufes en mesa de direcciones.

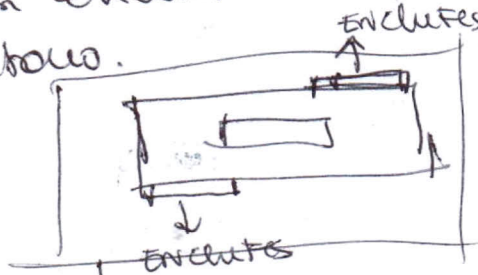

Video Film Complete

- ④ Celos se modifican en recepción y sala de directivo.
⑤ Cambian placas int. de sala de directivo color blanco.
