

AIR FRANCE SANTIAGO DE CHILE

Le rapport de 23/1/04



Image du meme lieu , le 23/1/04



Image du meme lieu , le 23/1/04

Les Ornements Generaux

Parámetros Generales


Date d' achèvement - Programmé 19/03/04
Fecha de fin de Obra - Programada

Date d' achèvement - Réel
Fecha de fin de Obra - Real

Estimation Prèliminaire 306.365 U\$S
Presupuesto Origen

Estimation du cout de construction
Presupuesto de Obra

% d' avancement économique
% de Avance económico de la Obra

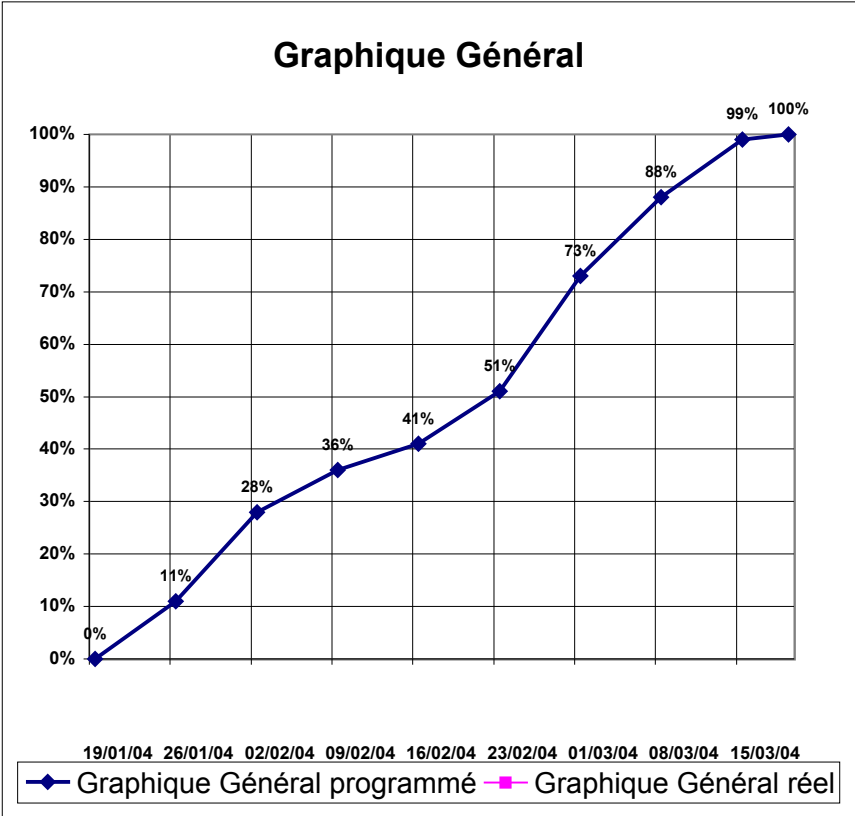

Le Planning

Id	Nombre de tarea	Le Nom de l'activité	%	Commencement	Fin	18 ene '04	25 ene '04	01 feb '04	08 feb '04	15 feb '04	22 feb '04	29 feb '04	07 mar '04	14 mar '04
6	Air France Santiago de Chile		0%	19/01/04	17/03/04									
7	Tareas preliminares	Les tâches préliminaires	0%	19/01/04	21/01/04									
9	Aire acondicionado y Extrac. Mecánicas	Le traitement d'Air	0%	21/01/04	03/03/04									
15	Albañilería	La Maçonnerie	0%	22/01/04	23/02/04									
19	Piso Técnico	Le Plancher surélevé	0%	22/01/04	02/02/04									
22	Instalación sanitaria	La Plomberie	0%	22/01/04	02/03/04									
26	Instalación eléctrica	L'Installation électrique	0%	22/01/04	10/03/04									
40	Extinción de incendios	La Protection incendie	0%	22/01/04	30/01/04									
43	Tabiques tablarroca de yeso	La maçonnerie de pierres seches	0%	29/01/04	12/02/04									
46	Cielorrasos	Les Plafonds en pierres seches	0%	29/01/04	24/02/04									
51	Herrería	Tâches en Acier	0%	04/02/04	27/02/04									
55	Pintura	Le Peinture	0%	13/02/04	17/03/04									
60	Solados y Revestimientos	Les Revêtements de sol et mural	0%	16/02/04	03/03/04									
67	Carpinterías	Les Charpentes	0%	20/02/04	02/03/04									
70	Cableado estructurado	Le Système a basse tension	0%	24/02/04	11/03/04									
75	Cristales	Les Muraux d cristal	0%	25/02/04	02/03/04									
78	Detección de Incendios	Détecteur d'incendie	0%	26/02/04	03/03/04									
82	Zócalos	Les plinthes	0%	01/03/04	04/03/04									
84	Control de accesos	Le Système de Contrôle d'accès	0%	01/03/04	05/03/04									
88	Equipamiento y tabiquería modular	Les cloisons et mobilier	0%	03/03/04	12/03/04									
92	Cortinas	Les rideaux	0%	10/03/04	15/03/04									
95	Señalética	La signalétique	0%	10/03/04	11/03/04									
97	Limpieza	Le Nettoyage	0%	11/03/04	15/03/04									

Commentaire Général

Graphiques du controle

