

AVANCE DE OBRA

TUTEUR

Relevamiento al 09-11-16

contract
workplaces

Fecha Reporte	09/11/2016
Proyecto	REMODELACION PB
Ubicación	Encarnación Ezcurra 365, PB
Contacto Cliente:	Alberto Bordigoni

DESCRIPCION

Avance de obra PB

FOTOS Y DESCRIPCION



ALBAÑILERIA: Baño grande. **Avance 65%.** Tareas realizadas: retiro de artefactos sanitarios existentes, de revestimiento y piso. Picado para nuevo desagüe de ducha. Armado de nuevo tabique divisor entre nueva ducha e inodoro



AVANCE DE OBRA

TUTEUR

Relevamiento al 09-11-16

contract
workplaces

ALBAÑILERIA: baño chico. **Avance 70%.** Tareas realizadas: retiro de artefactos sanitarios existentes y de revestimiento. Ajuste con placa verde para ducha.

INSTALACION SANITARIA: Conexión a dispenser en nuevo tabique de coffee.



INSTALACION AIRE ACONDICIONADO: avance 90% falta la colocacion de rejillas de terminacion en ambas salas de reunión



TABIQUE EN PLACA DE ROCA DE YESO + CIELORRASO: Avance 80%. Falta realizar parches en huecos por artefactos eléctricos existentes, terminar cielorraso en dos salas de reunión una vez colocado el refuerzo para cristales.



PINTURA: Avance 80% se realizó lijado, enduido, y blanqueado en general.

AVANCE DE OBRA

TUTEUR

Relevamiento al 09-11-16

contract
workplaces




AVANCE DE OBRA

TUTEUR

Relevamiento al 09-11-16

contract
workplaces

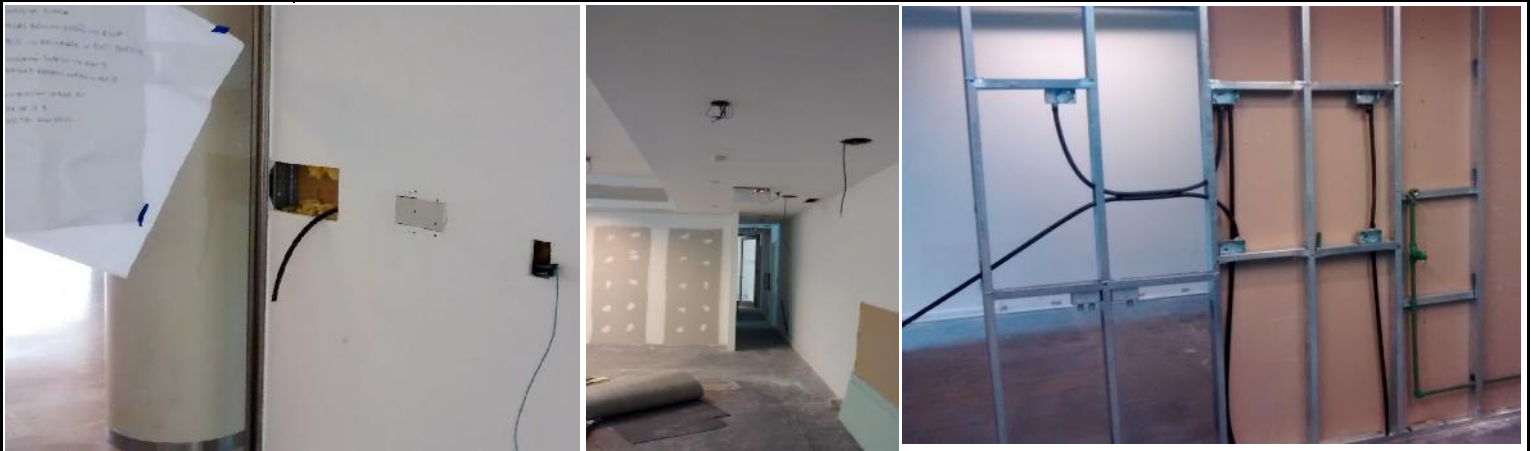

INSTALACION ELECTRICA: 80% Tareas realizadas: canalizacion para nuevas luminarias en sector coffee, reubicacion de cajas de piso, canalizacion para control de acceso, cableado en nueva disposicion de artefactos en secto circulacion. Canaliazacion en nueva tabiqueria.
