


|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Fecha Reporte     | 02/11/2018                      |
| Proyecto          | ALIX PARTNERS - Nuevas oficinas |
| Ubicación         | Av. Corrientes 1750 piso 11     |
| Contacto Cliente: | Sebastian Blaustein             |

#### DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las nuevas oficinas cuentan con un open office con 18 puestos operativos , area de coffe y cocina, 2 áreas colaborativas, 1 sala de reunion para 4 personas ,1 sala de reunión para 6 personas, 1 laboratorio y baños existentes.-

#### FOTOS Y DESCRIPCION

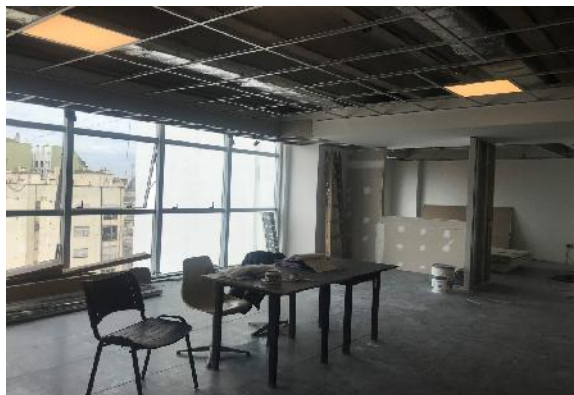

#### ACCESO DE OBRA



#### ASLACION DE LANA DE VIDRIO + CIELORRASO JUNTA TOMADA



#### SOBRETABIQUES AISLACION ACUSTICA



CIELORRASD JUNTA TOMADA + DESMONTABLE



SOBRETABIQUEOS CON AISLACION ACUSTICA




EMPLAQUE DE TABIQUEOS + MASILLADO



EMPLAQUE DE TABIQUES + CAÑERÍAS PARA ALIMENTADOR DE RACK



EMPLAQUE DE TABIQUES + MASILLADO

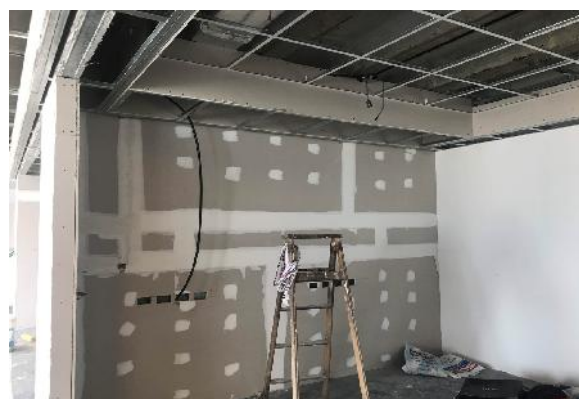

EMPLAQUE DE TABIQUES + MASILLADO + AISLACION ACUSTICA

**RESUMEN DE AVANCE**

| Item | Detalle de tareas en curso                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Canalización y cableado de iluminación                                                                        |
| 2    | Canalización y cableado de tomas de servicio                                                                  |
| 3    | Colocación de aislación acústica                                                                              |
| 4    | Medición de cortinas                                                                                          |
| 5    | Cierre de tabiques 2 placa                                                                                    |
| 6    | Masillado en una cara durlock                                                                                 |
| 7    | Replanteo de instalación de AA                                                                                |
| 8    | SE COMENZARON LAS TAREAS DE REVISION DE EQUIPOS DE AA EXISTENTES - SE PIDE UN INFORME FINAL DE LA INSTALACION |

# REPORTE SEMANAL



INFORME 02



## TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

| Item | Detalle                                          | Responsable |
|------|--------------------------------------------------|-------------|
| 1    | Calados en piso tecnico para cableado de puestos | Contract    |
| 2    | Canalización de detección de incendio            | Contract    |
| 3    | Medición de cristales                            | Contract    |
| 4    | Emplaque cielorraso junta tomada cortinero       | Contract    |
| 5    | Instalación sanitaria de agua caliente           | Contract    |

## HITOS Y DEADLINES

| Status | Rubros                                       | Fecha      | Comentarios                                                                                                                 | Responsable              |
|--------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1      | SOLICITUD DE NUEVO MEDIDOR                   | 18/10/2018 | Se sugiere iniciar trámite de Medidor para poder llegar a probar en tiempo las instalaciones                                | ALIX PARTNERS            |
| 2      | DEFINICION DE SILLAS ALTAS Y OPERATIVAS      | 02/10/2018 | Se deben elegir las sillas por su tiempo de entrega de 50 días                                                              | ALIX PARTNERS            |
| 3      | CALADOS CAJAS NYTEC + PORTAMONITOR           | 02/10/2018 | Contract pasara presupuesto de calados en mesas y portamonitor Hafele - DEFINIR PARA PODER COMPRAR                          | CONTRACT                 |
| 4      | REUNION CON PERSONAL DE CCTV + C ACCESO + AP | 30/10/2018 | Definición con el proveedor de cctv y control de acceso. Se aguarda el plano de ubicación y si son POE                      | ALIX PARTNERS - CONTRACT |
| 5      | MODELO DE DESTRUCTORA DE PAPEL               | 02/10/2018 | Alix presento el modelo de la destructora de papel para comenzar con los muebles, se adjunta el plano del mueble esa medida | ALIX PARTNERS - CONTRACT |
| 6      | TOMAS MULTINORMAS                            | 26/10/2018 | Contract informo al AP que los tomas multinorma se encuentran fuera de normativa.                                           | ALIX PARTNERS            |
| 7      | LOGOS Y GRAFICAS DEFINIR                     | 10/10/2018 | Definir vinilos. Grafica y lugar donde se coloca el cartel del piso 12                                                      | ALIX PARTNERS            |
| 8      | DEFINICIONES EN COFFEE                       | 02/10/2018 | Ver definiciones de mesadas y lavavajillas - Contract presentara plano                                                      | ALIX PARTNERS            |

## AVANCE DE OBRA

