

Fecha Reporte	02/12/2016
Proyecto	Nuevas Oficinas PepsiCO
Ubicación	Cazadores de Coquimbo 2860. Vte Lopez.
Contacto Cliente:	Clara Quirno - Clara Dranco

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Obra nueva de oficinas en piso 3º de edificio Urbana 2
Se distribuyen 151 puestos operativos en Open Plan , se amplía el Coffee, Se agrega un mingitorio y una pileta en cada mesada en Sanitarios. Se agregan 2 cabinas telefónicas en sector Open lado Saenz Peña, se reorganizan todos los privados del sector de gerencia. Se reacondiciona el Server. Se agregan 3 cabinas telefonicas + 3 meetings informales en Open lado Ricardo Gutierrez.


FOTOS Y DESCRIPCION



Sector pasillo c/piso técnico nuevo colocado

Open lado Saenz Peña c/ piso técnico nuevo colocado

Lado Cazadores: coloc. piso técnico en ejecución

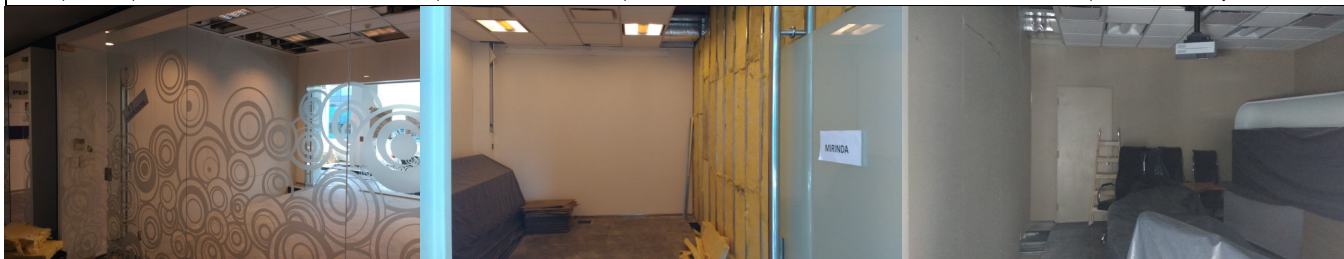

Sala de Reuniones nueva

Sala Mirinda

Sala Telepresence

RESUMEN DE AVANCE

Item	Detalle de tareas en curso
1	Colocación y nivelación de piso técnico
2	Descolocación de instalación eléctrica en puestos y privados según layout original
3	Tabiquería de Durlock en sector Mirinda - Sala Telepresence
4	Colocación de refuerzos según nueva distribución + empaque en baños
5	Desarme de cielloraso desmontable en Open para ajustar a nuevo layout
6	Limpieza general

Item	Detalle de eventos especiales
1	Desmonte y desactivación de controles de acceso en sala detrás de recepción

TAREAS IMPORTANTES DE LA PROXIMA SEMANA

Item	Detalle	Responsable
1	Acopio de materiales varios: Durlock. AA. Instalación eléctrica.	CONTRACT
2	Refuerzos para TV's según plano en privados	CONTRACT
3	Recolocación de cielloraso	CONTRACT
4	Inicio armado de nueva recepción	CONTRACT
5	Distribución de instalación eléctrica a nuevos puestos de trabajo	CONTRACT
6	Re distribución cajas Ackerman en privados	CONTRACT
7	Reemplazo de placas piso técnico y nivelación en privados - finalizando por completo esta tarea	CONTRACT

HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	Fecha	Comentarios	Responsable
1	Reunión con IT	sin fecha	Coordinar tareas relacionadas al cableado estructurado	PEPSICO

5) AVANCE

