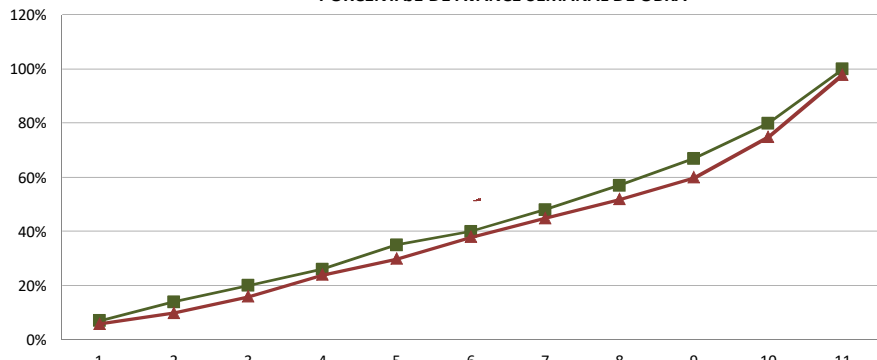


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                         |  |                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| INFORME 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | REPORTE SEMANAL DE OBRA |  | <div>contract<br/>workplaces</div>                                    |             |
| Fecha Reporte 06/12/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                         |  | <div>KUEHNE+NAGEL</div>                                               |             |
| PROYECTO KUEHNE+NAGEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                         |  |                                                                       |             |
| UBICACIÓN Av. Alem 815 - Piso 5 - CABA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                         |  |                                                                       |             |
| Contacto Cliente: Pedro De Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                         |  |                                                                       |             |
| Superficie 1300 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                         |  |                                                                       |             |
| 1) DESCRIPCION DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                         |  |                                                                       |             |
| Nuevas oficinas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                         |  |                                                                       |             |
| 2) FOTOS Y DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |                         |  |                                                                       |             |
| <div></div> |                                                                                                                   |                         |  |                                                                       |             |
| 3) TEMAS CRITICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                         |  |                                                                       |             |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle                                                                                                           |                         |  |                                                                       |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Falta terminar la cañería de la ultima condensadora, y su puesta en marcha                                        |                         |  |                                                                       |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | El lunes nos confirmaron las direcciones para los detectores. Estamos coordinando para el miercoles su colocación |                         |  |                                                                       |             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Solucionar el poco aire en el Server, la temperatura no baja de 28°                                               |                         |  |                                                                       |             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hoy se termina el llenado de la red de sprinklers                                                                 |                         |  |                                                                       |             |
| 4) ESTADO DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                         |  |                                                                       |             |
| Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rubros                                                                                                            |                         |  | Comentarios                                                           | Responsable |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Instalación Termomecánica                                                                                         |                         |  | Falta la puesta en marcha de la condensadora nueva, y solucionar aire |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desagues condensado                                                                                               |                         |  | Terminado                                                             |             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Detección incendio                                                                                                |                         |  | Miercoles se termina. No nos daban las direcciones disponibles        |             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Extinción de incendio                                                                                             |                         |  | Hoy se termina                                                        |             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Colocación de piso vinílico y patagonia.                                                                          |                         |  | Terminado                                                             |             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Instalacion electrica                                                                                             |                         |  | Se va a revisar la fuente para dejarlo con reloj.                     |             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Colocación alfombra                                                                                               |                         |  | Terminado                                                             |             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Armado de muebles de linea                                                                                        |                         |  | Terminado                                                             |             |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pintura                                                                                                           |                         |  | Terminado                                                             |             |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Limpieza                                                                                                          |                         |  | Queda limpiar el cielorraso                                           |             |
| 5) AVANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                         |  |                                                                       |             |
| SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREVISTO                                                                                                          | REAL                    |  |                                                                       |             |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7%                                                                                                                | 6%                      |  |                                                                       |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14%                                                                                                               | 10%                     |  |                                                                       |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20%                                                                                                               | 16%                     |  |                                                                       |             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26%                                                                                                               | 24%                     |  |                                                                       |             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35%                                                                                                               | 30%                     |  |                                                                       |             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40%                                                                                                               | 38%                     |  |                                                                       |             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48%                                                                                                               | 45%                     |  |                                                                       |             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57%                                                                                                               | 52%                     |  |                                                                       |             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67%                                                                                                               | 60%                     |  |                                                                       |             |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80%                                                                                                               | 75%                     |  |                                                                       |             |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                                                                                              | 98%                     |  |                                                                       |             |
| <div><div>PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA</div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                         |  |                                                                       |             |
| FIN DEL DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                         |  |                                                                       |             |
