
MERCADO LIBRE

Obra: EDIFICIO MIRAGOLF – CIUDAD EMPRESARIA – CORDOBA

MINUTA DE REUNION N°6

p/ MERCADO LIBRE: Guillermo Barile – Lucila Siboldi Bengolea
p/ CONTRACT: Marcelo Abella
p/ GIULIANI: Marcelo Pascual
p/ INTERCONNECT: Matias Zunino
p/ PROYECCIONES DIGITALES: Andrea Molina - Facundo Murua

Reunión: Edificio Intecons – Oficinas de Mercado Libre

Fecha: 17 de marzo de 2014

TEMAS VARIOS.

En la fecha se desarrolló una reunión con el objetivo de verificar la integración de las instalaciones eléctrica, corrientes débiles, sistema multimedia y equipamiento.

Definiéndose los siguientes puntos:

Proyecciones Digitales

- informará las especificaciones técnicas de las cajas de cableado (dimensiones totales, medidas del calado de la mesa y peso).
- Quedará a definir el tipo de sistema de control de salas.
- Se modifica la medida de la pantalla de proyección del comedor / sala de capacitación a 92" y su ubicación será a derecha del Led.
- En el comedor / sala de capacitación contará con 2 cámaras para presentaciones una ubicada entre el Led y la pantalla para tomar a los presentes y otra sobre la línea del frente de cristal interno a aproximados 5m del frente de la sala para tomar al operador.
- Verificará si es factible alojar el equipamiento multimedia correspondiente sala de reuniones principal en la pata central de la mesa.
- Confirmará la medida mínima de pantalla para el sistema Interactive y las especificaciones del soporte del proyector.
- Requiere que todo el equipamiento multimedia de cada sala se encuentre en la misma fase.
- Solicita que la caja de conexionado del operador del comedor se en medidas 10x10x10 y que cuente con 220v.

Mercado Libre

- Definirá tipo de sistema de control de salas (Botonera o pantalla Touch)

Giuliani

- Enviará un nuevo esquema de la pata central correspondiente a la mesa de 5 a 7 personas con su plazo de entrega a partir de su aprobación
- Proveerá todas las cajas de conexión ubicadas en Meeting, salas de 5 a 7, puestos operativos y recepción. Quedando a confirmar las cajas de la mesa de la sala de reuniones principal
- Mesa de sala de reuniones principal, se define que contará con 3 patas de iguales características que para las salas de 5 a 7 personas.

Contract

- Modificará el esquema de canalizaciones proyectadas en cañería por bandeja sin tapa quedando la misma aplicada sobre la placa de durlock evitando luces de separación entre sí.



Interconnect

- Se eliminan cajas ATQ bajo las patas de las mesas, quedando la instalación eléctrica finalizada en fichas hembra, cantidad mínima 2 y el cableado estructurado en terminal RJ45, luego el cableado interno de la pata hasta la caja a proveer por Giuliani llevará cinta helicoidal

Multimedia


Se alimentará con energía de UPS

Se amplía la información de los esquemas originales

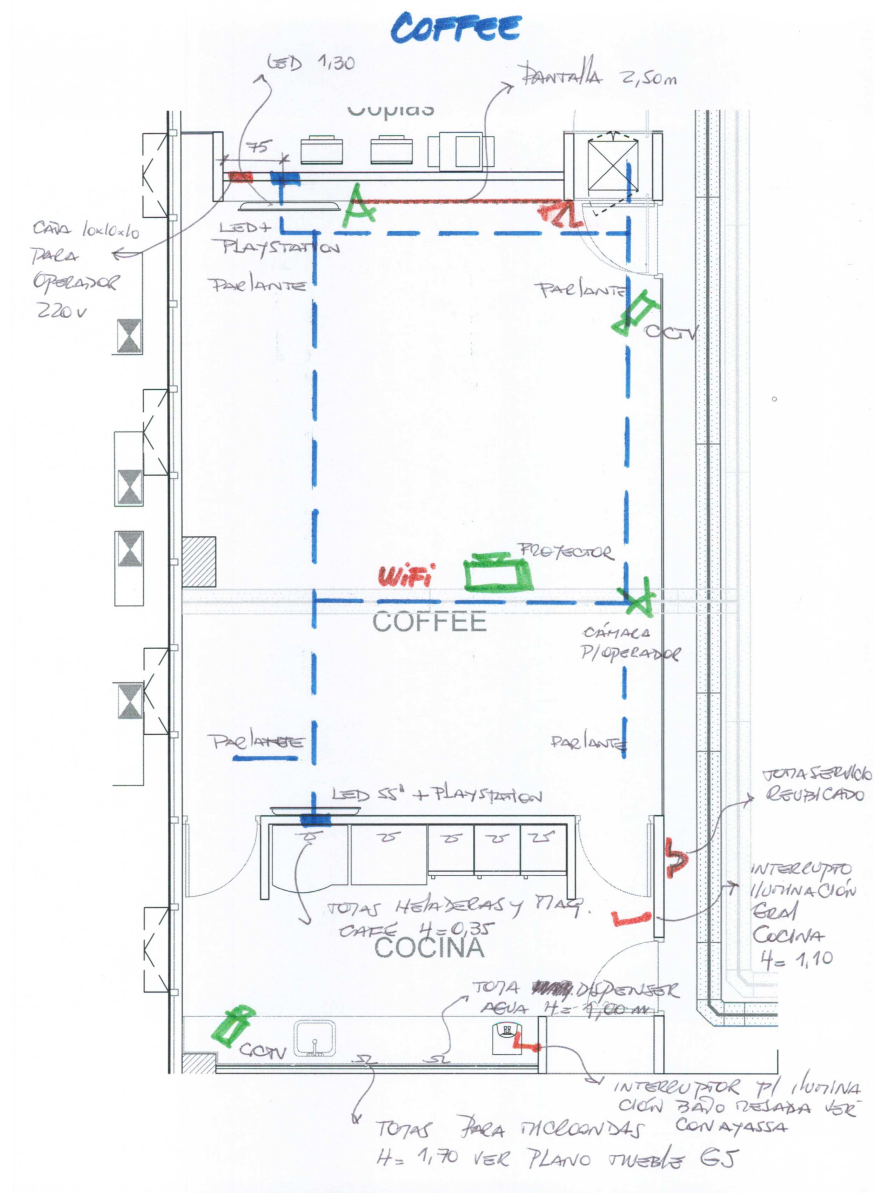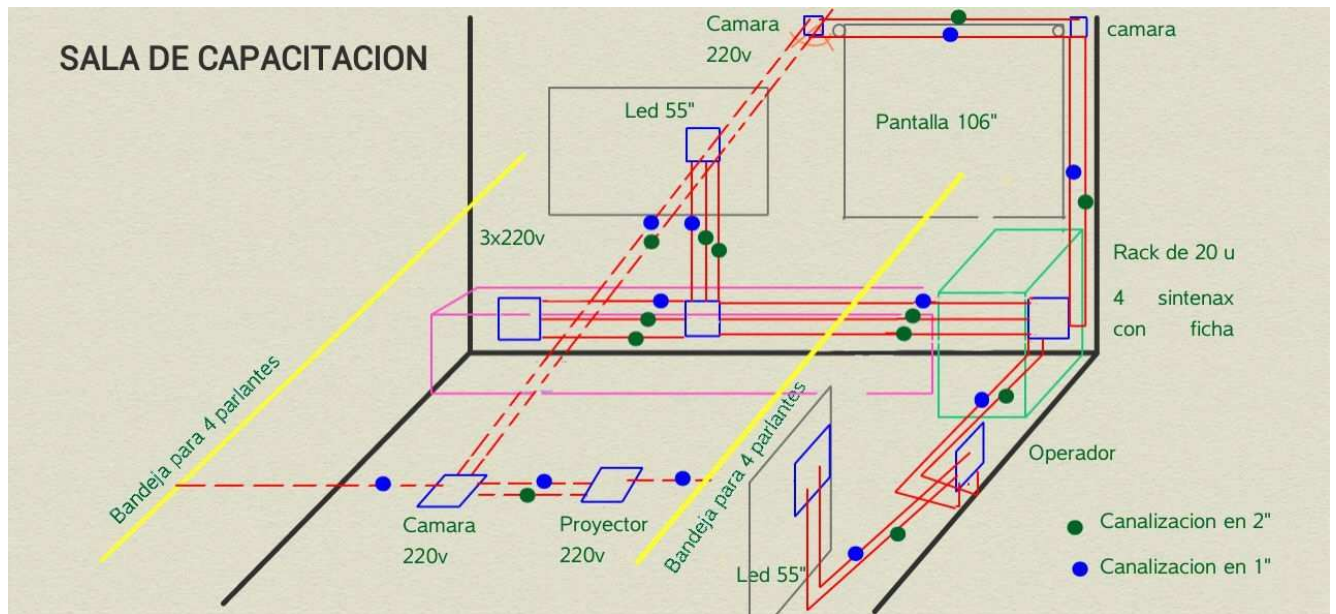


Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

Sala de reuniones Principal

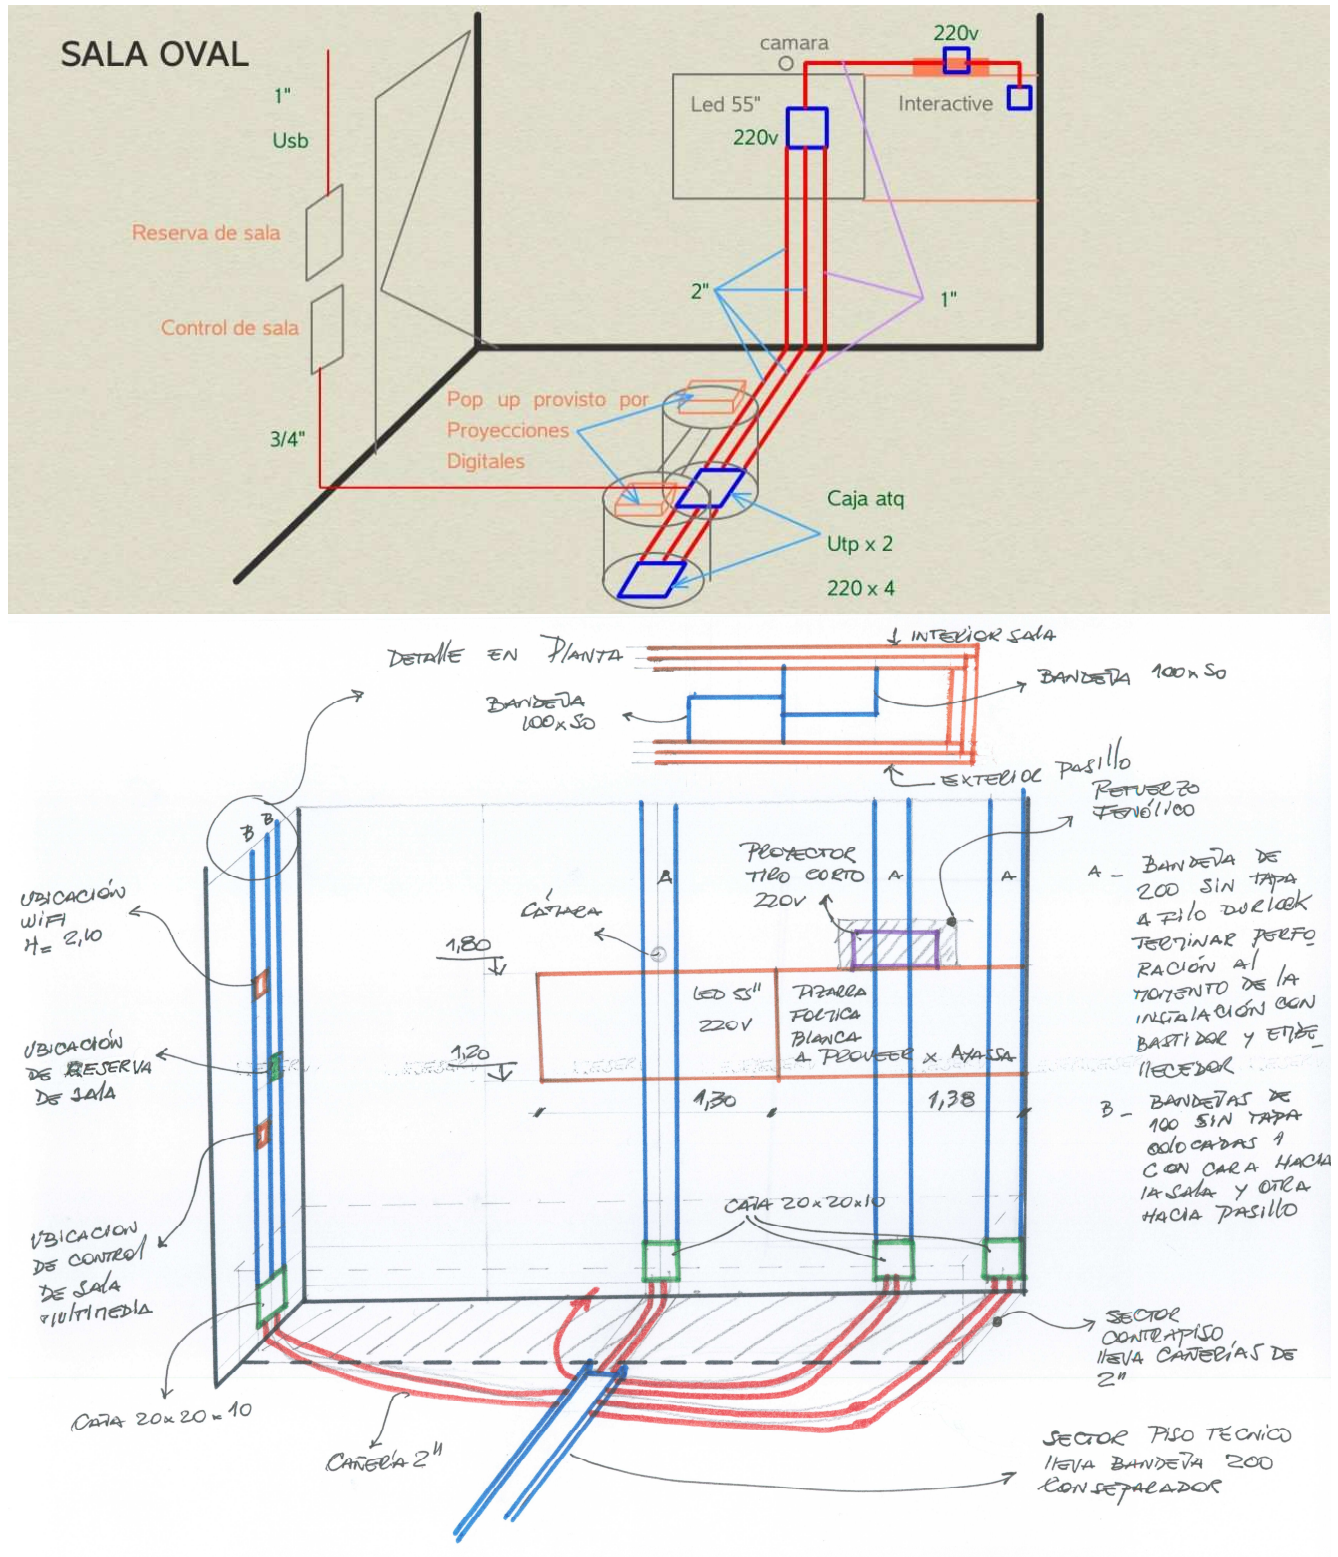


Nota: Queda pendiente definir ubicación de parlantes para incluir su canalización


SALA DE REUNIONES PRINCIPAL

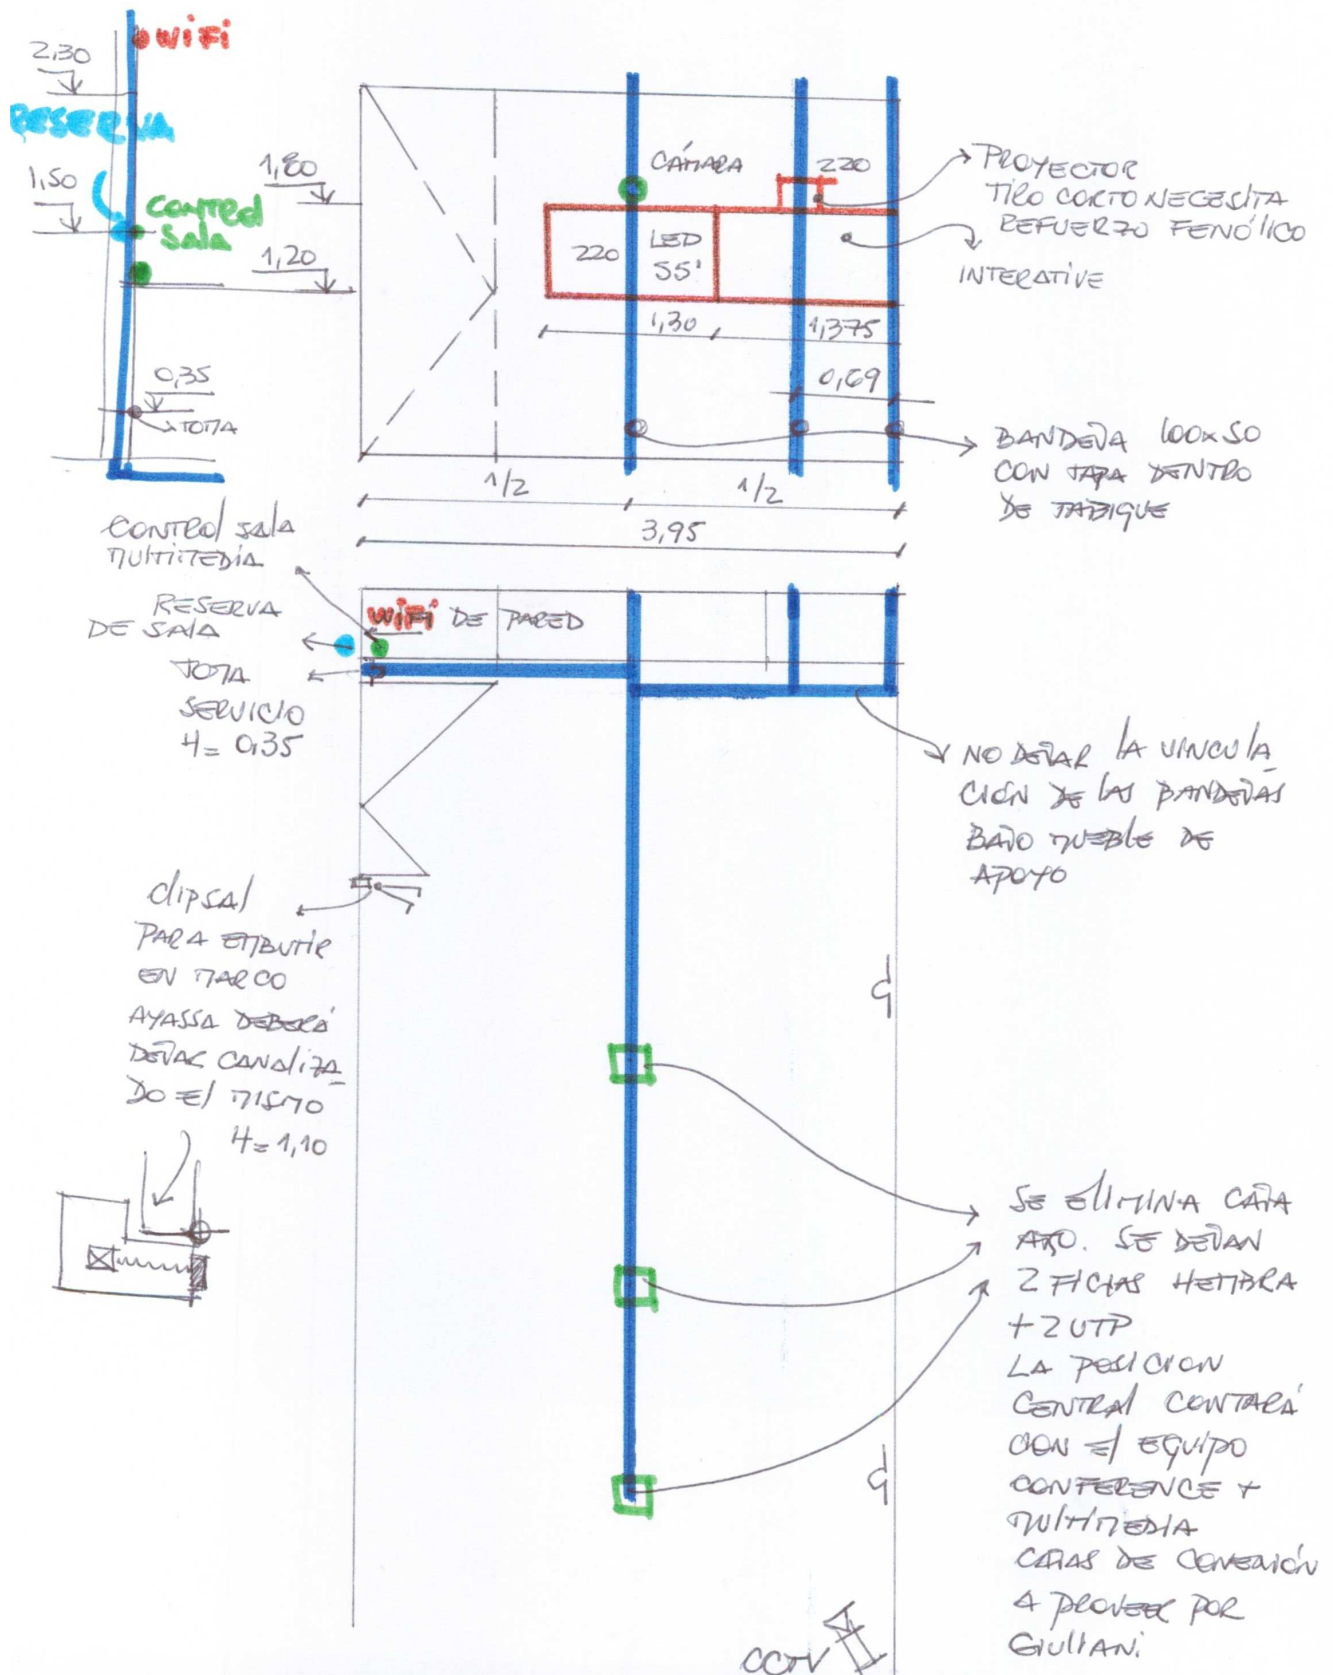

SALA DE 5 A 7 PERSONAS

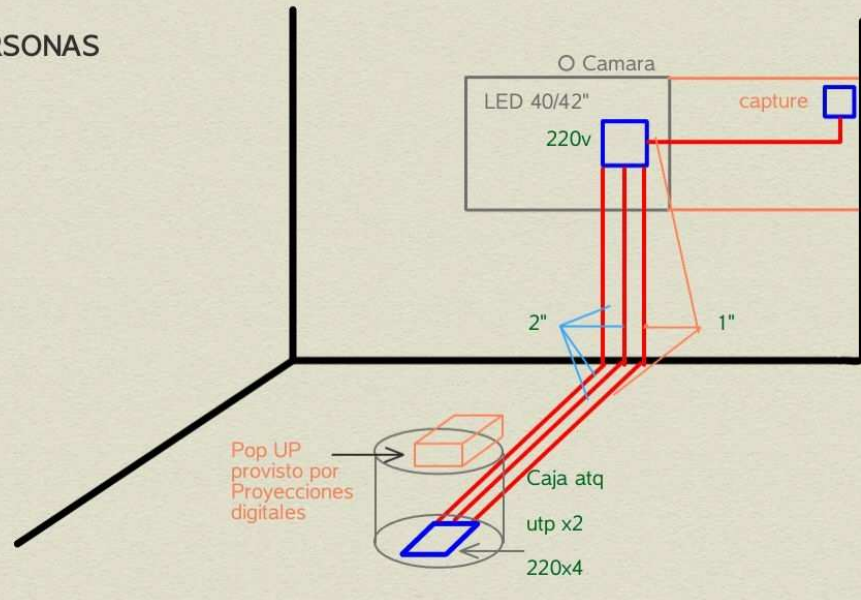

Sala de 5 a 7 personas

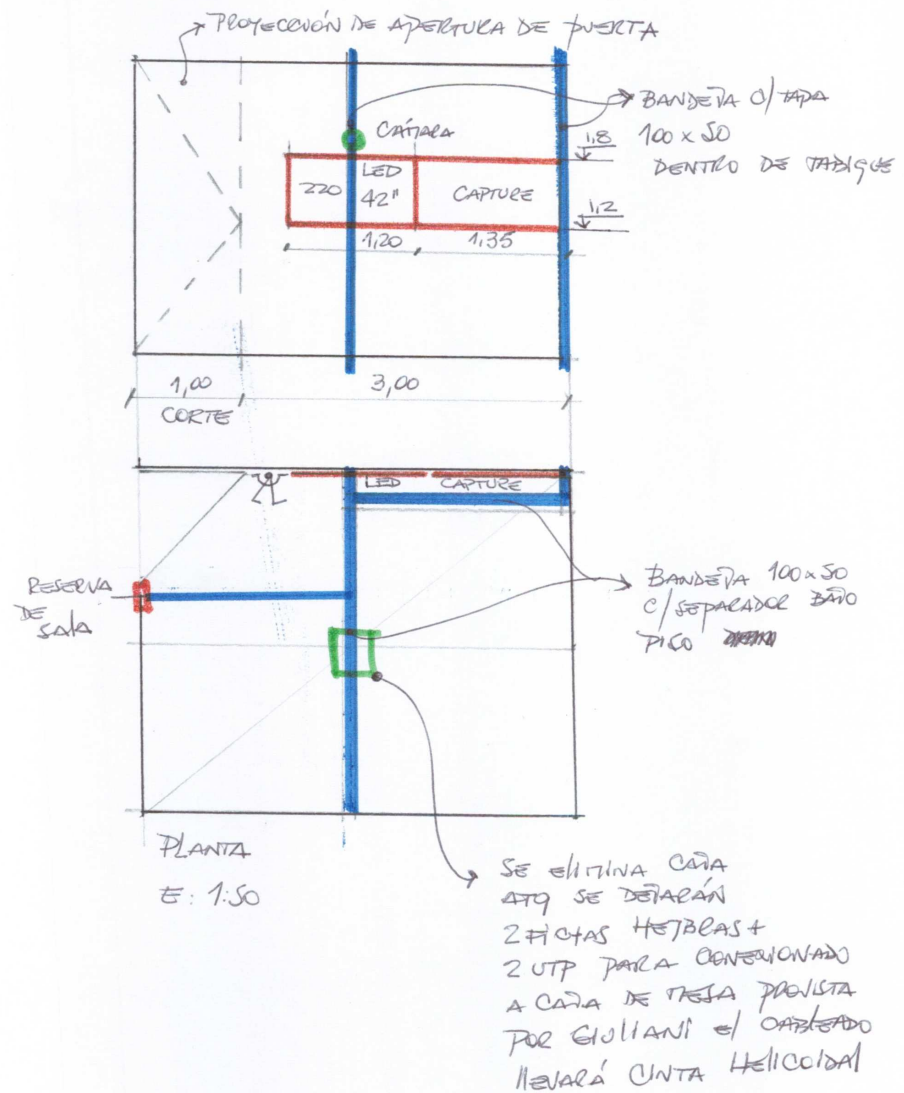

MEETINGS

The diagram illustrates a meeting room setup with a table and a floor. A table is shown with a box labeled "LED 32" containing "1x220v" and "1xhdmi a cablear por Proyecciones Digitales". Below the table, a box labeled "Espacio guardado para de hdmi" contains "220v 220v 220v utp". A red arrow points from the table to a box labeled "A caja de cableado de mesa". A red arrow points from the table to a box labeled "A bandejas bajo piso". A red arrow points from the table to a box labeled "1" and "2".

MEETING

CAJA DE CABLEADO A PROVER X GIULIANI

BANDEJA BAO DEJA PARA RECIBIR CABLEADO A PROVER JUNTO CON EL EQUIPAMIENTO ESPECIAL X AYUSA FONDELLA

BANDEJA 100 x 50 CON TAPA DENTRO DE TABIQUE

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

CARTELERA

Led
220v x2
Utp x 2

1" 2"
