



1 de 3
1549-MIN-151201
Redactada por: Siván Weisz

contract
workplaces

FECHA 01/12/15

LUGAR CONTRACT

CLIENTE KULNI

OBRA NUEVAS OFICINAS – WTC FZ OF. 1901

INTEGRANTES	EMPRESA	EMAIL
Martín Ibarra	WTC FZ / Etermax	martin.ibarra@wtcfreezone.com
Daniel Flom	CONTRACT	dflom@contract.com.uy
Gabriela Carvallo	CONTRACT	gcarvallo@contract.com.uy
Siván Weisz	CONTRACT	sweisz@contract.com.uy

TEMAS DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
DVH	Se mantiene DVH solamente en la puerta y panel vidriado del privado 01. Para Sala de reuniones y Finanzas, se sustituye por cristal templado 10mm.
Vidrios	Se elimina la mampara de cristal de open office (punto 9,07 del presupuesto).
Coverglass	Se mantendrá solamente una faja de piso a techo de aproximadamente 1,20m de ancho en privado 01. El resto, se eliminan.
Access points	Incluir dos access points según plano (ver hoja 3)
Seguridad	Con respecto al punto 22,01 del presupuesto, no habrá intercomunicador. Desean tener solamente una chicharra. Etermax solicita incluir 10 cámaras de seguridad. Ver su ubicación en plano hoja 3.
Mobiliario	Se eliminan dos islas: isla de 4 posiciones anexa a la caja de escalera e isla de 5 posiciones próxima al coffee. En ambos casos se dejará las provisiones para agregar las islas a futuro.
Coffee	Se sustituye las mesas altas y banquetas, por mesas bajas con sillas. Se mantiene las 4 banquetas correspondientes a la barra.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



● TEMAS DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
Gráfica	Se elimina el diseño de la ruleta.
Aire acondicionado	Se ajustará ubicación de equipo del privado 01. Se ubicará contra el equipo de finanzas. Para este sector se imitará el panel vidriado y yeso del privado 05.

● TEMAS A DEFINIR


TEMA	DETALLE	RESPONSABLE
Alfombra	Definir modelo de alfombra.	Etermax
Cableado estructurado	Se evaluará cambiar por cableado estructurado categoría 5.	Contract / Etermax
Seguridad	Etermax desea eliminar el cargador de baterías. Se reajustará el punto 22,06 del presupuesto.	-----
Gráfica	Se estudiará nuevo diseño. Contract solicita manual de identidad de Etermax para elaborar estos diseños.	Etermax
Puffs	Se evaluará colocar puffs en el sector donde se quita la isla de 4 posiciones.	Contract

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.



3 de 3
1549-MIN-151201
Redactada por: Siván Weisz

contract
workplaces

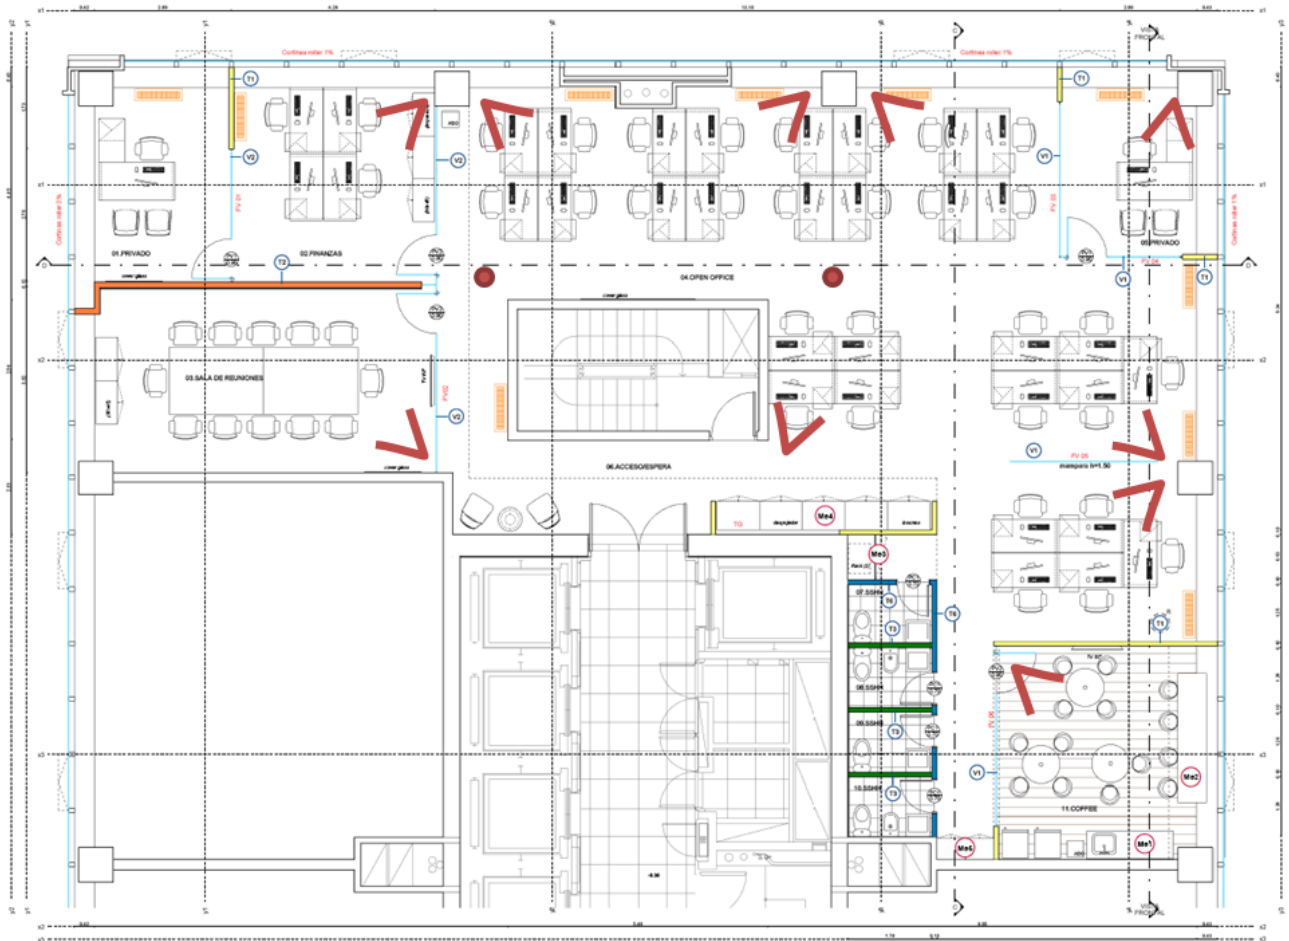

- Access Points
- > Cámaras de seguridad

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.
