Id	Task Name	Duración	Comienzo	Fin
1	**SAMSUNG - Marcelo T de Alvear 2440, José Ingenieros**	**66 días**	**lun 22/10/12**	**vie 11/01/13**
2	**OBRA CIVIL**	**57 días**	**lun 22/10/12**	**sáb 29/12/12**
3	Inicio	1 día	lun 22/10/12	lun 22/10/12
4	Mampostería 8/18/33 y bloques de cemento	12 días	lun 22/10/12	sáb 03/11/12
5	Reparación de carpetas	7 días	mar 30/10/12	mar 06/11/12
6	Canalizaciones para instalaciones electricas / sanitarias / AA	5 días	lun 05/11/12	vie 09/11/12
7	Tapado de canalizaciones	7 días	mié 14/11/12	mié 21/11/12
8	Reubicación de puertas existentes en fachada	3 días	jue 22/11/12	sáb 24/11/12
9	Revoques interiores	30 días	mar 30/10/12	mar 04/12/12
10	Colocacion de revestimientos en baños y cafetería	20 días	mié 05/12/12	sáb 29/12/12
11	Armado de escalera de hormigón armado	15 días	vie 16/11/12	mar 04/12/12
12	**INSTALACION SANITARIA y ARTEFACTOS**	**52 días**	**vie 02/11/12**	**lun 07/01/13**
13	Replanteo	1 día	vie 02/11/12	vie 02/11/12
14	Tedido de desagües primarios y secundarios	7 días	sáb 03/11/12	sáb 10/11/12
15	Tendido de agua F y C	10 días	mié 07/11/12	sáb 17/11/12
16	Instalación de mesadas en baños y cocina	3 días	mié 05/12/12	vie 07/12/12
17	Instalación de artefactos y griferías	5 días	mié 02/01/13	lun 07/01/13
18	**TABIQUERIA DE DURLOCK**	**22 días**	**lun 19/11/12**	**vie 14/12/12**
19	Montaje de estructura metálica de sostén	3 días	lun 19/11/12	mié 21/11/12
20	Montaje de estructura de durlock	6 días	mié 21/11/12	mié 28/11/12
21	Emplacado 1ra placa	4 días	jue 29/11/12	lun 03/12/12
22	Emplacado 2da placa	4 días	vie 07/12/12	mar 11/12/12
23	Terminaciones y masillados	3 días	mié 12/12/12	vie 14/12/12
24	**TABIQUES SEGÚN SISTEMA**	**3 días**	**mié 02/01/13**	**vie 04/01/13**
25	Montaje de frentes de retretes en baños planta baja	3 días	mié 02/01/13	vie 04/01/13
26	**CIELORRASOS**	**7 días**	**vie 09/11/12**	**vie 16/11/12**
27	Armado de cielorraso contínuo y ajustes perimetrales	3 días	vie 09/11/12	lun 12/11/12
28	Armado de cielorraso desmonatable	4 días	mar 13/11/12	vie 16/11/12
29	**INSTALACION ELECTRICA Y CAB ESTRUCTURADO**	**40 días**	**lun 05/11/12**	**vie 21/12/12**
30	Canalizaciones em muros	2 días	lun 05/11/12	mar 06/11/12
31	Canalizaciones sobre cielorraso	4 días	lun 05/11/12	jue 08/11/12
32	Canalizaciones en tabiques	3 días	mar 04/12/12	jue 06/12/12
33	Cableados de tensión	5 días	vie 07/12/12	mié 12/12/12
34	Cableados de iluminación	5 días	mar 13/11/12	sáb 17/11/12
35	Cableados de UTP	5 días	mié 07/11/12	lun 12/11/12
36	Instalación y montaje de cablecanales / faceplates	2 días	jue 13/12/12	vie 14/12/12
37	Armado de tableros	3 días	jue 13/12/12	sáb 15/12/12
38	Certificación de puestos	6 días	sáb 15/12/12	vie 21/12/12
39	Instalación de artefactos de iluminación	3 días	jue 13/12/12	sáb 15/12/12
40	**CARPINTERÍAS, CRISTALES Y HERRAJES**	**28 días**	**lun 05/11/12**	**vie 07/12/12**
41	Instalción de puertas	2 días	jue 06/12/12	vie 07/12/12
42	Provisión e instalación de ventanas interiores	2 días	jue 06/12/12	vie 07/12/12
43	Provisión e instalación de puertas y ventanas blindadas	3 días	lun 05/11/12	mié 07/11/12
44	Reparación y adecuación de carpinterías existentes	5 días	mié 21/11/12	mar 27/11/12
45	Provisión e instalación de reja en GE	1 día	mié 28/11/12	mié 28/11/12
46	**MONTACARGAS**	**3 días**	**mié 28/11/12**	**vie 30/11/12**
47	Provisión e instalación de montacargas	3 días	mié 28/11/12	vie 30/11/12
48	**MUEBLES ESPECIALES**	**8 días**	**sáb 29/12/12**	**mié 09/01/13**
49	Instalación de mueble de cocina bajo mesada	2 días	sáb 29/12/12	mié 02/01/13
50	Lockers metálicos	1 día	mié 09/01/13	mié 09/01/13
51	**PINTURA**	**32 días**	**mié 28/11/12**	**mar 08/01/13**
52	Pintura de zócalos	2 días	mié 02/01/13	jue 03/01/13
53	Pintura de muros y tabiques	32 días	mié 28/11/12	mar 08/01/13
54	Pintura de cielorrasos	20 días	mié 28/11/12	jue 20/12/12
55	Pintura frente interno	10 días	vie 21/12/12	sáb 05/01/13
56	**PISOS**	**35 días**	**jue 22/11/12**	**lun 07/01/13**
57	Colocación de piso porcellanato	7 días	jue 22/11/12	vie 30/11/12
58	Colocación de pisos cerámicos	10 días	sáb 01/12/12	mié 12/12/12
59	Colocación de pisos de goma	10 días	jue 13/12/12	mié 26/12/12
60	Colocación de pisos técnicos	1 día	jue 27/12/12	jue 27/12/12
61	Provisión de zócalos	1 día	vie 28/12/12	vie 28/12/12
62	Colocación de zócalos	3 días	vie 04/01/13	lun 07/01/13
63	**TERMINACIONES**	**3 días**	**mié 09/01/13**	**vie 11/01/13**
64	limpieza final	3 días	mié 09/01/13	vie 11/01/13

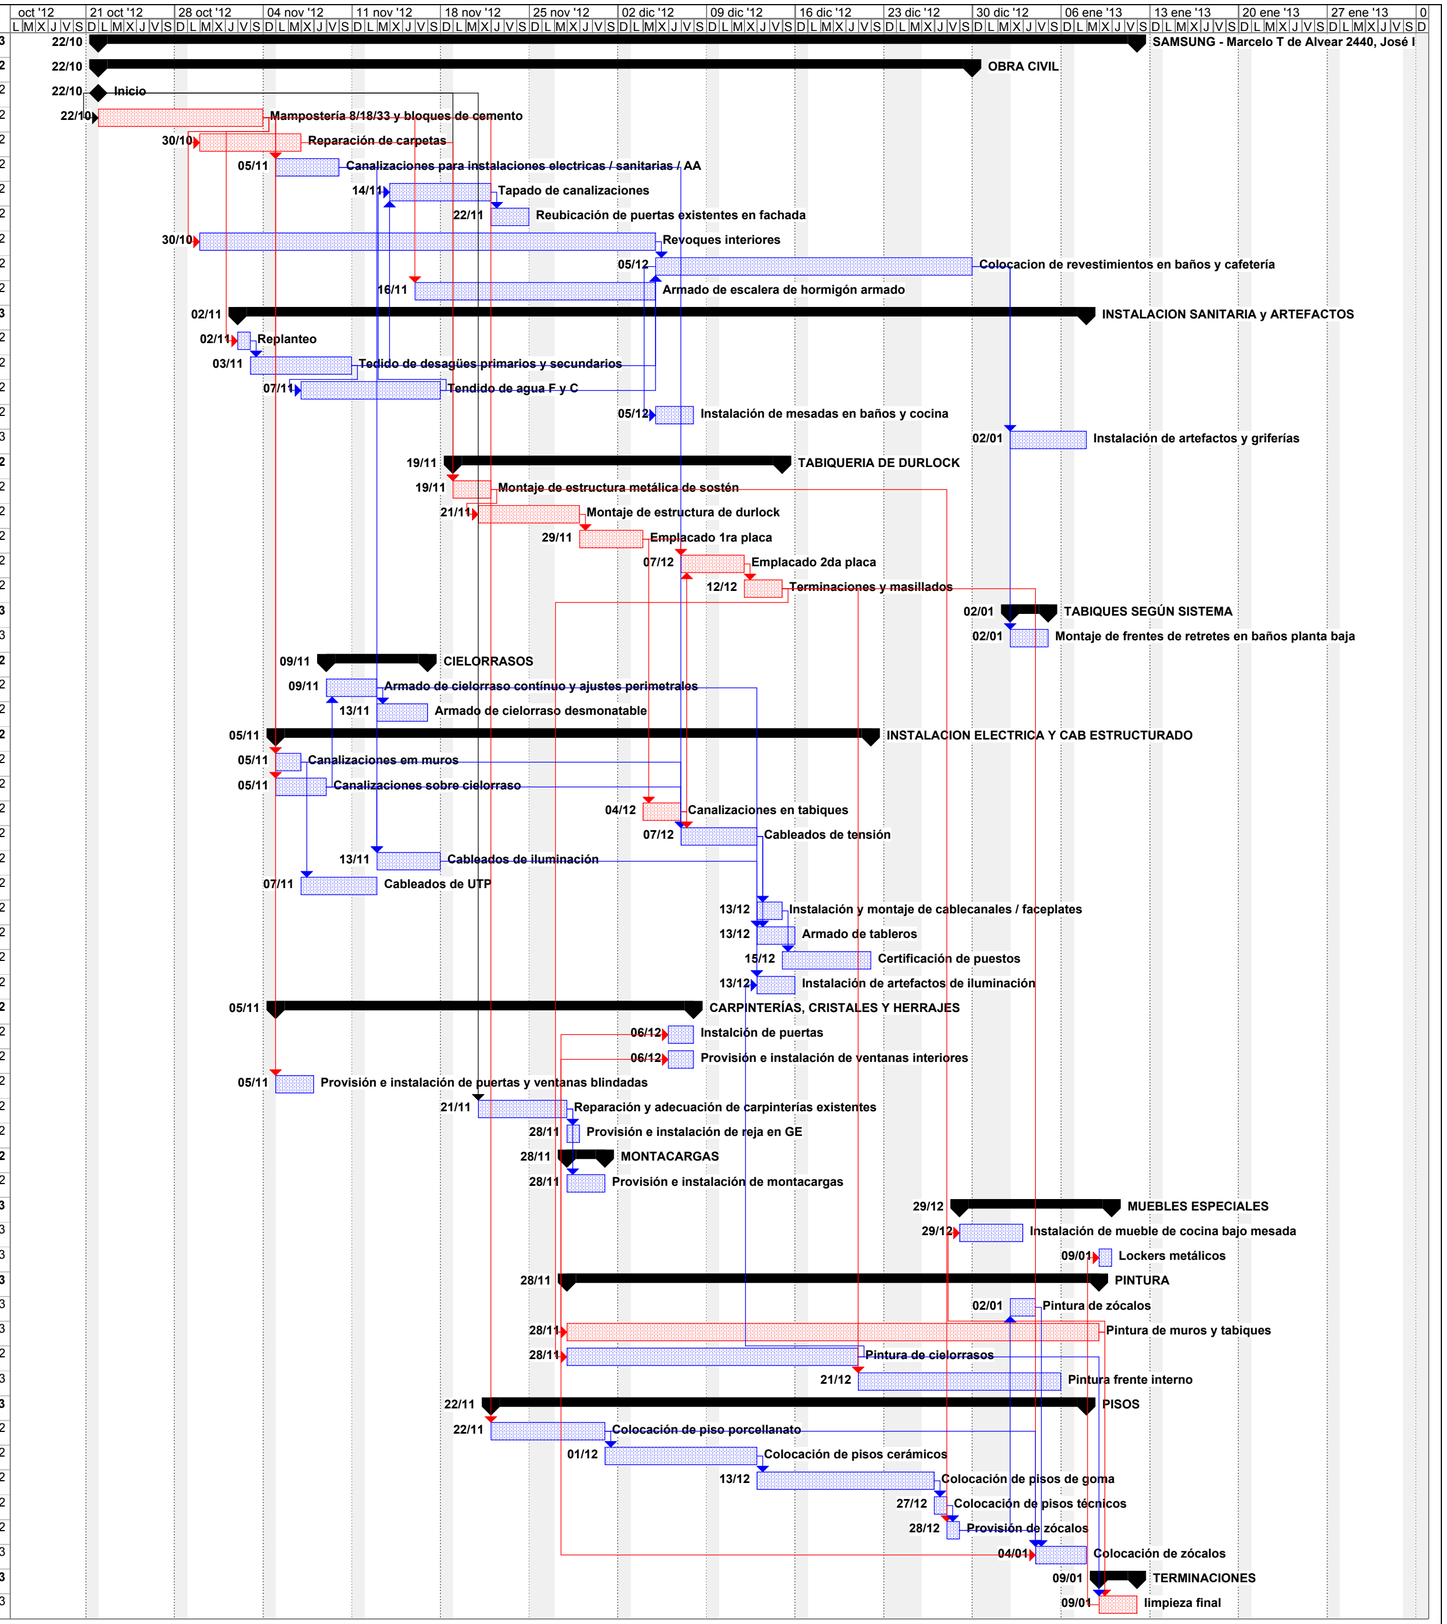

Project: Project Inicial
Date: lun 15/10/12

Task | Task Progress | Critical Task | Critical Task Progress | Milestone | Summary | Rolled Up Task | Rolled Up Critical Task | Rolled Up Milestone | Rolled Up Progress | Split | External Tasks | Project Summary | Group By Summary | Deadline
