Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% trabajo completado	% completado
1	**OBRA NUFARM**	**40 días**	**sáb 30/11/13**	**vie 17/01/14**	**$ 653.073,34**	**100%**	**100%**
2	Inicio de Obra	0 días	sáb 30/11/13	sáb 30/11/13	$ 0,00	100%	100%
3	**DEMOLICIONES**	**1 día**	**sáb 30/11/13**	**lun 02/12/13**	**$ 6.829,58**	**100%**	**100%**
4	Demolición de tabiques de roca de yeso	1 día	sáb 30/11/13	lun 02/12/13	$ 6.829,58	100%	100%
52	**INSTALACION ELECTRICA**	**35 días**	**sáb 30/11/13**	**sáb 11/01/14**	**$ 250.686,81**	**100%**	**100%**
53	Electricidad e iluminación de obra	1 día	sáb 30/11/13	lun 02/12/13	$ 2.673,00	100%	100%
54	Canalización y cableado de circuitos de iluminación	5 días	lun 02/12/13	sáb 07/12/13	$ 9.940,39	100%	100%
59	Cañerías vacías para detección de incendio	2 días	lun 02/12/13	mié 04/12/13	$ 1.418,90	100%	100%
60	Cañerías vacías para access point y cámaras	2 días	mié 04/12/13	vie 06/12/13	$ 5.675,59	100%	100%
58	Cañerías vacías para control de acceso	1 día	vie 06/12/13	sáb 07/12/13	$ 1.891,86	100%	100%
55	Colocación de bandejas por piso	4 días	sáb 07/12/13	jue 12/12/13	$ 15.729,49	100%	100%
56	Colocación de cañerías debajo piso y en tabiques	3 días	jue 12/12/13	lun 16/12/13	$ 16.146,40	100%	100%
57	Cañerías vacías para sistema multimedia	2 días	lun 16/12/13	mié 18/12/13	$ 9.020,13	100%	100%
61	Cableado de tensión común y estabilizada	4 días	lun 16/12/13	vie 20/12/13	$ 25.019,88	100%	100%
62	Cableado de Utp	6 días	vie 20/12/13	sáb 28/12/13	$ 46.634,42	100%	100%
63	Adecuación de Tablero seccional de piso	2 días	jue 26/12/13	sáb 28/12/13	$ 9.864,71	100%	100%
64	Instalación de artefactos de iluminación	2 días	sáb 28/12/13	mar 31/12/13	$ 3.851,29	100%	100%
71	Armado de racks, patch panels, patch cords	1 día	sáb 28/12/13	lun 30/12/13	$ 20.675,36	100%	100%
65	Colocación de tableros de data center y tensión común	2 días	mar 31/12/13	jue 02/01/14	$ 21.621,29	100%	100%
66	Mudanza central telefónica	1 día	jue 02/01/14	vie 03/01/14	$ 16.466,23	100%	100%
67	Vínculo de la fibra óptica	1 día	vie 03/01/14	sáb 04/01/14	$ 14.680,85	100%	100%
68	Vínculo Telefónico	1 día	sáb 04/01/14	lun 06/01/14	$ 7.263,46	100%	100%
69	Reordenamiento rack existente	1 día	lun 06/01/14	mar 07/01/14	$ 12.324,13	100%	100%
70	Cableado de puestos	2 días	jue 09/01/14	sáb 11/01/14	$ 10.187,41	100%	100%
5	**ALBAÑILERIA**	**15 días**	**lun 02/12/13**	**jue 19/12/13**	**$ 9.169,05**	**100%**	**100%**
6	Picado para canalizaciones eléctricas	1 día	lun 02/12/13	mar 03/12/13	$ 7.567,45	100%	100%
7	Desague de Split de Aire	1 día	mié 18/12/13	jue 19/12/13	$ 1.621,60	100%	100%
16	**CIELORRASO CONTINUO**	**4 días**	**lun 02/12/13**	**vie 06/12/13**	**$ 3.290,49**	**100%**	**100%**
17	Ejecución de estructura	2 días	lun 02/12/13	mié 04/12/13	$ 1.645,24	100%	100%
18	Emplaque de cielorraso	2 días	mié 04/12/13	vie 06/12/13	$ 1.645,24	100%	100%
76	**TAREAS A REALIZAR POR EL PROPIETARIO**	**16 días**	**sáb 07/12/13**	**vie 27/12/13**	**$ 12.903,85**	**100%**	**100%**
77	**CIELORRASO DESMONTABLE**	**3 días**	**sáb 07/12/13**	**mié 11/12/13**	**$ 0,00**	**100%**	**100%**
78	Ejecución de cielorraso desmontable	3 días	sáb 07/12/13	mié 11/12/13	$ 0,00	100%	100%
79	**INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO**	**12 días**	**mié 11/12/13**	**jue 26/12/13**	**$ 0,00**	**100%**	**100%**
80	Colocación de flexible	3 días	mié 11/12/13	sáb 14/12/13	$ 0,00	100%	100%
81	Colocación de difusores	2 días	sáb 14/12/13	mar 17/12/13	$ 0,00	100%	100%
82	**ARTEFATOS DE ILUMINACIÓN**	**1 día**	**mié 25/12/13**	**jue 26/12/13**	**$ 0,00**	**100%**	**100%**
83	Provisión de artefactos de iluminación	1 día	mié 25/12/13	jue 26/12/13	$ 0,00	100%	100%
84	**AA SERVER**	**4 días**	**lun 23/12/13**	**vie 27/12/13**	**$ 12.903,85**	**100%**	**100%**
85	Provisión e instalación Split Server	4 días	lun 23/12/13	vie 27/12/13	$ 12.903,85	100%	100%
8	**TABIQUES DE ROCA DE YESO**	**12 días**	**mié 11/12/13**	**jue 26/12/13**	**$ 33.328,14**	**100%**	**100%**
9	Ejecución de estructura	3 días	mié 11/12/13	sáb 14/12/13	$ 8.332,03	100%	100%
10	Emplacado de 1 cara	3 días	sáb 14/12/13	mié 18/12/13	$ 8.332,03	100%	100%
11	Emplacado de 2 cara y masilla	3 días	mié 18/12/13	lun 23/12/13	$ 8.332,03	100%	100%
12	Refuerzos sobre cielorraso para sujeción de frentes vidriados	3 días	lun 23/12/13	jue 26/12/13	$ 8.332,03	100%	100%
24	**PISOS ALFOMBRADOS**	**21 días**	**jue 12/12/13**	**mar 07/01/14**	**$ 105.096,49**	**100%**	**100%**
25	Definición/compra de alfombra modular	0 días	jue 12/12/13	jue 12/12/13	$ 91.155,35	100%	100%
26	Instalación de alfombra modular	2 días	sáb 04/01/14	mar 07/01/14	$ 13.901,14	100%	100%
27	**PISO DE GOMA**	**22 días**	**jue 12/12/13**	**mié 08/01/14**	**$ 4.303,99**	**100%**	**100%**
28	Definición/compra de piso encastrable de goma	0 días	jue 12/12/13	jue 12/12/13	$ 3.745,89	100%	100%
29	Instalación de piso de goma	1 día	mar 07/01/14	mié 08/01/14	$ 608,10	100%	100%
32	**CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES**	**23 días**	**sáb 14/12/13**	**sáb 11/01/14**	**$ 57.073,44**	**100%**	**100%**
33	Medición de carpinterías	0 días	sáb 14/12/13	sáb 14/12/13	$ 0,00	100%	100%
34	Colocación de puertas enchapadas lustre caoba	3 días	mié 08/01/14	sáb 11/01/14	$ 57.073,44	100%	100%
35	**CRISTALES**	**27 días**	**sáb 14/12/13**	**jue 16/01/14**	**$ 74.996,14**	**100%**	**100%**
36	Medición de Frentes vidriados	0 días	sáb 14/12/13	sáb 14/12/13	$ 0,00	100%	100%
37	Colocación de frentes vidriados templados de 10mm con perfil "U"	3 días	vie 10/01/14	mar 14/01/14	$ 66.553,03	100%	100%
38	Colocación de Puerta pivot loco	1 día	mar 14/01/14	mié 15/01/14	$ 4.053,99	100%	100%
39	Colocación de Pizarra en salas de reuniones	1 día	mié 15/01/14	jue 16/01/14	$ 4.389,12	100%	100%
13	**HERRERIA**	**1 día**	**mié 18/12/13**	**jue 19/12/13**	**$ 2.364,83**	**100%**	**100%**
14	Refuerzo para puerta pivot loco	1 día	mié 18/12/13	jue 19/12/13	$ 1.418,90	100%	100%
15	Refuerzo para soporte proyector	1 día	mié 18/12/13	jue 19/12/13	$ 945,93	100%	100%
19	**PINTURA**	**12 días**	**vie 20/12/13**	**sáb 04/01/14**	**$ 27.885,18**	**100%**	**100%**
20	Preparación y pintado de tabiques	12 días	vie 20/12/13	sáb 04/01/14	$ 13.942,59	100%	100%
21	Preparación y pintado de cielorraso	4 días	lun 23/12/13	vie 27/12/13	$ 13.942,59	100%	100%
46	**INSTALACION DETECCION DE INCENDIO**	**2 días**	**vie 20/12/13**	**mar 24/12/13**	**$ 4.175,61**	**100%**	**100%**
47	Vínculo con central existente	1 día	vie 20/12/13	lun 23/12/13	$ 3.378,33	100%	100%
48	Colocación de Detector	1 día	lun 23/12/13	mar 24/12/13	$ 797,29	100%	100%
30	**ZOCALOS**	**2 días**	**lun 23/12/13**	**mié 25/12/13**	**$ 4.743,17**	**100%**	**100%**
31	Colocación de zócalos mdf	2 días	lun 23/12/13	mié 25/12/13	$ 4.743,17	100%	100%
22	**PISO TECNICO**	**1 día**	**sáb 28/12/13**	**lun 30/12/13**	**$ 6.621,52**	**100%**	**100%**
23	Nivelación y catalogo de piso técnico	1 día	sáb 28/12/13	lun 30/12/13	$ 6.621,52	100%	100%
40	**CORTINAS Y PERSIANAS**	**2 días**	**mar 07/01/14**	**jue 09/01/14**	**$ 52.154,60**	**100%**	**100%**
41	Colocación de cortinas screem y blackout	2 días	mar 07/01/14	jue 09/01/14	$ 52.154,60	100%	100%
42	**MOBILIARIO**	**3 días**	**mar 07/01/14**	**vie 10/01/14**	**$ 168.202,00**	**100%**	**100%**
43	Armado de puestos de trabajos y muebles de guardado	3 días	mar 07/01/14	vie 10/01/14	$ 168.202,00	100%	100%
72	**SISTEMA DE MULTIMEDIA**	**3 días**	**sáb 11/01/14**	**mié 15/01/14**	**$ 0,00**	**100%**	**100%**
73	Provisión y cableado de sistema de multimedia (PROVEE ICAP)	3 días	sáb 11/01/14	mié 15/01/14	$ 0,00	100%	100%
74	**TERMINACIONES VARIAS**	**2 días**	**sáb 11/01/14**	**mar 14/01/14**	**$ 17.857,83**	**100%**	**100%**
75	Detalles Finales	2 días	sáb 11/01/14	mar 14/01/14	$ 17.857,83	100%	100%
44	**GRAFICA Y SEÑALIZACION**	**2 días**	**mié 15/01/14**	**vie 17/01/14**	**$ 11.310,64**	**100%**	**100%**
45	Colocación de Vinilos	2 días	mié 15/01/14	vie 17/01/14	$ 11.310,64	100%	100%
49	**INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO (CLIENTE)**	**2 días**	**mié 15/01/14**	**vie 17/01/14**	**$ 0,00**	**100%**	**100%**
50	Vínculo con sistema existente	1 día	mié 15/01/14	jue 16/01/14	$ 0,00	100%	100%
51	Instalación de sistema de control de acceso (la colocación de los equipos depende de entrega del proveedor)	2 días	mié 15/01/14	vie 17/01/14	$ 0,00	100%	100%

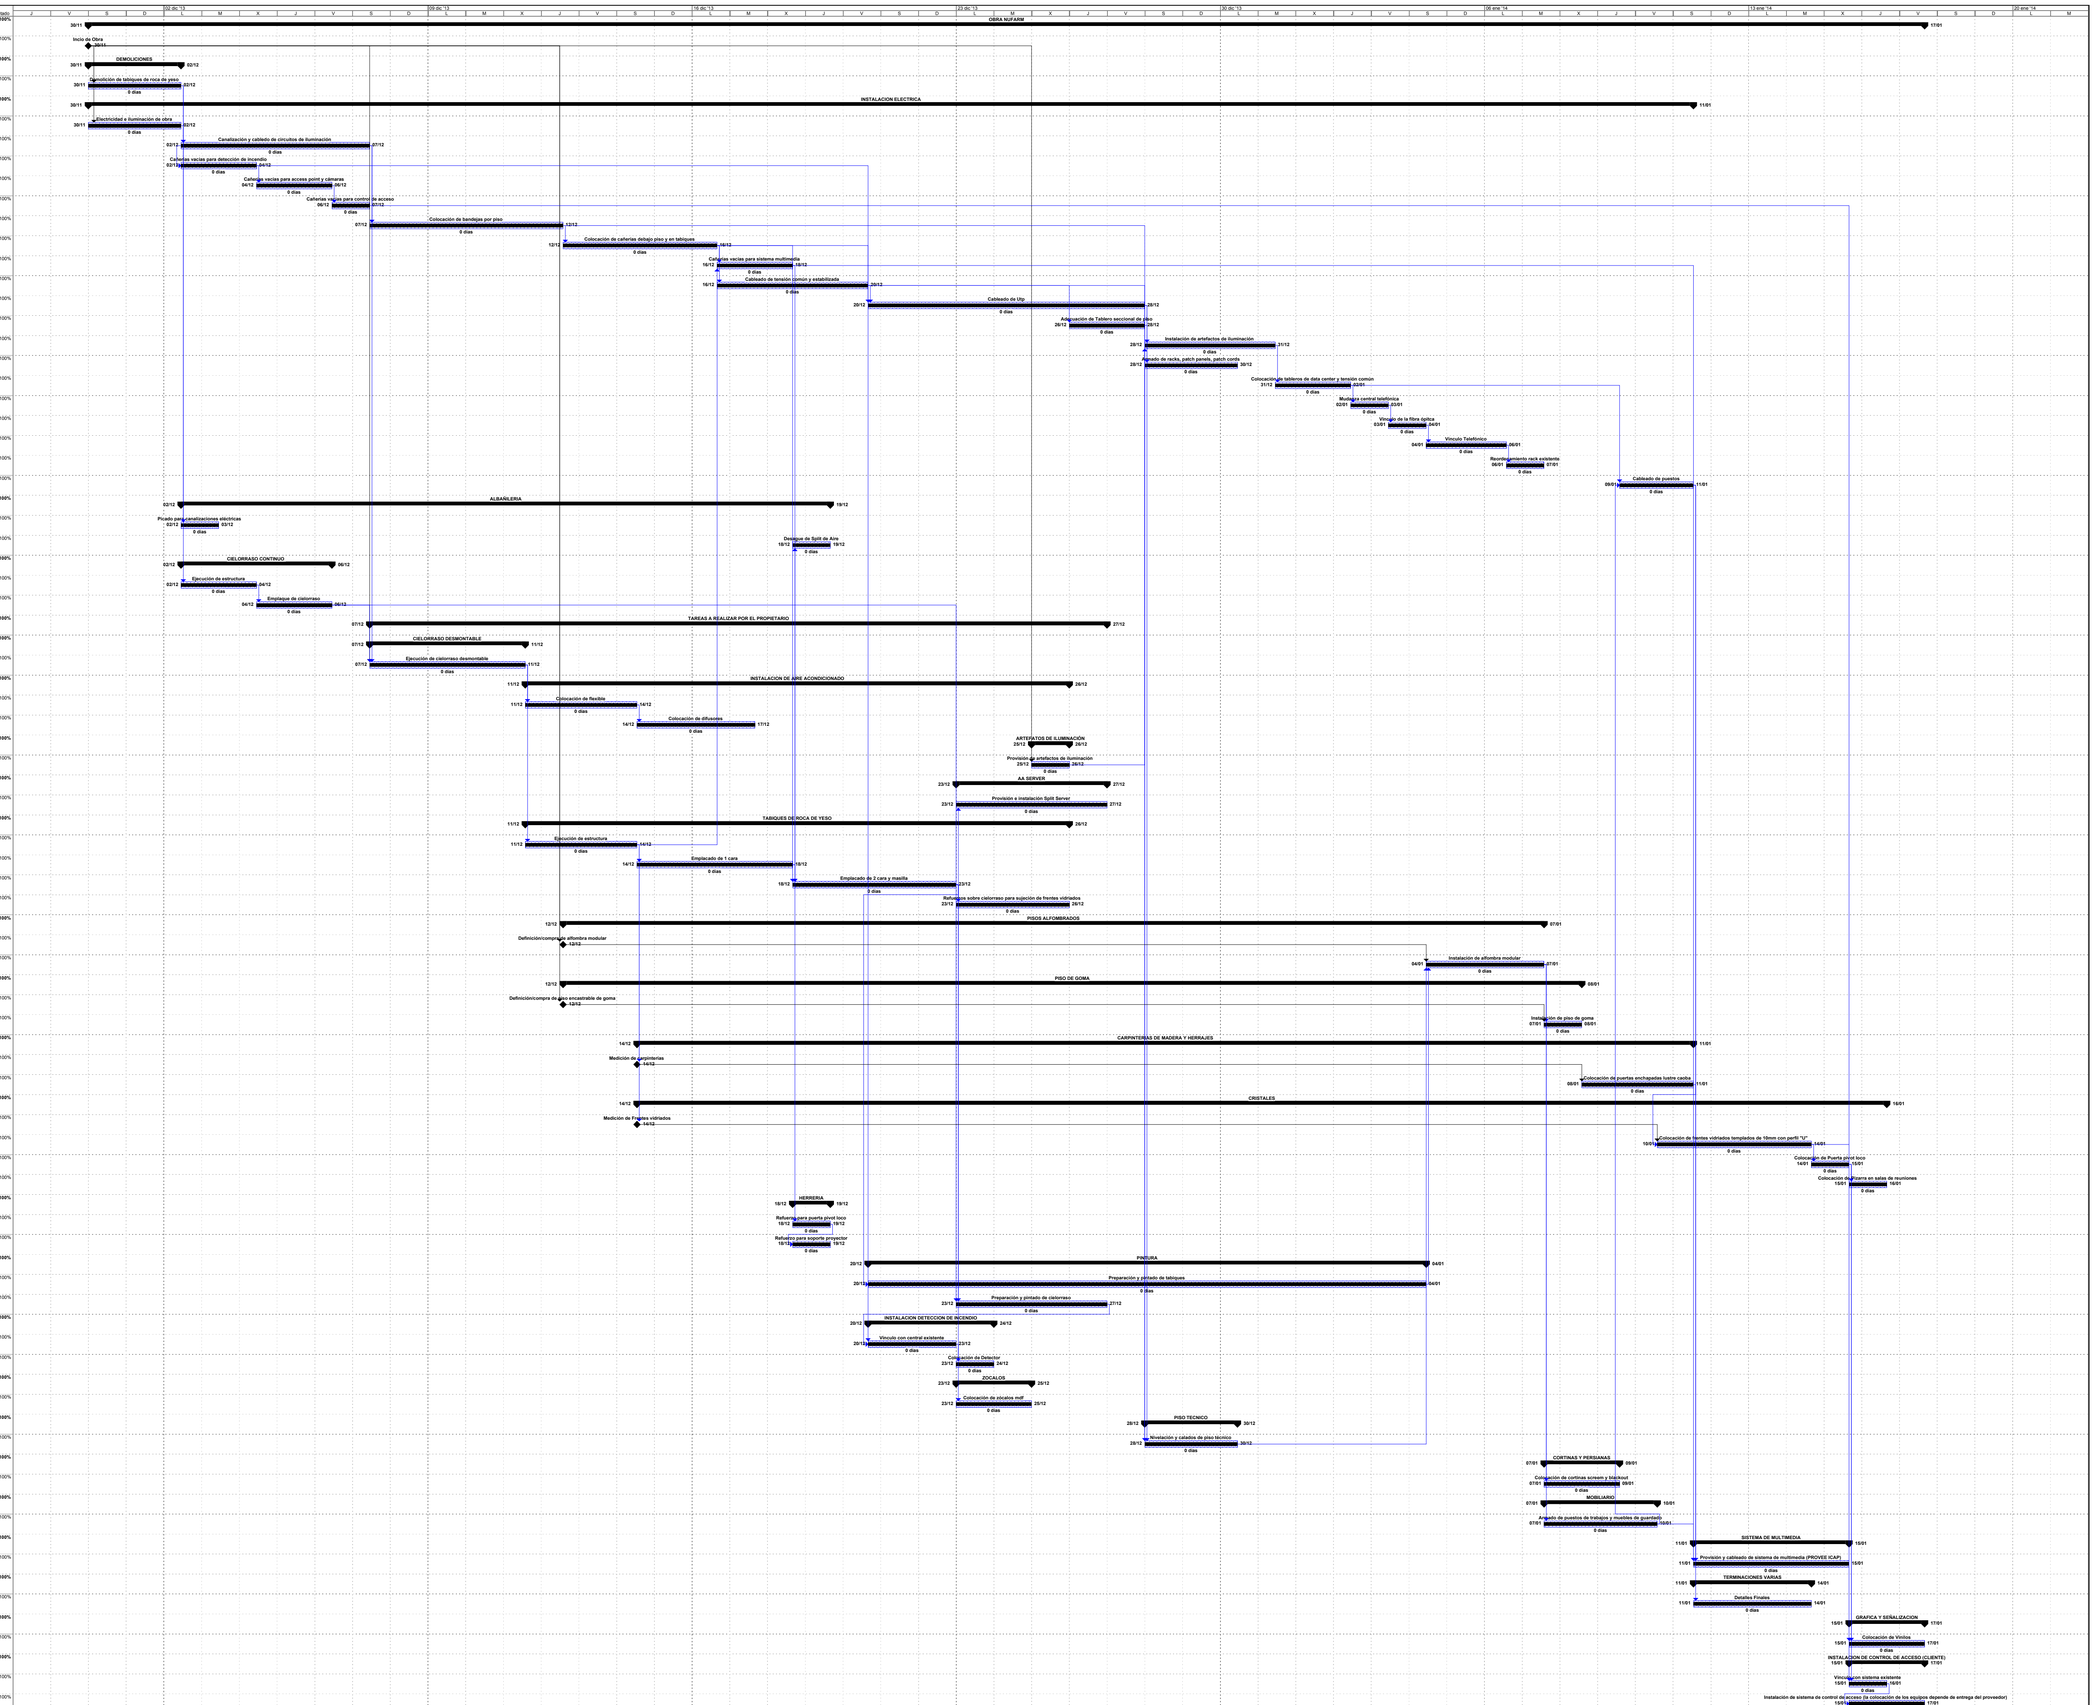

Proyecto: 2013-10-10 CRONOGR
Fecha: mar 18/03/14

Tarea | Tarea crítica | Progreso | Hito | Resumen | Tarea resumida | Tarea crítica resumida | Hito resumido | Progreso resumido | División | Tareas externas | Resumen del proyecto | Agrupar por síntesis | Fecha límite
