CRONOGRAMA VISA 7 y 8- informe 2 - al 14.04.29

Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
1		**Obra: VISA 7 y 8**	**102 días**	**lun 31/03/14**	**jue 10/07/14**	**33%**
2		Inicio de obra	0 días	lun 07/04/14	lun 07/04/14	0%
3	✓	**DEMOLICIONES**	**24 días**	**lun 07/04/14**	**mié 30/04/14**	**100%**
4	✓	Trabajos de demolicion de cielorrasos en placa de roca de yeso	7 días	lun 07/04/14	dom 13/04/14	100%
5	✓	Trabajos de demolición de tabiques en placas de roca de yeso; espesor promedio 0,10m	3 días	dom 13/04/14	mar 15/04/14	100%
6	✓	Demolición de revestimientos cerámicos en el 8vo piso y artefactos	3 días	lun 28/04/14	mié 30/04/14	100%
7	✓	Picado de contrapiso para canalizaciones	3 días	lun 28/04/14	mié 30/04/14	100%
8	✓	Decolocación de piso técnico, alfombra y piso de goma	2 días	lun 07/04/14	mar 08/04/14	100%
9	✓	Decolocación de mueble y mesada de cocina 7mo	1 día	lun 07/04/14	lun 07/04/14	100%
10		**ALBAÑILERIA**	**23 días**	**mar 15/04/14**	**mié 07/05/14**	**40%**
11		Colocación de cerámica para baño 8vo piso	7 días	mar 15/04/14	lun 21/04/14	0%
12		Reparacón de carpeta	7 días	jue 01/05/14	mié 07/05/14	80%
13		**TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO**	**24,6 días**	**vie 25/04/14**	**lun 19/05/14**	**87%**
14	✓	Ejecución de estructura	3 días	vie 25/04/14	dom 27/04/14	100%
15	✓	Emplacado de 1º cara	5 días	dom 27/04/14	jue 01/05/14	100%
16		Emplacado de 2º cara	4 días	vie 09/05/14	lun 19/05/14	60%
17		**CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO**	**19 días**	**mar 29/04/14**	**sáb 17/05/14**	**60%**
18		Ejecución de cielorraso continuo	15 días	mar 29/04/14	sáb 17/05/14	60%
19		**CIELORRASO MODULAR**	**13 días**	**vie 09/05/14**	**mié 21/05/14**	**10%**
20		Armado de nuevos cielorraso modular	10 días	vie 09/05/14	mié 21/05/14	10%
21		**PISOS ALFOMBRADOS**	**60 días**	**lun 07/04/14**	**jue 05/06/14**	**0%**
22	✓	Definición/Compra de alfombra	0 días	lun 07/04/14	lun 07/04/14	100%
23		Instalación de alfombra en rollo	4 días	lun 02/06/14	jue 05/06/14	0%
24		**PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA**	**59 días**	**lun 07/04/14**	**mié 04/06/14**	**0%**
25	✓	Definición/Compra de piso vinilico	0 días	lun 07/04/14	lun 07/04/14	100%
26		Instalación de piso vinilico	3 días	lun 02/06/14	mié 04/06/14	0%
27		**PISOS TECNICOS**	**2 días**	**sáb 10/05/14**	**dom 11/05/14**	**0%**
28		Reinstalación de piso técnico y calados	2 días	sáb 10/05/14	dom 11/05/14	0%
29		**PINTURA**	**18 días**	**jue 15/05/14**	**dom 01/06/14**	**0%**
30		Preparación y pintura muros y tabiques latex satinado	12 días	mié 21/05/14	dom 01/06/14	0%
31		Preparación y pintura cielorraso latex común	11 días	jue 15/05/14	dom 25/05/14	0%
32		**CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES**	**36 días**	**vie 02/05/14**	**vie 06/06/14**	**5%**
33		Puerta especial, simple hoja , laqueada , a medida	2 días	vie 02/05/14	sáb 03/05/14	30%
34		Reacondicionamiento de fan coil existentes y revestimiento de acceso 7mo piso	10 días	mié 28/05/14	vie 06/06/14	0%
35		**HERRERIA**	**36 días**	**lun 07/04/14**	**lun 12/05/14**	**0%**
36		Soporte guias de puertas plegadizas y/o corredizas	3 días	sáb 10/05/14	lun 12/05/14	0%
37		Caño estructural para soporte puerta blindex y colocación de puerta F60	2 días	sáb 10/05/14	dom 11/05/14	0%
38		Apoyo de Unidades Exteriores de Aire acondicionado	3 días	lun 07/04/14	mié 09/04/14	0%
39		**CRISTALES**	**10,3 días**	**lun 02/06/14**	**jue 12/06/14**	**30%**
40		Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral	6 días	lun 02/06/14	mar 10/06/14	30%
41		Puertas de cristal	3 días	dom 08/06/14	jue 12/06/14	30%
42		**DIVISORIOS MOVILES**	**25 días**	**sáb 10/05/14**	**mar 03/06/14**	**0%**
43		Colocación de Guía para divisor móvil	2 días	sáb 10/05/14	dom 11/05/14	0%
44		Provisión y colocación de paneles móviles	2 días	lun 02/06/14	mar 03/06/14	0%
45		**MESADAS**	**20 días**	**jue 22/05/14**	**mar 10/06/14**	**0%**
46		Medición de mesadas	0 días	dom 25/05/14	dom 25/05/14	0%
47		Instalación de mesada Granito Gris Mara	2 días	lun 09/06/14	mar 10/06/14	0%
48		Colocación de divisorios de mingitorio	1 día	jue 22/05/14	jue 22/05/14	0%
49		**INSTALACION SANITARIA**	**13 días**	**sáb 10/05/14**	**jue 22/05/14**	**0%**
50		Instalación sanitaria en coffee y sanitarios	8 días	sáb 10/05/14	sáb 17/05/14	0%
51		Colocación de grifería en baño y cocina	1 día	jue 22/05/14	jue 22/05/14	0%
52		**INSTALACION ELECTRICA**	**90 días**	**lun 07/04/14**	**sáb 05/07/14**	**42%**
53	✓	Tablero eléctrico de obra	3 días	lun 07/04/14	mié 09/04/14	100%
54		Colocación de bandejas en Data Center	5 días	lun 12/05/14	vie 16/05/14	0%
55	✓	Colocación de cañerías para piso y en tabiques	5 días	jue 01/05/14	lun 05/05/14	100%
56	✓	Cañerías Multimedia	5 días	sáb 03/05/14	mié 07/05/14	100%
57		Canalización y cableado de iluminacion	15 días	lun 14/04/14	lun 28/04/14	80%
58		Cañería vacía de CA, CCTV, termostatos, deteccion de incendio	3 días	sáb 26/04/14	lun 28/04/14	50%
59		Cableado tensión común y dedicada	10 días	sáb 17/05/14	lun 26/05/14	80%
60		Adecuación de tablero seccional	9 días	vie 06/06/14	sáb 14/06/14	0%
61		Cableado estructurado	10 días	mar 27/05/14	jue 05/06/14	0%
62		Armado de racks, patch panels, patch cords	6 días	lun 30/06/14	sáb 05/07/14	0%
63		Colocación de Face Plate en puestos de trabajo	5 días	dom 29/06/14	jue 03/07/14	0%
64		Provisión e instalación de cajas de piso y periscopios	3 días	dom 29/06/14	mar 01/07/14	65%
65		Armado de tableros	15 días	dom 15/06/14	dom 29/06/14	0%
66		Cableado de puestos 7mo	8 días	vie 13/06/14	vie 20/06/14	60%
67		Cableado de puestos 8vo	8 días	jue 26/06/14	jue 03/07/14	60%
68		**INSTALACION DE CONTROL DE SCCESO**	**5 días**	**lun 12/05/14**	**vie 16/05/14**	**40%**
69		Instalación de control de acceso	5 días	lun 12/05/14	vie 16/05/14	40%
70		**INSTALACION DE CCTV**	**5 días**	**mié 14/05/14**	**dom 18/05/14**	**0%**
71		Instalación de cámaras de seguridad	5 días	mié 14/05/14	dom 18/05/14	0%
72		**INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION**	**69 días**	**lun 31/03/14**	**sáb 07/06/14**	**30%**
73	✓	Compra de equipos bajosilueta	0 días	lun 31/03/14	lun 31/03/14	100%
74		Colocación de equipos en stock	15 días	vie 09/05/14	vie 23/05/14	0%
75		Colocación de equipos bajosilueta y conductos nuevos, de acuerdo a nuevo layout	7 días	dom 01/06/14	sáb 07/06/14	80%
76		Instalación de cañerías, desgues y conductos	10 días	mar 29/04/14	jue 08/05/14	50%
77		Instalación de split	3 días	vie 09/05/14	dom 11/05/14	0%
78		**GRAFICA Y SEÑALIZACION**	**4 días**	**jue 12/06/14**	**lun 16/06/14**	**0%**
79		Colocación de vinilos	4 días	jue 12/06/14	lun 16/06/14	0%
80		**MUEBLES ESPECIALES**	**67 días**	**lun 07/04/14**	**jue 12/06/14**	**11%**
81		Muebles de cocina 7 y 8	4 días	jue 05/06/14	dom 08/06/14	30%
82		Definición y Compra de Equipamiento Caporaso	0 días	lun 07/04/14	lun 07/04/14	0%
83		Armado de Equipamiento Caporaso	7 días	vie 06/06/14	jue 12/06/14	0%
84		**MUDANZA PISO 8**	**5 días**	**mié 25/06/14**	**lun 30/06/14**	**0%**
85		Mudanza de personal a piso 7mo	0 días	mié 25/06/14	mié 25/06/14	0%
86		Armado de muebles existentes reentelados	5 días	mié 25/06/14	lun 30/06/14	0%
87		**VARIOS**	**7 días**	**vie 04/07/14**	**jue 10/07/14**	**0%**
88		Detalles terminaciones	7 días	vie 04/07/14	jue 10/07/14	0%

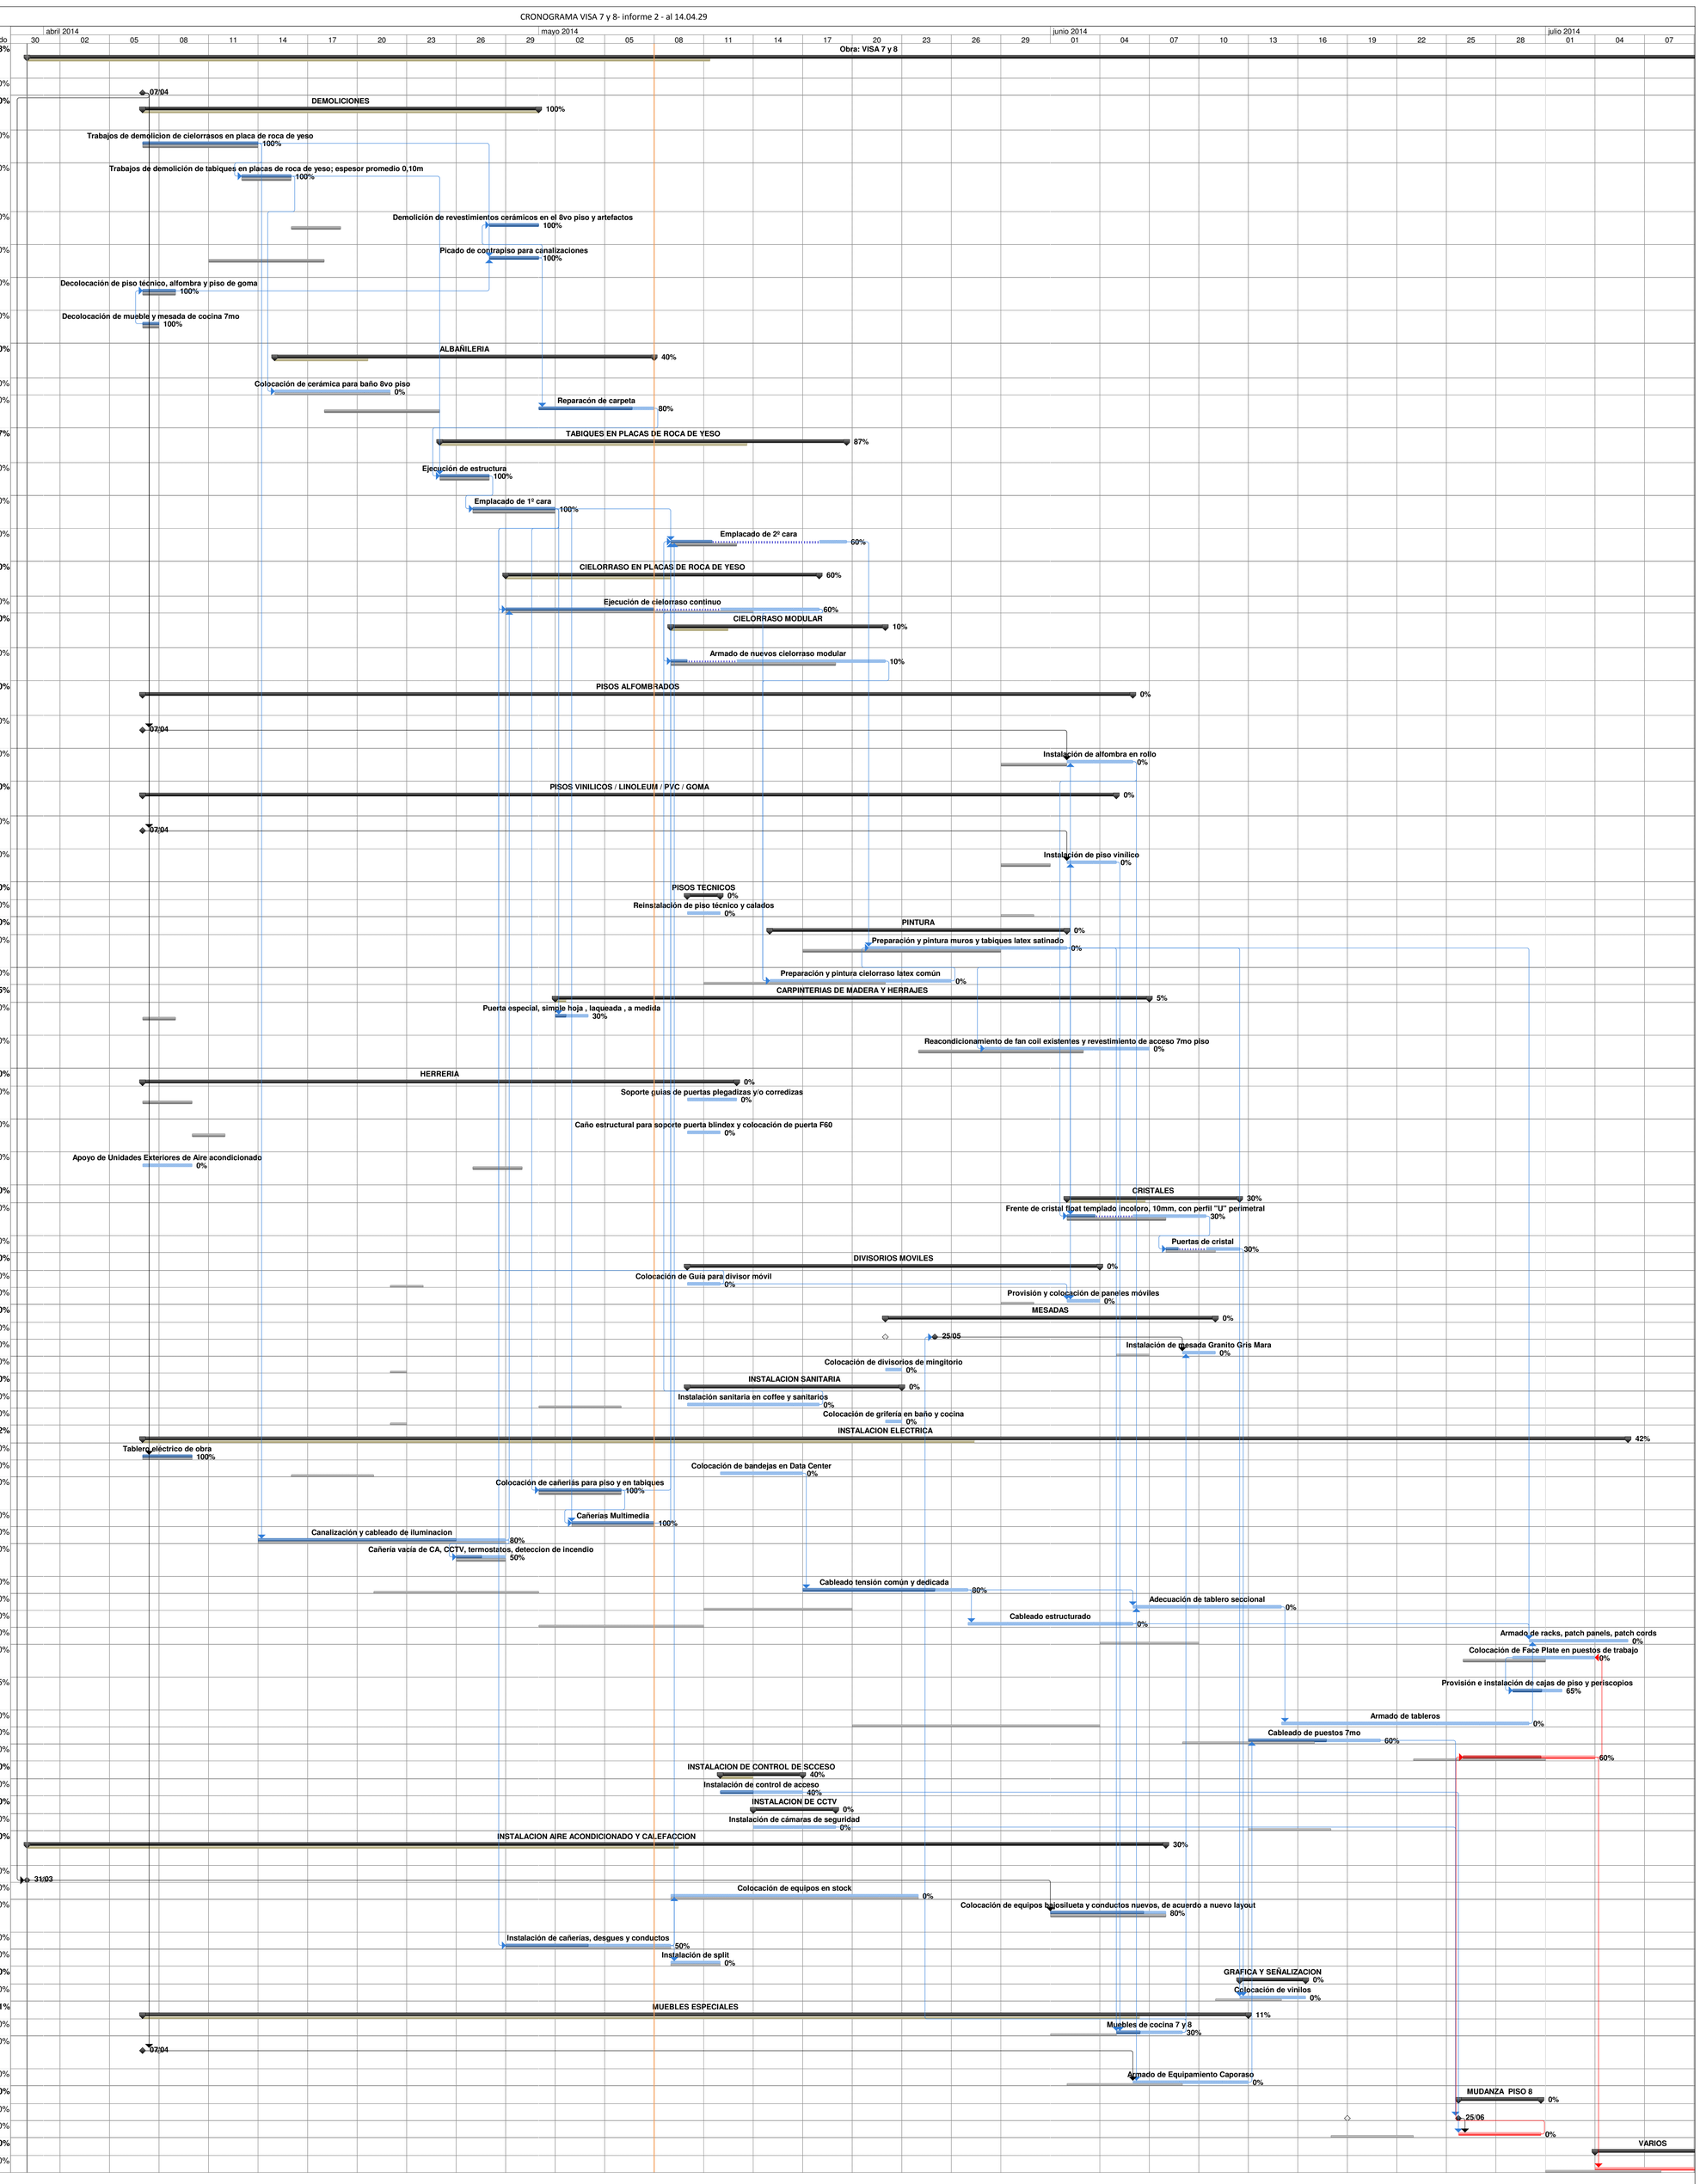

Tareas críticas · División crítica · Progreso de tarea crítica · Tarea · División · Progreso de tarea · Tarea manual · Sólo el comienzo · Sólo fin · Sólo duración · Línea base · División de la línea base · Hito de línea base · Hito · Progreso del resumen · Resumen · Resumen manual · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Fecha límite
