Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
1		**Obra: MERCADO LIBRE - CÓRDOBA**	**92 días**	**lun 24/02/14**	**mié 18/06/14**	**30%**
2		Inicio de obra	0 días	lun 24/02/14	lun 24/02/14	0%
10	✓	**INSTALCIÓN DE EXTINCIÓN**	**3 días**	**sáb 08/03/14**	**mar 11/03/14**	**100%**
11	✓	Instalación de nuevo hidrante + reubicación de hidrante existente	3 días	sáb 08/03/14	mar 11/03/14	100%
32		**TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO**	**48,25 días**	**mié 05/03/14**	**mar 06/05/14**	**82%**
33	✓	Ejecución de estructura	9 días	mié 05/03/14	vie 14/03/14	100%
34		Emplacado de 1ª cara	7 días	mar 11/03/14	sáb 22/03/14	95%
35		Emplacado de 2ª cara	17 días	mar 01/04/14	sáb 03/05/14	75%
36		Sobretabiques	22 días	sáb 22/03/14	mar 06/05/14	75%
7		**INSTALACIÓN SANITARIA**	**30 días**	**jue 03/04/14**	**sáb 10/05/14**	**17%**
9	✓	Tendido de cañerías de AF, AC y D para coffee	2 días	jue 03/04/14	vie 04/04/14	100%
8		Tendido de desagüe de condensado	10 días	lun 28/04/14	sáb 10/05/14	0%
3		**ALBAÑILERÍA**	**64 días**	**sáb 01/03/14**	**jue 22/05/14**	**39%**
4	✓	Realización de contrapiso en coffee, cocina y recepción	1 día	sáb 01/03/14	sáb 01/03/14	100%
5		Realización de carpeta en coffee, cocina y recepción	1 día	sáb 08/03/14	sáb 08/03/14	95%
6		Colcoación de porcellanato en recepción	3 días	mar 20/05/14	jue 22/05/14	0%
64		**HERRERIA**	**49 días**	**mar 25/03/14**	**lun 26/05/14**	**55%**
66	✓	Soportes para puertas y pantallas	6 días	mar 25/03/14	mar 01/04/14	100%
65		Soportes para condensadoras	5 días	mar 20/05/14	lun 26/05/14	0%
70		**PINTURA**	**26,6 días**	**mié 23/04/14**	**lun 26/05/14**	**7%**
71		Preparación y pintura muros y tabiques latex satinado	18 días	mié 23/04/14	lun 26/05/14	10%
72		Preparación y pintura cielorraso latex común	9 días	vie 16/05/14	lun 26/05/14	0%
67		**CORTINAS Y PERSIANAS**	**62 días**	**vie 14/03/14**	**sáb 31/05/14**	**0%**
68		Mediciones	0 días	vie 14/03/14	vie 14/03/14	0%
69		Instalación de cortinas	5 días	mar 27/05/14	sáb 31/05/14	0%
73		**MESADAS**	**2 días**	**vie 30/05/14**	**sáb 31/05/14**	**0%**
74		Provision y colocacion de mesada/ alzada Granito gris mara	2 días	vie 30/05/14	sáb 31/05/14	0%
37		**INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION**	**33 días**	**lun 28/04/14**	**vie 06/06/14**	**0%**
38		Nueva propuesta de proyecto	0 días	lun 28/04/14	lun 28/04/14	0%
39		Cañerías de cobre y conductos sobre cielorraso continuo	14 días	lun 05/05/14	mar 20/05/14	0%
40		Cañerías de cobre y conductos sobre cielorraso modular	20 días	lun 05/05/14	mar 27/05/14	0%
41		Instalación de unidades interiores y exteriores	8 días	lun 26/05/14	mar 03/06/14	0%
42		Puesta en marcha	3 días	mié 04/06/14	vie 06/06/14	0%
59		**PISOS**	**5 días**	**lun 02/06/14**	**vie 06/06/14**	**0%**
63		Nivelacion de piso tecnico	2 días	lun 02/06/14	mié 04/06/14	0%
60		Instalación de alfombra	2 días	mié 04/06/14	jue 05/06/14	0%
62		Instalación de piso vinílico	2 días	mié 04/06/14	jue 05/06/14	0%
61		Instalación de piso porcellanato	3 días	mié 04/06/14	vie 06/06/14	0%
53		**MUEBLES ESPECIALES**	**16 días**	**mar 27/05/14**	**vie 13/06/14**	**0%**
58		Mueble de cocina bajo	3 días	mar 27/05/14	jue 29/05/14	0%
54		Mueble de recepción	2 días	vie 06/06/14	sáb 07/06/14	0%
56		Equipamiento de diseño	3 días	vie 06/06/14	lun 09/06/14	0%
55		Mueble de guardado	4 días	vie 06/06/14	mar 10/06/14	0%
57		Armado de Equipamiento	7 días	vie 06/06/14	vie 13/06/14	0%
43		**CIELORRASOS**	**61 días**	**mar 01/04/14**	**sáb 14/06/14**	**10%**
44		Ejecución de cielorraso continuo	12 días	mar 01/04/14	lun 19/05/14	25%
45		Armado de nuevos cielorraso modular	9 días	sáb 24/05/14	mar 03/06/14	0%
46		Reparación de cielorrasos, pintura - Incluye protecciones	10 días	mié 04/06/14	sáb 14/06/14	0%
47		**FRENTES VIDRIADOS Y PUERTAS INTERIORES**	**74 días**	**lun 17/03/14**	**mar 17/06/14**	**0%**
48	✓	Mediciones de Cristales	0 días	lun 17/03/14	lun 17/03/14	100%
51		Puerta de acceso a piso Server F60	1 día	vie 28/03/14	vie 28/03/14	0%
50		Puerta de acceso a piso F60	2 días	lun 14/04/14	mar 15/04/14	0%
52		Puertas laminadas y laquedas	3 días	mié 21/05/14	vie 23/05/14	0%
49		Frente de cristal float templado incoloro, 10mm, con perfil "U" perimetral + puertas	10 días	vie 06/06/14	mar 17/06/14	0%
12		**INSTALACION ELECTRICA**	**84 días**	**vie 07/03/14**	**mié 18/06/14**	**40%**
13	✓	Electricidad de obra	1 día	vie 07/03/14	vie 07/03/14	100%
14	✓	Colocación de bandejas en piso	9 días	vie 07/03/14	lun 17/03/14	100%
16		Cañerías Multimedia	5 días	mié 19/03/14	mar 25/03/14	95%
30		Instalación de CCTV	3 días	mar 22/04/14	vie 25/04/14	50%
20		Cañerías y cableado de Detección de incendio	6 días	mar 18/03/14	lun 28/04/14	90%
18		Cañerias y cableado de iluminacion	17 días	vie 07/03/14	mar 29/04/14	90%
15		Colocación de cañerías para piso y en tabiques	7 días	mié 12/03/14	sáb 03/05/14	40%
21		Cañerias vacías dentro de cielorraso para CA	5 días	sáb 05/04/14	lun 05/05/14	80%
19		Cañerías y alimentación de equipos de aire acondicionado	6 días	lun 28/04/14	mar 06/05/14	0%
22		Cableado estructurado	9 días	mar 22/04/14	mié 07/05/14	25%
17		Cableado tensión común y dedicada	10 días	mar 22/04/14	jue 08/05/14	25%
23		Adecuación de tablero seccional	9 días	mié 07/05/14	sáb 17/05/14	0%
24		Armado de racks, patch panels, patch cords, UPS	6 días	vie 16/05/14	vie 23/05/14	0%
25		Colocación de cajas Atq, periscopios y face plate	4 días	vie 23/05/14	mié 28/05/14	0%
28		Instalación de artefactos de iluminación	5 días	mié 04/06/14	lun 09/06/14	0%
29		Instalación de detectores de incendio - pruebas y puesta en marcha	8 días	mié 04/06/14	jue 12/06/14	0%
26		Instalación de control de acceso	3 días	lun 16/06/14	mié 18/06/14	0%
27		Cableado de puestos	6 días	jue 12/06/14	mié 18/06/14	0%
31		Pruebas y puesta en marcha	2 días	mar 17/06/14	mié 18/06/14	0%
75		**VARIOS**	**3 días**	**lun 16/06/14**	**mié 18/06/14**	**0%**
76		Detalles terminaciones	3 días	lun 16/06/14	mié 18/06/14	0%
77		**GRAFICA Y SEÑALIZACION**	**17 días**	**vie 30/05/14**	**mié 18/06/14**	**0%**
78		Definición de Mediciones	0 días	vie 30/05/14	vie 30/05/14	0%
79		Colocación de vinilos	3 días	lun 16/06/14	mié 18/06/14	0%

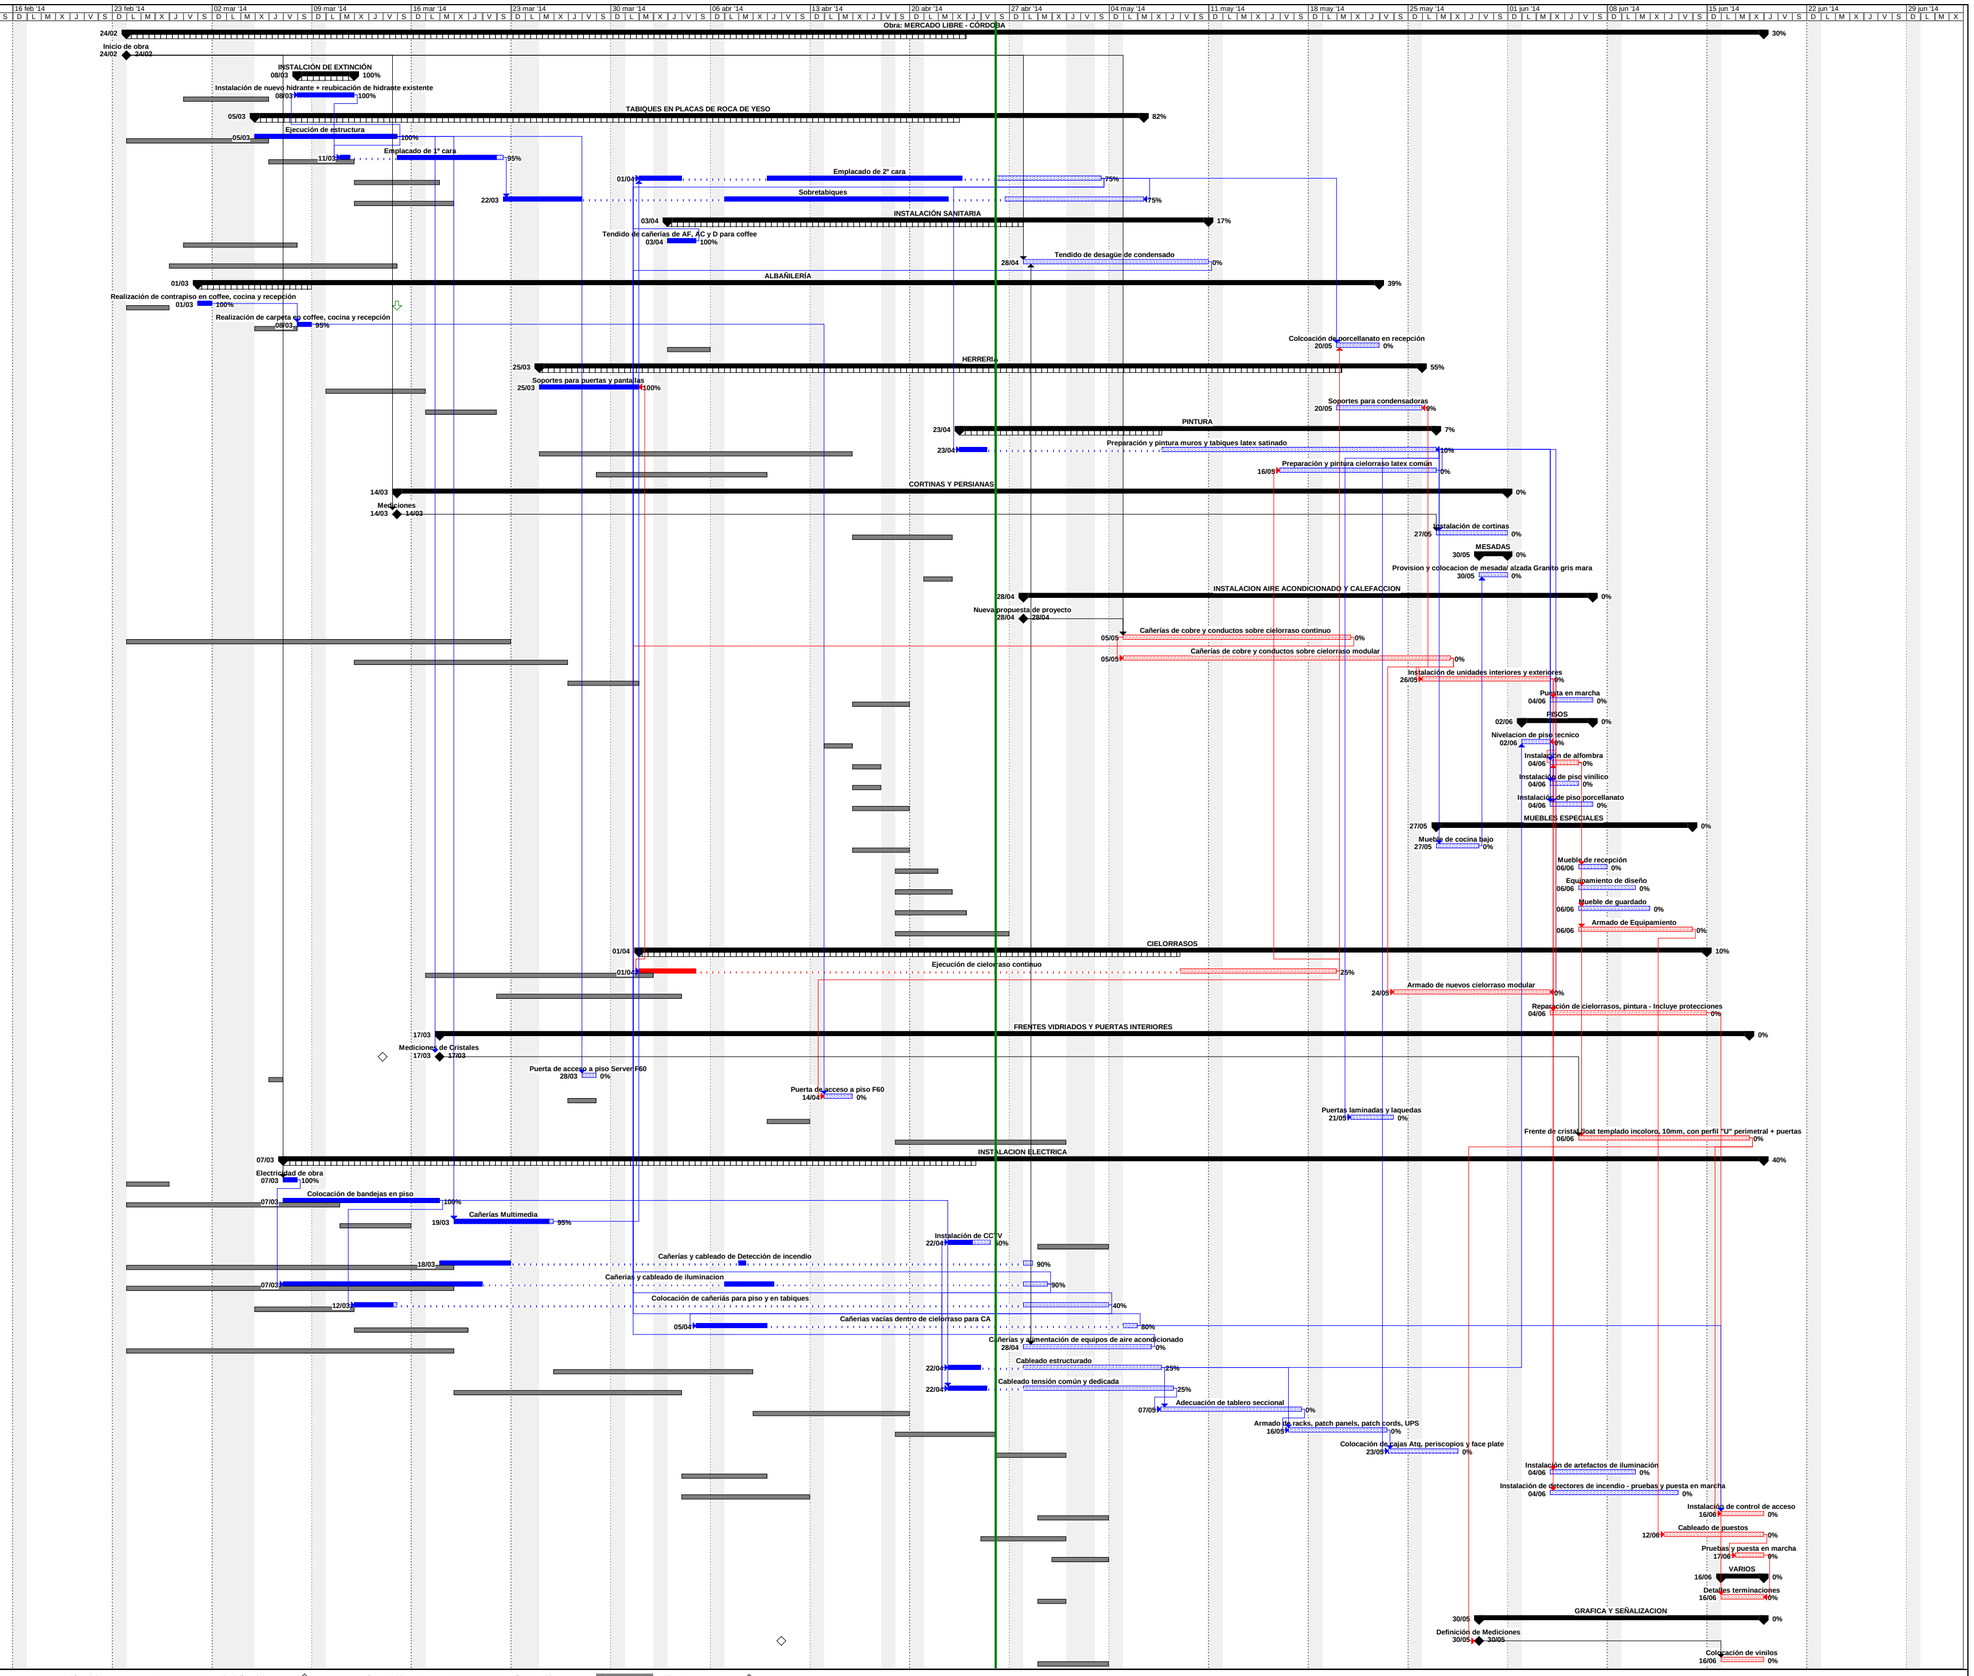

Proyecto: MELI - CRONOGRAMA
Fecha: sáb 26/04/14

Tareas críticas · Progreso de tarea crítica · División · Línea de base · Hito de línea de base · Progreso del resumen · Resumen del proyecto · Hito externo
División crítica · Tarea · Progreso de tarea · División de la línea de base · Hito · Resumen · Tareas externas · Fecha límite
