INFORME 1	REPORTE PRIMERA SEMANA DE OBRA	contract workplaces

Fecha Reporte	15/04/2016
PROYECTO	CHR Hansen
UBICACIÓN	Cecilia Grierson 422 - 4° y 5º Pisos P.Madero. CABA
Contacto Cliente:	Mariano Peisci
Superficie	750 m2

CHR HANSEN

1) DESCRIPCION DEL PROYECTO

Nuevas oficinas de CHR Hansen en Puerto Madero.

2) FOTOS Y DESCRIPCION

Cielorraso en Sala de Reuniones

Coffee 5º piso - contrapiso + pintura asfaltica

Equipos interiores: Data Center

Contrapiso en Sala de Reuniones

Pasillo entre Data Center y Sala de Reunones / P.F60

Equipos exteriores: Data Center

3) TEMAS CRITICOS

Item	Detalle	
1	Horarios de trabajo muy limitados: de lun a vie de 8hs a 16.45hs. Los sábados no podemos trabajar.	
2	Pendiente a rejillas en azotas mal ejecutado, cuando llueve queda agua estancada donde tenemos previsto colocar un deck de madera (ya se presentó un informe respecto de este y otros temas más en detalle)	
3	Tema Medidor definitivo: Sin el mismo va a ser imposible mudarse y tener la totalidad de la oficina en pleno funcionamiento.	

4) HITOS Y DEADLINES (Data Center)

Status	Rubros			Comentarios	Responsable
1	Durlock			Sólo falta emplacar la pared donde están los AA.	Contract
2	Instalación Eléctrica			Canalizaciones listas en Data Center y Laboratorio.	Contract
3	Aire Acondicionado			Ya están instalados los 2 equipos. Falta testearlos (conectar)	Contract
4	Piso Técnico			Programado para el Mar. 19/4	Contract
5	Pintura			Para el Vie. 22/4 va a estar listo el enduido y 1 mano de pintura	Contract

5) AVANCE

SEMANA	PREVISTO	REAL
0	0%	0%
1	5%	8%
2	17%	
3	32%	
4	39%	
5	45%	
6	52%	
7	67%	
8	75%	
9	82%	
10	88%	
11	92%	
12	93%	
13	95%	
14	99,7%	
15	100%	

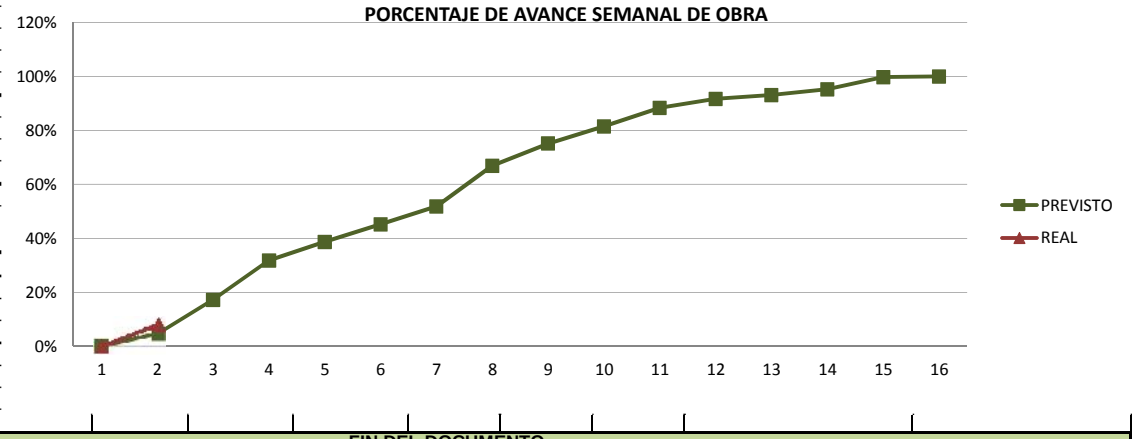

FIN DEL DOCUMENTO
