Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**OBRA: GROUPE SEB:**	**47 días**	**lun 13/04/09**	**dom 31/05/09**
2	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**8 días**	**lun 13/04/09**	**mar 21/04/09**
3	Realización de cerco de obra y colocación de puerta en 3º piso.	1 día	lun 13/04/09	lun 13/04/09
4	Realización de cerco de obra y colocación de puerta en 11º piso.	1 día	mar 21/04/09	mar 21/04/09
5	Replanteo 3º piso.	1 día	lun 13/04/09	lun 13/04/09
6	Replanteo 11º piso.	1 día	mar 21/04/09	mar 21/04/09
7	**TABIQUES**	**23.1 días**	**lun 13/04/09**	**vie 08/05/09**
8	**3º Piso**	1 día	lun 13/04/09	lun 13/04/09
9	Tabiqueria Durlock estructura.	2 días	lun 13/04/09	mar 14/04/09
10	Tabiqueria Durlock una cara.	2 días	mié 15/04/09	jue 16/04/09
11	Colocación de aislación, lana de vidrio.	1 día	jue 16/04/09	vie 17/04/09
12	Refuerzos verticales en muros para puertas.	1 día	mié 15/04/09	mié 15/04/09
13	Refuerzos horizontales en cielorraso para tabiques de vidrio.	2 días	mié 06/05/09	vie 08/05/09
14	Tabiqueria Durlock 2º cara.	1 día	mié 22/04/09	jue 23/04/09
15	Colocación de esquineros.	1 día	jue 23/04/09	vie 24/04/09
16	Recuadre de columnas.	2 días	mié 22/04/09	vie 24/04/09
17	Encintado y masillado de tabiques y columnas de Durlock.	2 días	vie 24/04/09	lun 27/04/09
18	Colocación de puerta en Server.	1 día	dom 03/05/09	lun 04/05/09
19	**11º Piso**	1 día	lun 13/04/09	lun 13/04/09
20	Tabiqueria Durlock estructura.	1 día	lun 13/04/09	lun 13/04/09
21	Tabiqueria Durlock una cara.	1 día	jue 23/04/09	jue 23/04/09
22	Colocación de aislación, lana de vidrio.	1 día	vie 24/04/09	vie 24/04/09
23	Refuerzos horizontales en cielorraso para tabiques de vidrio.	1 día	lun 27/04/09	lun 27/04/09
24	Tabiqueria Durlock 2º cara.	1 día	sáb 25/04/09	sáb 25/04/09
25	Colocación de esquineros.	1 día	lun 27/04/09	lun 27/04/09
26	Recuadre de columnas.	1 día	mar 14/04/09	mar 14/04/09
27	Encintado y masillado de tabiques de Durlock.	1 día	mié 29/04/09	mié 29/04/09
28	**INSTALACIONES**	**40 días**	**lun 13/04/09**	**dom 24/05/09**
29	**INSTALACION ELECTRICA**	**40 días**	**lun 13/04/09**	**dom 24/05/09**
30	**3º Piso**	1 día	lun 13/04/09	lun 13/04/09
31	Picado en carpeta para canalizar.	2 días	vie 17/04/09	sáb 18/04/09
32	Canalización sobre cielorraso.	4 días	mié 22/04/09	sáb 25/04/09
33	Circuitos sobre cielorraso.	2 días	lun 27/04/09	mar 28/04/09
34	Canalización en tabiques.	2 días	lun 13/04/09	mar 14/04/09
35	Cableado en tabiques.	3 días	lun 27/04/09	mié 29/04/09
36	Circuitos en canalizacions bajo piso.	3 días	jue 30/04/09	sáb 02/05/09
37	Colocación de artefactos.	2 días	lun 13/04/09	mar 14/04/09
38	Tablero Server.	3 días	dom 10/05/09	mar 12/05/09
39	Instalación de medidor.	1 día	mié 13/05/09	mié 13/05/09
40	Trabajos en racks.	4 días	sáb 16/05/09	mar 19/05/09
41	Rotulación y certificación.	2 días	sáb 23/05/09	dom 24/05/09
42	**11º Piso**	1 día	lun 13/04/09	lun 13/04/09
43	Picado en carpeta para canalizar.	1 día	vie 01/05/09	vie 01/05/09
44	Canalización sobre cielorraso.	1 día	sáb 02/05/09	sáb 02/05/09
45	Circuitos sobre cielorraso.	1 día	dom 03/05/09	dom 03/05/09
46	Canalización en tabiques.	1 día	lun 04/05/09	lun 04/05/09
47	Cableado en tabiques.	1 día	mar 05/05/09	mar 05/05/09
48	Circuitos en canalizacions bajo piso.	1 día	mié 06/05/09	mié 06/05/09
49	Colocación de artefactos.	2 días	jue 07/05/09	vie 08/05/09
50	Rotulación y certificación.	1 día	sáb 09/05/09	sáb 09/05/09
51	**INSTALACION CONTRA INCENDIO**	**1 día**	**mié 13/05/09**	**mié 13/05/09**
52	Cañerias vacias 3º piso.	1 día	mié 13/05/09	mié 13/05/09
53	Cañerias vacias 11º piso.	1 día	mié 13/05/09	mié 13/05/09
54	**CIELORRASO**	**2 días**	**mié 13/05/09**	**jue 14/05/09**
55	Huecos para artefactos de embutir.	2 días	mié 13/05/09	jue 14/05/09
56	**PAVIMENTOS**	**13 días**	**sáb 02/05/09**	**jue 14/05/09**
57	Entrada de alfombra.	1 día	mié 06/05/09	mié 06/05/09
58	Instalación de alfombra.	2 días	jue 07/05/09	vie 08/05/09
59	Colocación de masa niveladora para piso vinilico.	1 día	vie 08/05/09	vie 08/05/09
60	Colocación de piso vinilico.	1 día	sáb 09/05/09	sáb 09/05/09
61	Colocación de porcellanato en recepción.	1 día	jue 14/05/09	jue 14/05/09
62	Colocación de zócalos.	2 días	sáb 09/05/09	dom 10/05/09
63	Colocación de varilla de bronce platil.	1 día	lun 11/05/09	lun 11/05/09
64	Entrada de piso deck.	1 día	lun 11/05/09	lun 11/05/09
65	Realización de carpeta a cal sobre membrana.	1 día	sáb 02/05/09	sáb 02/05/09
66	Colocación de piso deck en terraza.	2 días	mar 12/05/09	mié 13/05/09
67	**PINTURA**	**8 días**	**jue 30/04/09**	**jue 07/05/09**
68	Pintura tabiques una mano.	3 días	jue 30/04/09	sáb 02/05/09
69	Pintura tabiques segunda mano.	3 días	dom 03/05/09	mar 05/05/09
70	Zócalos.	1 día	dom 03/05/09	dom 03/05/09
71	Puertas y marcos.	2 días	mié 06/05/09	jue 07/05/09
72	**CARPINTERIAS**	**7 días**	**dom 10/05/09**	**sáb 16/05/09**
73	Frentes en accesos.	2 días	mié 13/05/09	jue 14/05/09
74	Puertas hojas de cristal templado.	2 días	lun 11/05/09	mar 12/05/09
75	Colocación de cajas de piso.	1 día	dom 10/05/09	dom 10/05/09
76	Colocación de frentes de oficina.	2 días	vie 15/05/09	sáb 16/05/09
77	**AA**	**5 días**	**lun 11/05/09**	**vie 15/05/09**
78	Colocación de rejillas de retorno en 3º y 11º pisos.	2 días	lun 11/05/09	mar 12/05/09
79	Retiro de equipo Split existente para Server.	1 día	mié 13/05/09	mié 13/05/09
80	Montaje de Split en Server.	1 día	jue 14/05/09	jue 14/05/09
81	Puesta en marcha.	1 día	vie 15/05/09	vie 15/05/09
82	**CONTROLES DE ACCESO**	**2 días**	**jue 28/05/09**	**vie 29/05/09**
83	Canalización.	2 días	jue 28/05/09	vie 29/05/09
84	**MOBILIARIO**	**7 días**	**mar 12/05/09**	**mar 19/05/09**
85	Entrega de mobiliario de línea.	0 días	mar 12/05/09	mar 12/05/09
86	Armado de muebles.	4 días	mié 13/05/09	sáb 16/05/09
87	Armado de muebles especiales.	2 días	dom 17/05/09	lun 18/05/09
88	Ingreso de sillas.	1 día	mar 19/05/09	mar 19/05/09
89	**CORTINAS**	**3 días**	**mié 13/05/09**	**vie 15/05/09**
90	Instalación de cortinas.	3 días	mié 13/05/09	vie 15/05/09
91	**GRAFICA**	**4 días**	**dom 17/05/09**	**mié 20/05/09**
92	Colocación de logos.	1 día	mié 20/05/09	mié 20/05/09
93	Vinilo esmerilado.	3 días	dom 17/05/09	mar 19/05/09
94	**LIMPIEZA**	**2 días**	**vie 29/05/09**	**sáb 30/05/09**
95	Limpieza final de obra.	2 días	vie 29/05/09	sáb 30/05/09
96	**MUDANZA**	**1 día**	**dom 31/05/09**	**dom 31/05/09**
97	Mudanza a cargo del comitente.	1 día	dom 31/05/09	dom 31/05/09

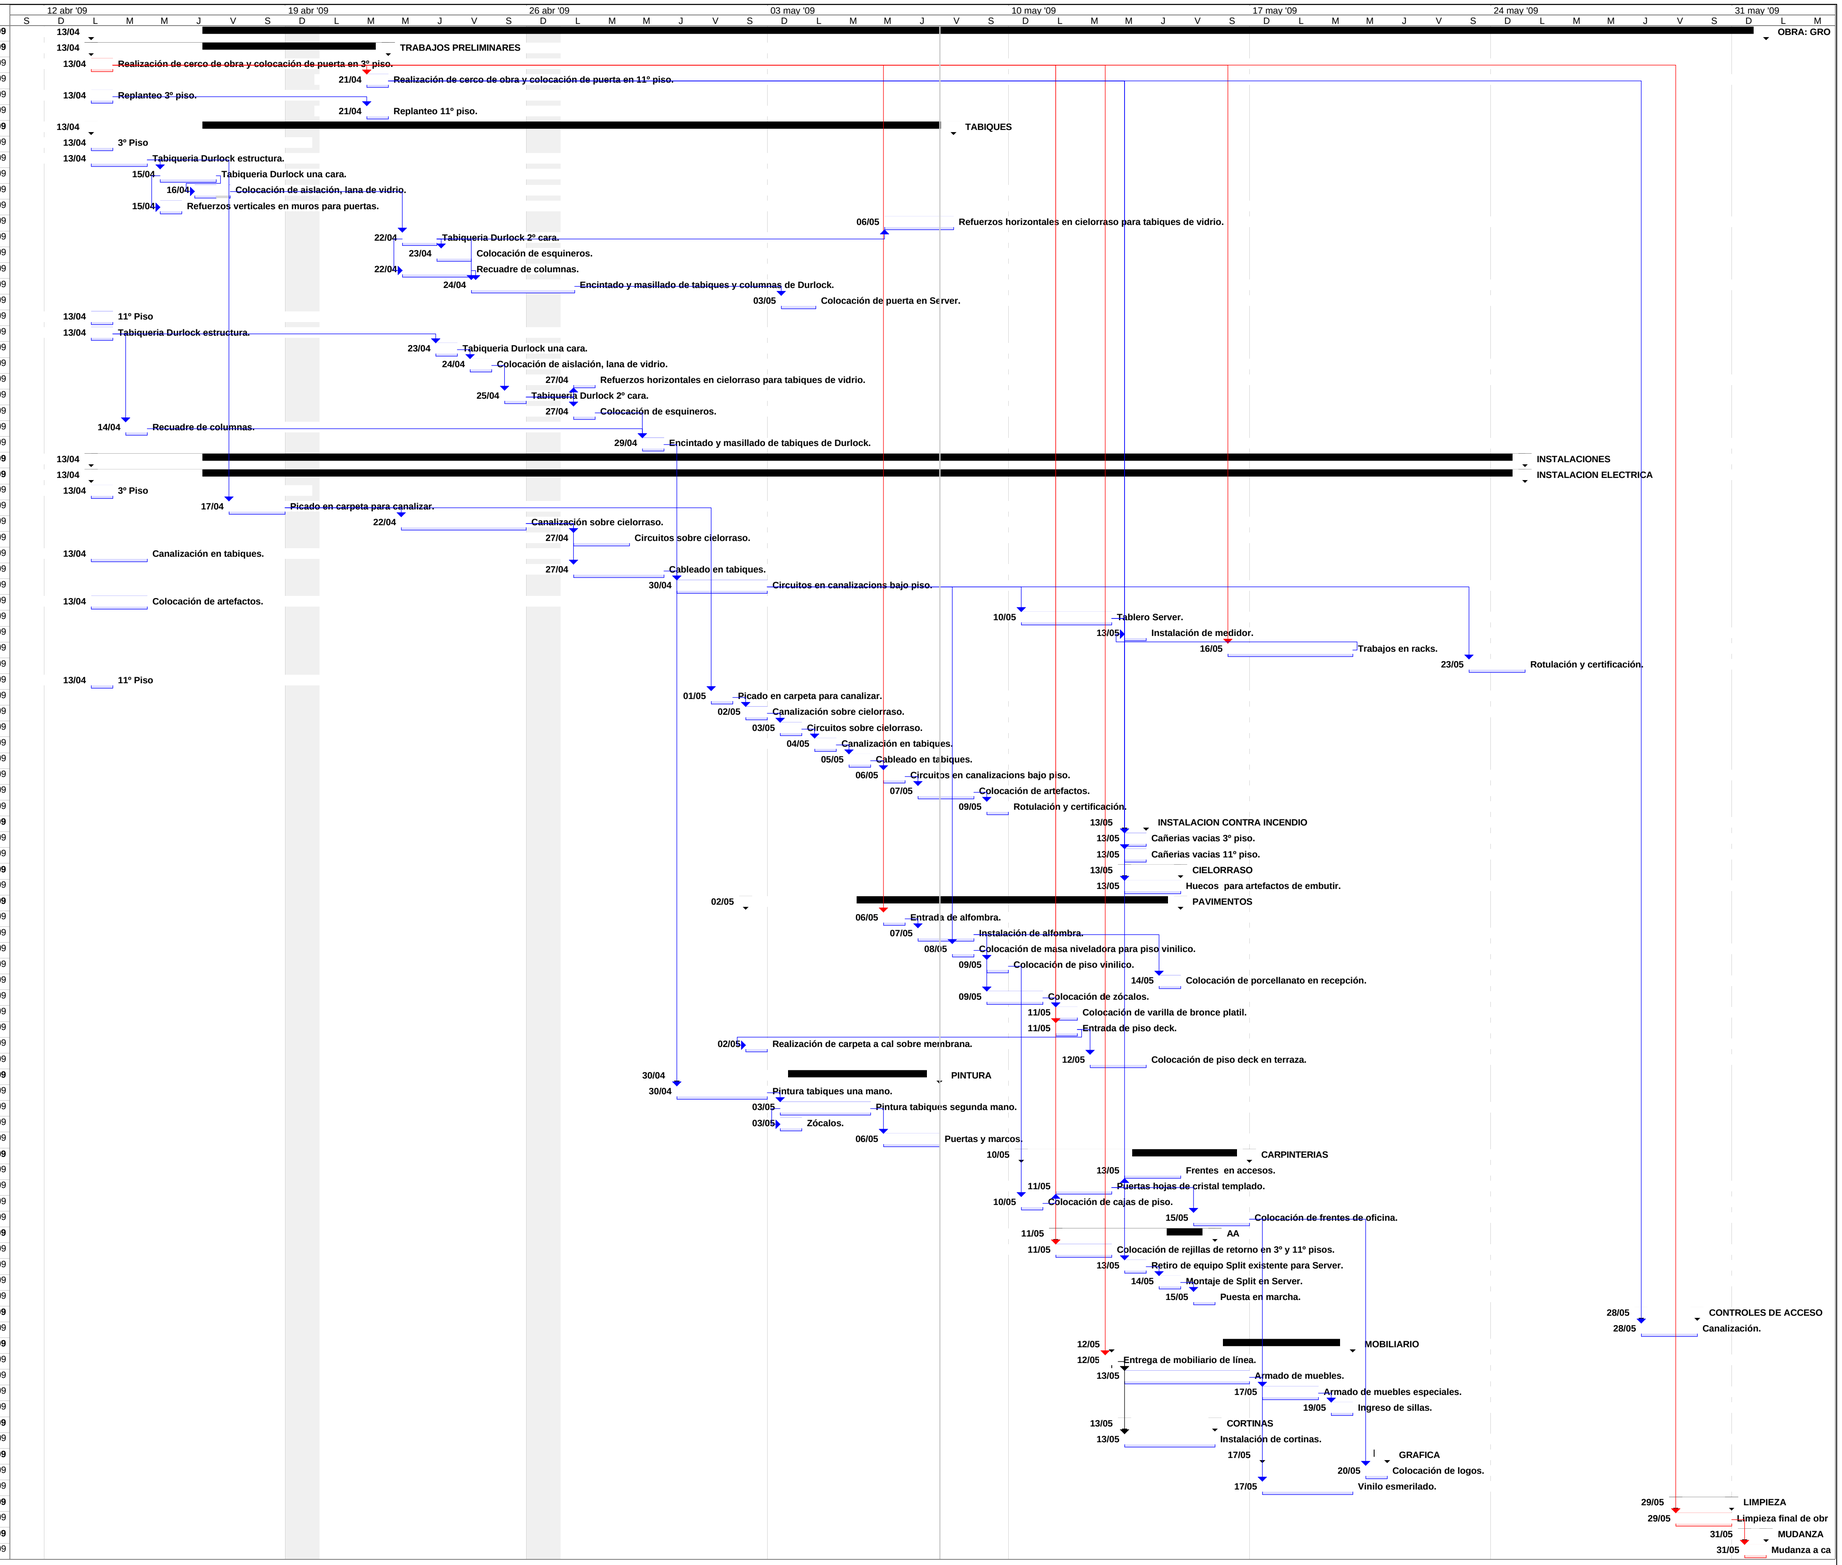

Proyecto: GROUPE SEB
Fecha: 08.04.2009

Tarea | Tarea crítica | Progreso | Hito | Resumen | Tarea resumida | Tarea crítica resumida | Hito resumido | Progreso resumido | División | Tareas externas | Resumen del proyecto | Agrupar por síntesis | Fecha límite
