Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**ST**	**32 días**	**jue 05-11-09**	**vie 18-12-09**
2		**TRABAJOS PRELIMINARES**	**0,5 días**	**jue 05-11-09**	**jue 05-11-09**
3		Trazado tabiques y replanteos generales	0,5 días	jue 05-11-09	jue 05-11-09
4		**TABIQUES VOLCOMETAL**	**15 días**	**jue 05-11-09**	**jue 26-11-09**
5		Montaje de estructura tabiques y vigas	4 días	jue 05-11-09	mié 11-11-09
6		Montaje de estructura Cielo duro	2 días	mié 11-11-09	vie 13-11-09
7		Emplacado 1ª cara en tabiques	3 días	mar 10-11-09	vie 13-11-09
8		Emplacado 2ª cara en tabiques	4 días	jue 12-11-09	mié 18-11-09
9		Emplacado de cielo duro	2 días	vie 13-11-09	mar 17-11-09
10		Emplacado de Vigas	2 días	mar 17-11-09	jue 19-11-09
11		Terminación Yeso y pasta en tabiques y vigas	5 días	jue 19-11-09	jue 26-11-09
12		**CIELORRASO**	**5 días**	**mié 25-11-09**	**mié 02-12-09**
13		Instalación de Falso cielo	5 días	mié 25-11-09	mié 02-12-09
14		**PAVIMENTOS**	**7,5 días**	**mié 18-11-09**	**vie 27-11-09**
15		Instalación de porcelanato	6 días	mié 18-11-09	jue 26-11-09
16		Instalación de cubre juntas	0,5 días	vie 27-11-09	vie 27-11-09
17		**GUARDAPOLVOS**	**2 días**	**lun 30-11-09**	**mié 02-12-09**
18		Instalación de guardapolvo	2 días	lun 30-11-09	mié 02-12-09
19		**CARPINTERÍA**	**3 días**	**mié 25-11-09**	**lun 30-11-09**
20		Instalación de puertas con quincallería	2 días	mié 25-11-09	vie 27-11-09
21		Colocación de topes de puerta	1 día	vie 27-11-09	lun 30-11-09
22		**PINTURA**	**9 días**	**jue 26-11-09**	**mié 09-12-09**
23		Preparación de sup. en tabiques nuevos	3 días	jue 26-11-09	mar 01-12-09
24		Látex satinado en tabiques nuevos y muros exi	6 días	mar 01-12-09	mié 09-12-09
25		Pintura en puerta.	2 días	mar 01-12-09	jue 03-12-09
26		**CRISTALES**	**2 días**	**mar 01-12-09**	**mié 02-12-09**
27		Colocación marcos perimetrales en frente de de	1 día	mar 01-12-09	mié 02-12-09
28		Colocación cristal laminado en frente de despa	1 día	mar 01-12-09	mié 02-12-09
29		Instalación de film con diseño	2 días	mar 01-12-09	mié 02-12-09
30		**CORTINAS**	**2 días**	**mar 01-12-09**	**mié 02-12-09**
31		Instalación de cortina Roller perimetrales y blac	2 días	mar 01-12-09	mié 02-12-09
32		**DETECCIÓN DE INCENDIO**	**1 día**	**mié 02-12-09**	**jue 03-12-09**
33		Traslado de detector existente	1 día	mié 02-12-09	jue 03-12-09
34		**CLIMA**	**20 días**	**lun 09-11-09**	**lun 07-12-09**
35		Cañeria matriz de agua	5 días	lun 09-11-09	lun 16-11-09
36		Anclaje e instalación de fan coil	2 días	vie 13-11-09	mar 17-11-09
37		Prueba Hidráulica	2 días	mar 17-11-09	jue 19-11-09
38		Aislación de cañeria	2 días	mié 18-11-09	vie 20-11-09
39		Colocación de desagues de Pvc	4 días	jue 19-11-09	mié 25-11-09
40		Colocación Ductos Inyección y retorno	5 días	mar 24-11-09	mar 01-12-09
41		Colocación de mangas y difusores	3 días	mar 01-12-09	vie 04-12-09
42		Instalación de termostatos	1 día	vie 04-12-09	lun 07-12-09
43		**ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO**	**31,5 días**	**jue 05-11-09**	**vie 18-12-09**
44		Distribución cañeria de iluminación	4 días	jue 05-11-09	mié 11-11-09
45		Cañeria de interruptores en tabiques	4 días	vie 13-11-09	jue 19-11-09
46		Cableado circuitos de iluminación	3 días	mié 11-11-09	lun 16-11-09
47		Cañeria de termostatos en tabiques	4 días	mié 18-11-09	mar 24-11-09
48		Cañeria y picados para cableado estructurado	4 días	lun 16-11-09	vie 20-11-09
49		Colocación bandeja legrand	3 días	lun 07-12-09	jue 10-12-09
50		Tendido Multipar	6 días	mar 08-12-09	mié 16-12-09
51		Colocación Fase Plate / RJ 45 y enchufes	3,5 días	mar 15-12-09	vie 18-12-09
52		Rotulación	0,5 días	vie 18-12-09	vie 18-12-09
53		Puesta en marcha equipos de clima	0,5 días	mar 08-12-09	mar 08-12-09
54		Colocación artefactos de iluminación	3 días	jue 03-12-09	mar 08-12-09
55		**MUEBLES DE LINEA**	**3 días**	**mar 08-12-09**	**jue 10-12-09**
56		Entrega y colocación de mobiliario	3 días	mar 08-12-09	jue 10-12-09
57		**MUEBLES ESPECIALES**	**3 días**	**mié 02-12-09**	**vie 04-12-09**
58		Entrega y colocación de mobiliario	3 días	mié 02-12-09	vie 04-12-09
59		**LIMPIEZA DE OBRA**	**31 días**	**jue 05-11-09**	**vie 18-12-09**
60		Limpieza de Obra diaria.	30 días	jue 05-11-09	jue 17-12-09
61		Limpieza de Obra final.	1 día	jue 17-12-09	vie 18-12-09

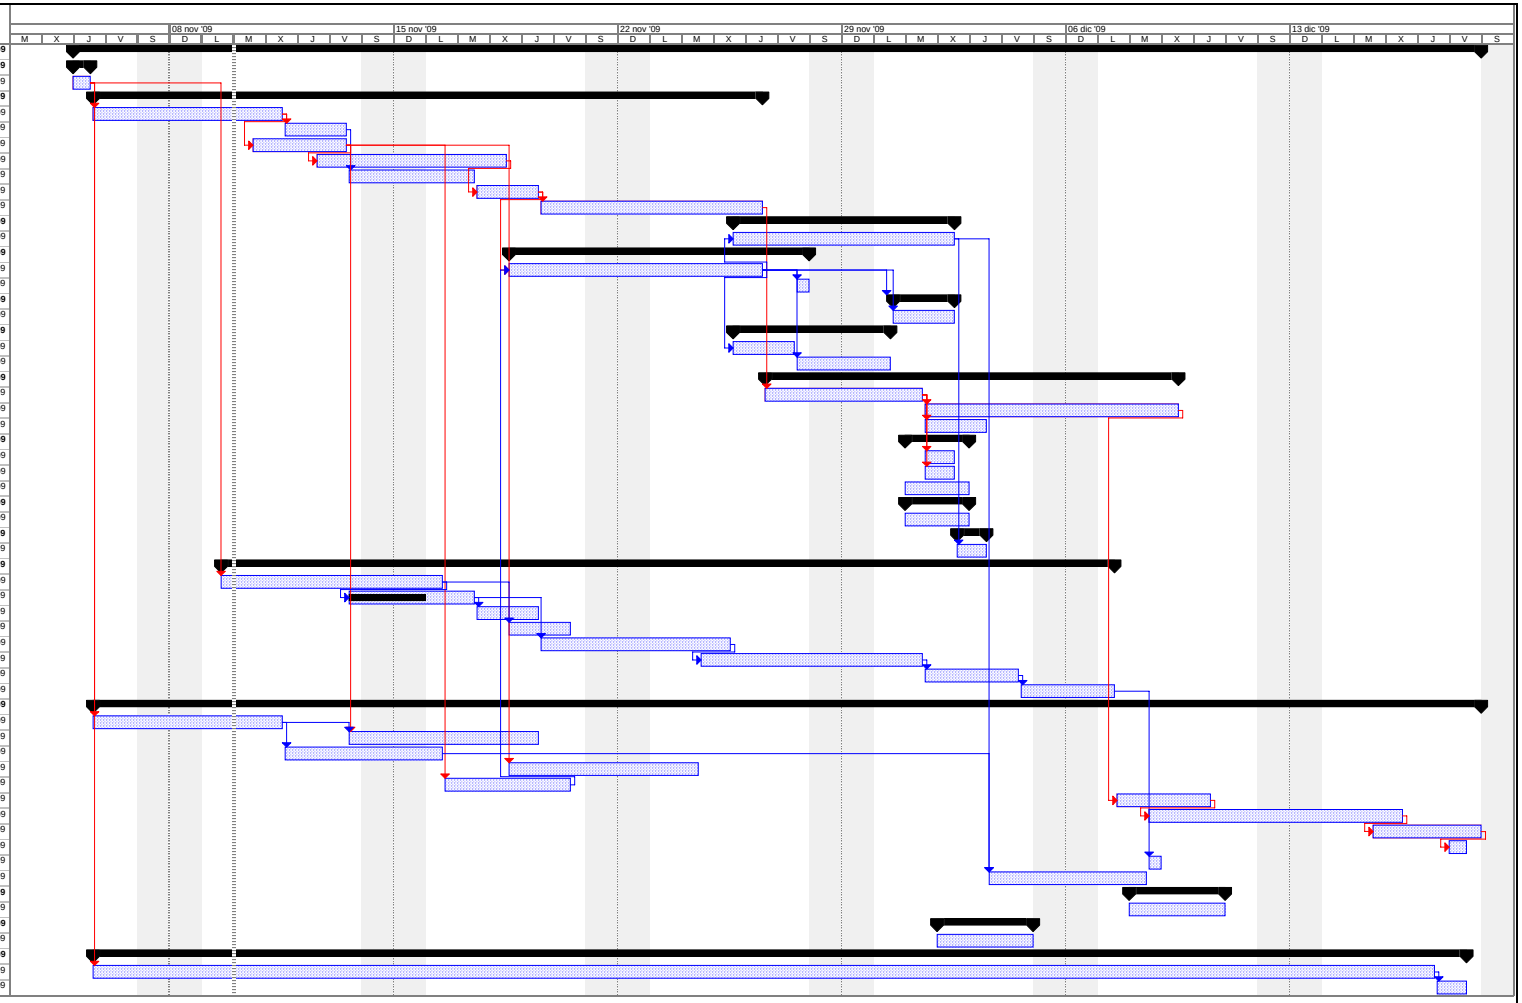

Proyecto: CARTA GANTT CLIENT
Fecha: mar 10-11-09

tarea critica | División | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo
Tarea | Progreso | Resumen | Tareas externas | Fecha límite
