Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**OBRA ADM**	**40 días**	**vie 16/01/15**	**mar 24/02/15**
2	**Preliminares**	**1 día**	**vie 16/01/15**	**vie 16/01/15**
3	Protecciones	1 día	vie 16/01/15	vie 16/01/15
4	**Eléctrica**	**22 días**	**mié 21/01/15**	**jue 19/02/15**
5	Canalizaciones bajo piso técnico	3 días	mié 21/01/15	vie 23/01/15
6	Canalizaciones en tabiques	2 días	mar 27/01/15	mié 28/01/15
7	Cableados	3 días	jue 29/01/15	lun 02/02/15
8	Cableado por puestos de trabajo	1 día	jue 19/02/15	jue 19/02/15
9	Inst de plaquetas	1 día	lun 16/02/15	lun 16/02/15
10	Trabajos en tableros	4 días	mar 03/02/15	vie 06/02/15
11	Inst. de luminarias en cielorraso	2 días	jue 12/02/15	vie 13/02/15
12	**Cableado Estructurado**	**16 días**	**mar 03/02/15**	**mar 24/02/15**
13	Cableado	4 días	mar 03/02/15	vie 06/02/15
14	Armado de puestos de trabajo	2 días	lun 09/02/15	mar 10/02/15
15	Suministro de Rack	1 día	lun 09/02/15	mar 10/02/15
16	Trabajos en el rack	3 días	jue 12/02/15	lun 16/02/15
17	Armado del puesto / terminaciones	2 días	vie 20/02/15	lun 23/02/15
18	Certificación y rotulación	1 día	mar 24/02/15	mar 24/02/15
19	**Piso Técnico**	**2 días**	**mié 21/01/15**	**jue 22/01/15**
20	Ajuste de piso técnico	2 días	mié 21/01/15	jue 22/01/15
21	**Tabiques**	**11 días**	**lun 19/01/15**	**lun 02/02/15**
22	Demolición Tabique entre privados	2 días	lun 19/01/15	mar 20/01/15
23	Retiro de puerta	1 día	lun 19/01/15	lun 19/01/15
24	Replanteo de estructura	1 día	mié 21/01/15	mié 21/01/15
25	Una Estructura + 1 Cara	3 días	jue 22/01/15	lun 26/01/15
26	Tapado vano puerta	1 día	jue 22/01/15	jue 22/01/15
27	Refuerzos	1 día	lun 26/01/15	lun 26/01/15
28	Aislación - Lana	1 día	jue 29/01/15	jue 29/01/15
29	Segunda cara	2 días	mié 28/01/15	jue 29/01/15
30	Encintado y Masillado	2 días	vie 30/01/15	lun 02/02/15
31	**Carpintería**	**12 días**	**lun 26/01/15**	**mar 10/02/15**
32	Inst. de puerta	1 día	vie 06/02/15	vie 06/02/15
33	Inst. de contramarcos	1 día	mar 10/02/15	mar 10/02/15
34	Modificación puerta de acceso	2 días	jue 29/01/15	vie 30/01/15
35	Marco metalico para puerta ppal.	1 día	lun 26/01/15	lun 26/01/15
36	**Pisos y zócalos**	**24 días**	**lun 19/01/15**	**jue 19/02/15**
37	Inst de zócalos	3 días	mar 10/02/15	jue 12/02/15
38	Piso vinílico en coffee	2 días	mié 18/02/15	jue 19/02/15
39	**Alfombra**	**22 días**	**lun 19/01/15**	**mar 17/02/15**
40	Retiro de alfombra existente	2 días	lun 19/01/15	mar 20/01/15
41	Inst. de alfombra	2 días	lun 16/02/15	mar 17/02/15
42	**Mesadas**	**1 día**	**jue 12/02/15**	**jue 12/02/15**
43	Inst de mesada en coffee	1 día	jue 12/02/15	jue 12/02/15
44	**Cristales**	**21 días**	**lun 19/01/15**	**lun 16/02/15**
45	Retiro de Mampara exsitentes	2 días	lun 19/01/15	mar 20/01/15
46	Inst. de perfiles de aluminio y frenos puertas	2 días	vie 06/02/15	lun 09/02/15
47	Istalación de cristales y puertas	5 días	mar 10/02/15	lun 16/02/15
48	**Pintura**	**9 días**	**mar 03/02/15**	**vie 13/02/15**
49	Preparación de superficies (enduido y lijado)	3 días	mar 03/02/15	jue 05/02/15
50	En tabiques	2 días	vie 06/02/15	lun 09/02/15
51	En cielorrasos	2 días	mar 10/02/15	mié 11/02/15
52	segunda mano	2 días	jue 12/02/15	vie 13/02/15
53	pintura especial	2 días	jue 12/02/15	vie 13/02/15
54	**Inst Sanitaria**	**22 días**	**jue 22/01/15**	**vie 20/02/15**
55	Buscar conexión desague	1 día	jue 22/01/15	jue 22/01/15
56	Replanteo	1 día	vie 23/01/15	vie 23/01/15
57	Inst de desagües	1 día	lun 26/01/15	lun 26/01/15
58	Inst de abastecimiento de agua	1 día	lun 26/01/15	lun 26/01/15
59	Pruebas hidraulicas	1 día	mié 28/01/15	mié 28/01/15
60	Inst. de artefactos y griferias	1 día	vie 20/02/15	vie 20/02/15
61	**Aire Acondicionado**	**9 días**	**mié 21/01/15**	**lun 02/02/15**
62	Reubicar equipos	1 día	mié 21/01/15	mié 21/01/15
63	Cambio de conexiones a equipos	4 días	jue 22/01/15	mar 27/01/15
64	Inst de extracción de aire en sshh y coffe y colocación de rejas.	2 días	mié 28/01/15	jue 29/01/15
65	Puesta en marcha	2 días	vie 30/01/15	lun 02/02/15
66	**Sensores**	**16 días**	**mié 21/01/15**	**mié 11/02/15**
67	Canalizaciones	2 días	mié 21/01/15	jue 22/01/15
68	Cableado	2 días	vie 23/01/15	lun 26/01/15
69	Inst. bajo piso	2 días	mar 27/01/15	mié 28/01/15
70	Inst s/ cielo	2 días	jue 29/01/15	vie 30/01/15
71	Inst ambiente	1 día	mar 10/02/15	mar 10/02/15
72	Programación y puesta en marcha	1 día	mié 11/02/15	mié 11/02/15
73	**Inst. Contra Incendios**	**15 días**	**mar 27/01/15**	**lun 16/02/15**
74	Modificación de cañería sobre cielo.	2 días	mar 27/01/15	mié 28/01/15
75	Inst de rociadores	1 día	jue 29/01/15	jue 29/01/15
76	Pruebas	1 día	vie 30/01/15	vie 30/01/15
77	Inst de embellecedores	1 día	lun 16/02/15	lun 16/02/15
78	Inst. de extintores	1 día	lun 16/02/15	lun 16/02/15
79	**Derrames de agua**	**7 días**	**lun 19/01/15**	**mar 27/01/15**
80	Cableado e instalación	2 días	lun 19/01/15	mar 20/01/15
81	Puesta en marcha	1 día	mar 27/01/15	mar 27/01/15
82	**Cielorrasos**	**10 días**	**lun 19/01/15**	**vie 30/01/15**
83	**Cielorraso de yeso**	**10 días**	**lun 19/01/15**	**vie 30/01/15**
84	Cableados para qu trabajen los subcontratos	1 día	lun 19/01/15	lun 19/01/15
85	Reparaciones	2 días	mar 27/01/15	mié 28/01/15
86	Encintado y Masillado	2 días	jue 29/01/15	vie 30/01/15
87	**Muebles especiales**	**5 días**	**mar 10/02/15**	**lun 16/02/15**
88	Instalación de mueble cocina	2 días	mar 10/02/15	mié 11/02/15
89	Instalación de Copy Area, despojador, puesto flotante	2 días	jue 12/02/15	vie 13/02/15
90	Ajustes de puerta	1 día	lun 16/02/15	lun 16/02/15
91	**Muebles de línea**	**2 días**	**mié 18/02/15**	**jue 19/02/15**
92	Inst de mobiliario de línea	2 días	mié 18/02/15	jue 19/02/15
93	**Cortinas y otros**	**2 días**	**lun 16/02/15**	**mar 17/02/15**
94	Inst de Cortina	2 días	lun 16/02/15	mar 17/02/15
95	Inst de vinilos señalética	1 día	mar 17/02/15	mar 17/02/15
96	**Limpieza final**	**2 días**	**mié 25/02/15**	**jue 26/02/15**
97	**Entrega Provisoria**	**0 días**	**jue 26/02/15**	**jue 26/02/15**

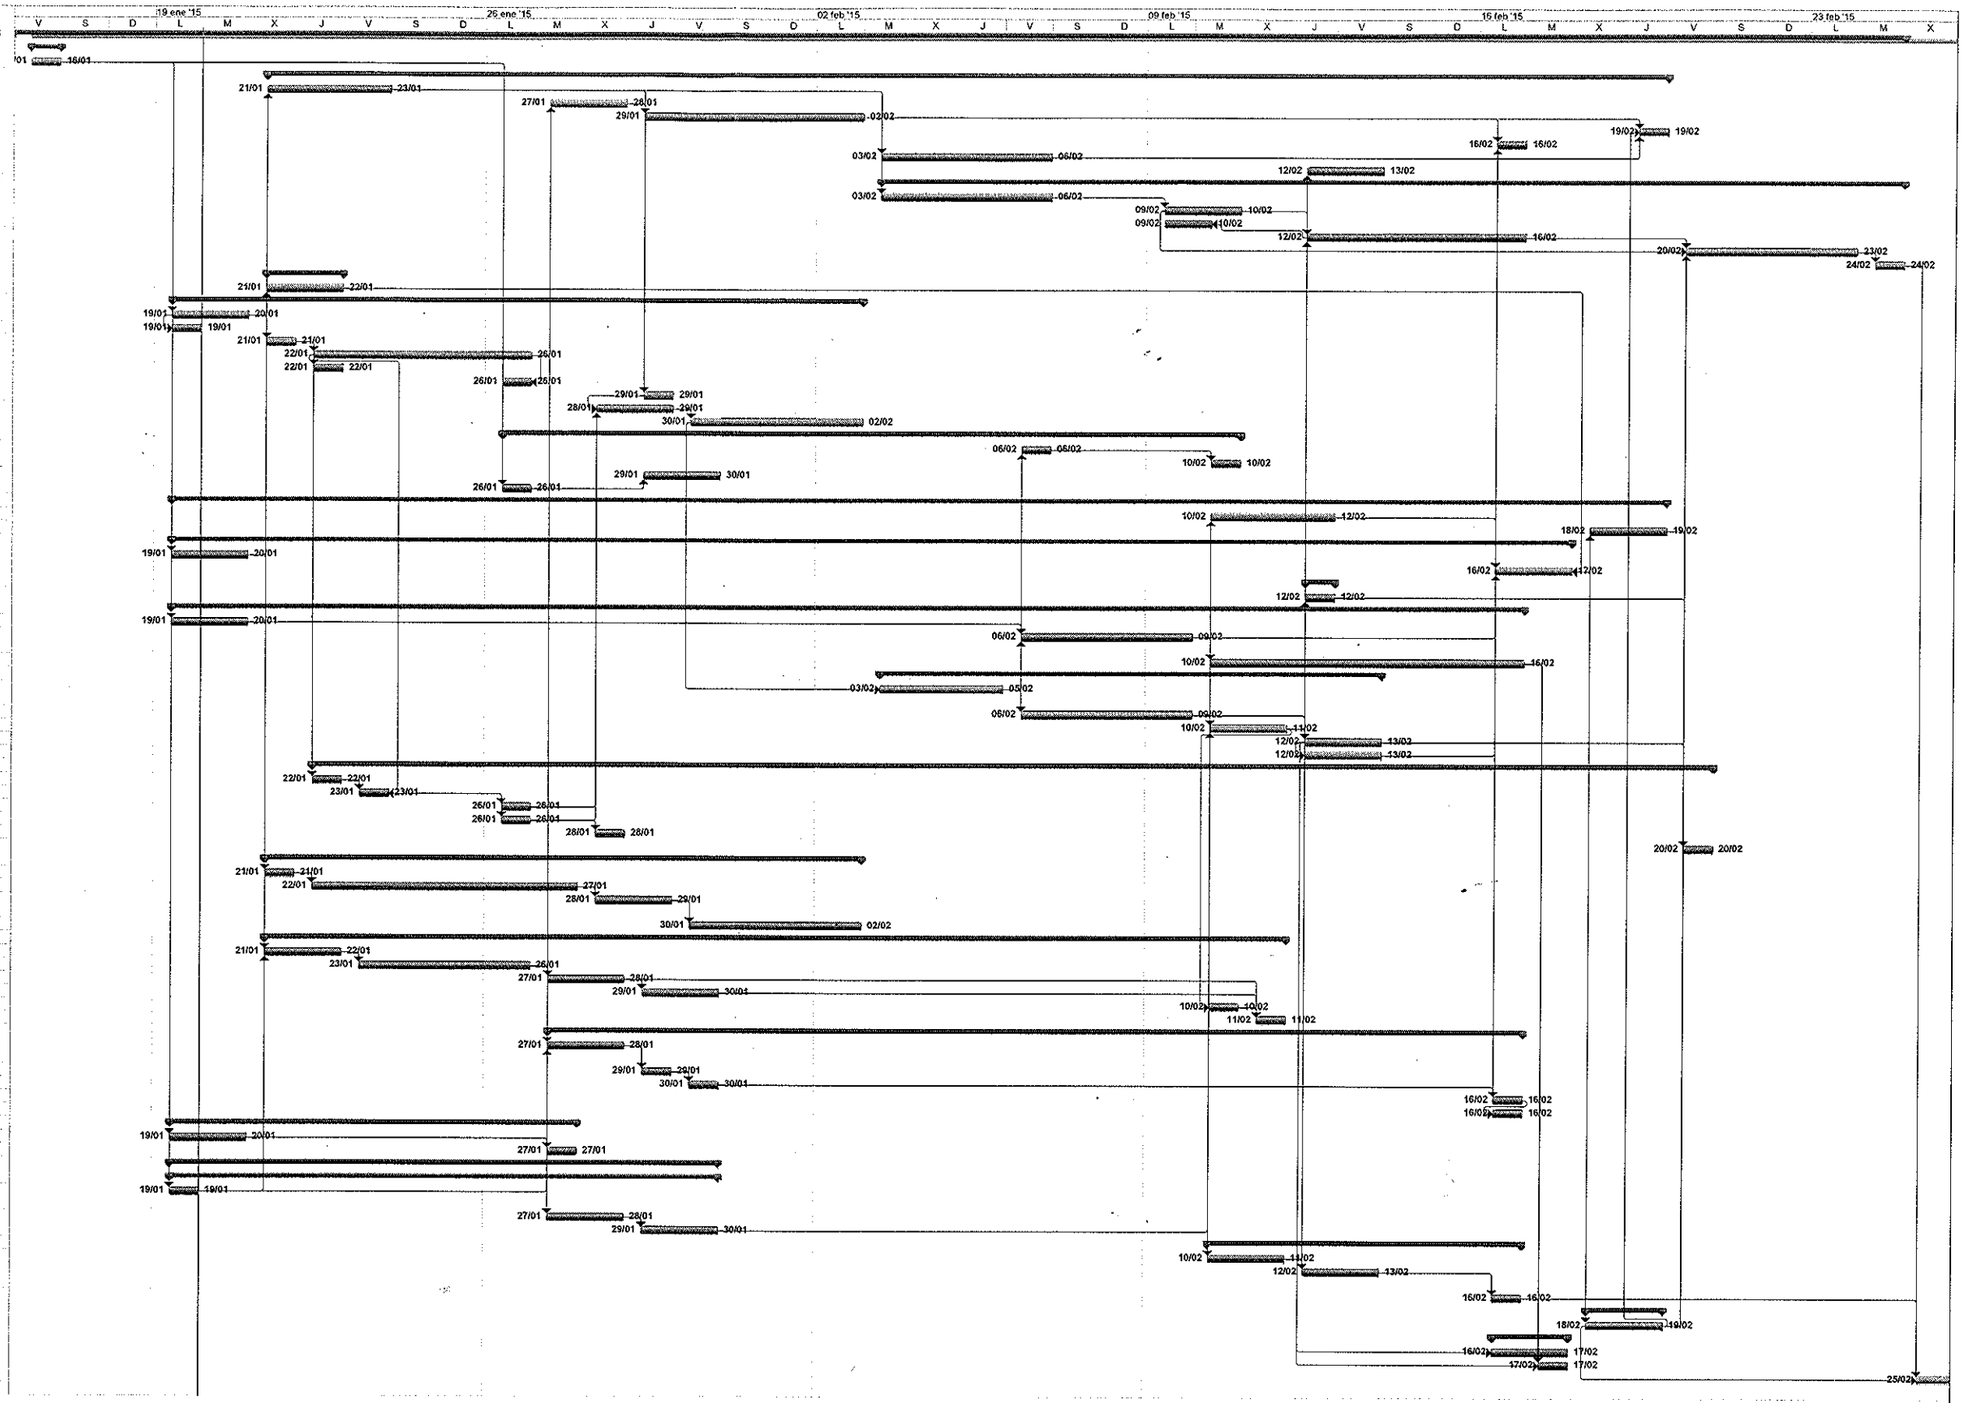

ADM
Fecha: mar 20/01/15

ANEXO 3

Tarea | Tarea crítica | Hito | Resumen | Tarea resumida | Tarea crítica resumida | Hito resumido | Progreso resumido | División | Tareas externas | Resumen del proyecto | Agrupar por síntesis | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | Sólo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | Sólo el comienzo | Sólo fin | Progreso | Fecha límite
