

Fecha Reporte	04/08/2015
---------------	------------

PROYECTO	AMC Networks
----------	--------------

UBICACIÓN	Humboldt 1967 - PB, EP, 3P
-----------	----------------------------

Contacto Cliente:	Marisa Piñeiro
-------------------	----------------

Superficie	1.800 m2
------------	----------

AMC NETWORKS
INTERNATIONAL

1) DESCRIPCION DEL PROYECTO

Relocalización de las oficinas de Humboldt. Consta de la ejecución de 2 pisos de oficinas. Su alcance por piso es el siguiente: PB: oficinas, cuarto de cableado, salas de reuniones. EP: oficinas, recepción. Piso 3º: recepción, oficinas, cuarto de cableado, coffe point, salas de reuniones.

2) FOTOS Y DESCRIPCION



PB: Estado general de la obra



PB: Canalizaciones y conductos



PB: Estructura de durlock



EP: Canalizaciones multimedia

PB: Estado general de la obra

PB: Estado general de la obra

3) TEMAS CRITICOS

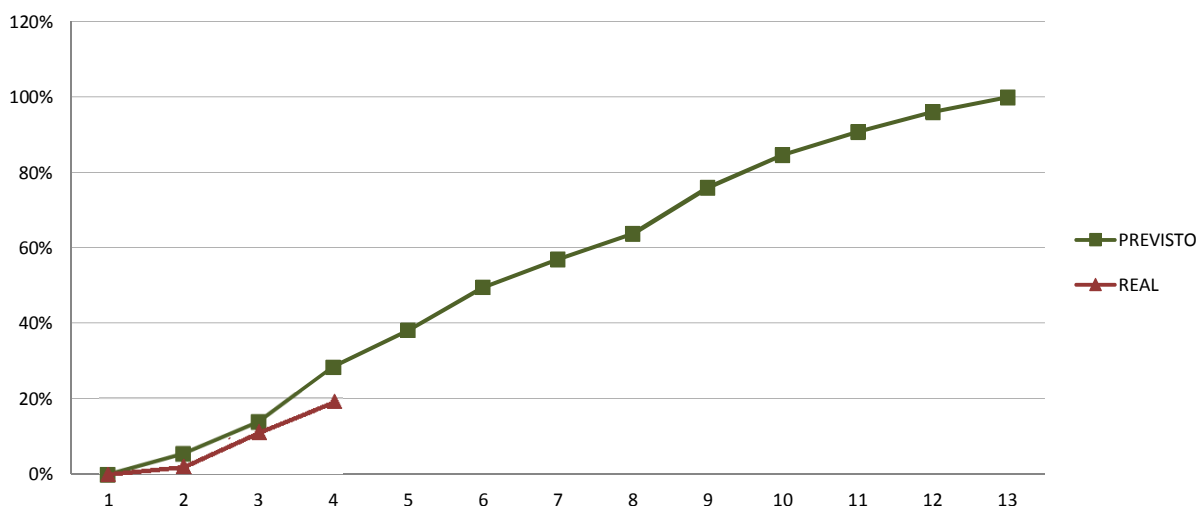
Item	Detalle	Responsable
1	EDESUR - Comienzo de trámite para T3	AMC
2	Aprobación de layout de PB + EP	AMC
3	Aprobación de terminaciones	AMC
4	Cronograma por etapas 3er piso	CONTRACT

4) HITOS Y DEADLINES

Status	Rubros	inicio	final	Comentarios	Responsable

10

SEMANA	PREVISTO	REAL
1	0%	0%
2	5%	2%
3	14%	11%
4	28%	19%
5	38%	
6	49%	
7	57%	
8	64%	
9	76%	
10	85%	
11	91%	
12	96%	
13	100%	

PORCENTAJE DE AVANCE SEMANAL DE OBRA

FIN DEL DOCUMENTO
